
## 都市再生整備計画 事後評価シート 湯田温泉周辺地区

令和7年10月

山口県山口市

様式2-1 評価結果のまとめ

都道府県名	お道在県名 山口県			市町村名 山口市		地区名		湯田温泉周辺地区			面積	51ha				
交付期間	令和2年度~令和7年度		事後評価等		令和7年度		交付対象事業費		湯田温泉周辺地2 3,070 国費率		0.5	四個	Villa			
20.777	1718-112		12.00							事業名						
1)事業の実施状況	当初計画に位置づけ、	基幹事業	上東湯田温泉五丁目線道路整備事業、高質空間形成施設整備事業(中央二丁目湯田温泉四丁目線(錦川通り)、湯田温泉二丁目赤妻町線外1線(路地))、高次都市施設(地域交流センター)整備事業(多世代交流・健康増進拠点施設)													
	実施した事業	提案事業	地域創造支援	優事業(多世	代交流·健康增殖	進拠点施設)	、事業活用調査	(湯田温泉)	周辺地区)							
			事業名							削除/追加の理由				削除/追加による目標、指標、数値目標への影響		
	当初計画 から 削除した		地域生活基盤施設整備事業(井上公園(自転車駐車場))						井上公園の利用者の状況や歴史公園としての景観上の配慮等から駐輪場整備を見合わせることとした。				数値目標への影響はない。			
	事業	提案事業	なし						_				_			
	新たに追加した事業	基幹事業	湯田温泉五丁目4号線道路整備事業						高次都市施設(多世代交流・健康増進拠点施設)の基本計画の策 定に伴い、主要動線として整備することとしたため。				数値目標への影響はない。			
		基幹事業	地域生活基盤施設整備事業(広場)						高次都市施設(多世代交流・健康増進拠点施設)と一体的な空間 を構成する広場整備の内容が決定したため基幹事業として追加す るもの。				数値目標への影響はない。			
		提案事業	なし						_				-			
	交付期間 当 初 の変更 亦 更		令和2年度~令和7年度			交付期間の変更による事 指標、数値目標への影響			-				_			
	の変更	変 更			— 従前				数 値 目標			1年以内の	効果発現要因		フォローアップ	
2)都市再生整備計画 に記載した目標を 定配載した目標を 定成状況		指標		単位	IAC BY	基準年度	шж	目標年度	モニタリング	評価値	達成度	達成見込み	(総合所見)	Δ	予定時期	
	指標1	多世代交流・健康増進拠 点施設、観光案内所の年 間利用者数		人/年	0	R2	100,000	R7		100,000 (R7年10月8 日)	0	ありなし	令和7年6月の多世代交流・ 施設のオープンに向けて、専 発活動や各種イベント等を言 たことで、目標値を上回る年 なった。	事前の周知・啓 計画的に実施し	-	
	指標2	多世代交流・健康増進拠 点施設、温泉街間の通行 量		人/12時間	1,150	H27	1,265	R7		772	×	あり なし ●	地区内の道路拡幅や美装化 計画的に進めてきたが、計ま 宿泊施設の開館に伴い、歩 化したことで、従前よりも通行 と考えられる。	則地点付近の 行者動態が変	R9年度頃	
	指標3	指標3 まちなみなどの景観に対する満足度		%	38.8	R2	40.3	R7		42.3	0	ありなし	道路の美装化や修景整備にまでの湯田地区における景 までの湯田地区における景 ザインとすることで、温泉情 区全体で景観形成が図られ 目標値を上回る満足度とな	観と調和したデ 緒を醸成し、地 たことにより、	-	
	指標4											あり なし	-			
	指標5											あり なし				
		指標			従前		目標	直 目標年度	数	値	目標	1年以内の	効果発現要因		フォローアップ	
3)その他の数値指標 (当初設定した数値 目標以外の指標)に よる効果発現状況			宿泊客数と日 †	単位 「数と日 人 939,196		基準年度 R1			モニタリング	評価値 945,440	達成度	達成見込み	(総合所見) 継続的な整備を行ってきたこ 泉の旅館・ホテルの宿泊客 利用者数の増加に繋がり、3 大し、目標達成に寄与したも る。	ことで、湯田温 数及び日帰り 交流人口が拡	<mark>予定時期</mark> - -	
	その他の 数値指標2												<b>3</b> 00		-	
	その他の 数値指標3													-		
4) 定性的な効果 発現状況	<ul><li>・整備が進んでい</li><li>・未整備道路の整</li></ul>	る道路につい 備予定も含め	ては、安全で付 のて、地元から近	や適に歩行者 首路整備を期	が利用できるよ 明待する前向きな	うになってお :声や問い合	り、賑わいもみら わせもでている。	られる。 ・								
5)実施過程の評価			実施内容					4e++++	実施状況				今後の対応方針等			
	モニタリ	ング	実施なし					都市再生物	市再生整備計画に記載し、実施できた - 市再生整備計画に記載はなかったが、実施した - 市再生整備計画に記載したが、実施できなかった -				-			
	官民連携取組		実施なし					都市再生	市再生整備計画に記載し、実施できた							
	持続的なま体制の		事業実施段階における、旅館組合や温泉配給組合、商工会関係をもりかる等との継続的なが議					都市再生整 都市再生整	再生整備計画に記載し、実施できた 再生整備計画に記載はなかったが、実施した - 引き続き、当地区の旅館組合や温泉配給組合、商工会関係者や および公共施設の指定管理者などと継続的に協議し、まちづくりに							
	P# 131 021	117.45	W. 日 ↑ 日 1日 ☆ ↑ C へんはかかけん Pinds						ホ市再生整備計画に記載したが、実施できなかった <u></u> 組む予定です。							

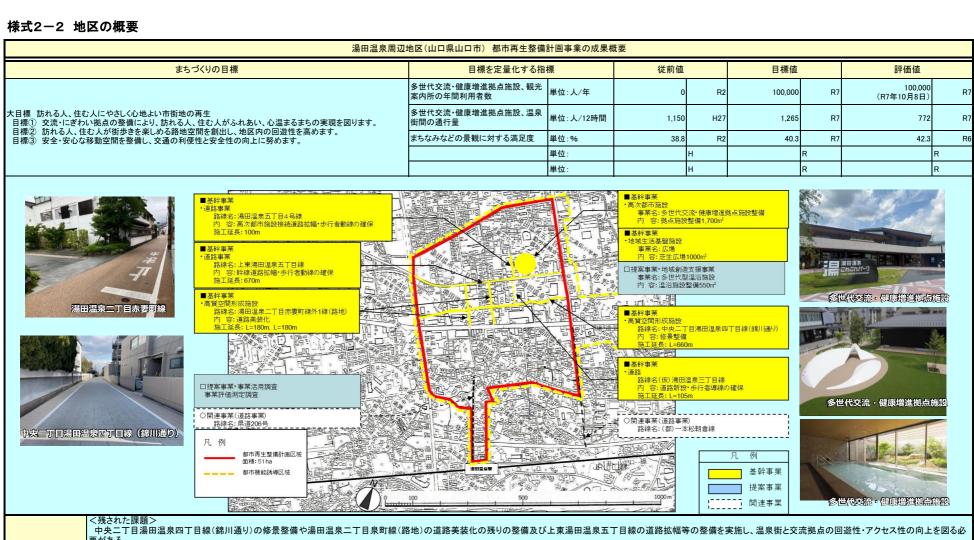

要がある。

## まちの課題の変化

## <新たな課題>

- ・新たな課題としては、整備した施設の効果を発揮するため、施設間の動線確保、地元関係団体や地域住民との活用および維持管理体制の整備
- ・施設管理者や地元関係組織との協働により、回遊性をより高めるなど、ソフト面の取り組みを強化

本年6月に供用開始した「湯田温泉こんこんパーク」で創出された新たな交流や賑わいを、施設内のみにとどまらず、周辺の宿泊施設や飲食店等の民間施設に波及させ、湯田温泉全体の賑わいや人の流れを創出する。

## 今後のまちづくり の方策 (改善策を含む)

・幅広い世代や市内外の人々の施設利用を促進するとともに、社会実験イベントの結果や地域住民や来訪者の方々の意見を基に、維持管理方策も含めた公共空間の有効活用に向けた検討、整備を行う。 ・「湯田温泉こんこんパーク」から湯田温泉街に向け、賑わいと新たな人の流れを創出するために、施設管理者や地元関係組織との協働により、回遊性をより高める社会実験イベントの開催や情報発信などのソフト面の取り組みを強化す

- 引き続き、温泉風情の向上に向けた道路空間の高質化や路地整備により、歩行者通行量の増加、回遊性の向上を図るとともに、エリア内の各拠点間の歩行者ネットワークの形成に向けた誘導サインの検討、整備を行う。
- 幹線道路の歩道拡幅整備により、歩行者の安全性と湯田温泉エリアへのアクセス性の向上を図る。
