

山口市橋梁長寿命化修繕計画



徳佛橋（とくぶつばし） 令和元年5月 竣工

令和6年11月

ひと、まち、歴史と自然が輝く交流と創造のまち 山口



都市整備部 道路管理課

目次

1. はじめに.....	1
1.1 背景.....	1
1.2 目的.....	2
1.3 基本方針.....	2
2. 山口市管理の道路橋の状況.....	3
2.1 施設の基本情報.....	3
2.2 施設の損傷状況.....	4
3. 長寿命化修繕計画.....	6
3.1 長寿命化修繕計画の基本条件.....	6
3.2 点検.....	6
3.3 診断.....	7
3.4 措置.....	7
3.4.1 対策内容と実施時期.....	7
3.4.2 対策優先度の評価.....	7
3.4.3 対策工法の設定.....	8
3.5 記録.....	8
3.6 優先度評価の検討.....	8
3.7 対策内容と実施時期.....	9
3.8 長寿命化修繕計画の効果.....	9
3.8.1 LCC 縮減の考え方.....	9
3.8.2 長寿命化修繕計画の策定・運用効果.....	9
3.9 新技術等の活用及び集約化・撤去による費用の縮減に関する具体的な方針.....	10
3.9.1 新技術等の活用方針.....	10
3.9.2 新技術等による費用縮減.....	11
3.9.3 集約化・撤去による費用縮減.....	11
4. 計画の見直し改善.....	12
5. 計画策定担当部署および意見聴取した学識経験者.....	12

1. はじめに

1.1 背景

- 山口市は山口県のほぼ中央に位置し、豊かな自然や歴史が共存する文化都市です。また、室町時代には大内氏が本拠としたことで発展し「西の京」と称され、幕末には藩庁が移され、明治維新の中心的役割を果たしました。これら歴史や文化資源が今に残されており、湯田温泉などを含めて、観光地としての魅力も備えた都市でもあります。
- 本市は、国道、県道、高速自動車道などの広域交通網が整い、山陽新幹線、山口宇部空港といった高速交通網との接続の便もよく、広域交流の拠点としての優位性を有しています。
- 道路網に代表される社会資本は、社会・経済活動ならびに安心・安全な生活を送る上で最も重要な基盤であり、これらの道路施設の多くが1950年代から1980年代にかけて整備されたことから、施設の老朽化が著しく、2040年には80%以上の道路施設が建設後50年以上を経過することとなります。（表1.1、表1.2、図1.1）
- このため、これまでの「事後保全型」による維持管理では更新費用の確保や持続的な機能の保持が困難となることが予想されることから、今ある施設の集約化・撤去を視野に入れつつ、計画的・効果的に修繕を行うことにより長期的に利用できるよう、「予防保全型」の維持管理を行うことが重要な課題となっています。

表 1.1 山口市における整備後経過年数（2022 年時点）

供用年数／橋梁数			
30年未満	30年～50年未満	50年以上	合計
189	712	415	1316
14.4%	54.1%	31.5%	100%

表 1.2 山口市における整備後経過年数（2042 年時点）

供用年数／橋梁数			
30年未満	30年～50年未満	50年以上	合計
15	174	1127	1316
1.1%	13.2%	85.6%	100%

※架設年度不明なものは構造形式等により推定

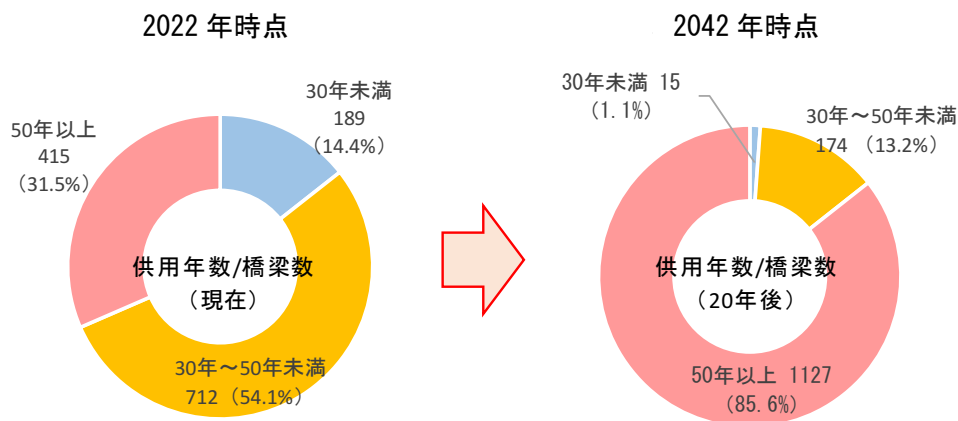


図 1.1 山口市における高齢化橋梁の状況

1.2 目的

- 市民のみならず多くの来訪者が安心・安全に道路を通行できるように、橋梁の特性や財政状況を踏まえて適切な維持管理を行い、維持管理コストの平準化と縮減を図ることを目的とします。

1.3 基本方針

- 予防保全型の維持管理に転換し、橋梁の長寿命化を図ります。（図 1.2）
 - 点検：5年に1度の定期点検を実施し、橋梁の状態を継続的に把握します。
 - 診断：橋梁の健全性を評価し、対策の必要性を適切に判断します。
 - 措置：健全性の回復を図るとともに劣化要因を除去するための対策を実施します。
 - 記録：実施した結果を継続的に蓄積します。
- PDCA サイクルに基づき計画の策定・運用・改善を継続的に実行します。（図 1.2）
 - Plan：適切な優先度評価基準を指標とした優先度評価を行い、計画的に補修計画を立案します。
 - Do：点検・診断・措置・記録のメンテナンスサイクルを実行します。
 - Check：実施した計画の進捗確認を行い、対策内容の効果を踏まえ、事業の実施状況进行评估します。
 - Action：進捗確認ならびに対策内容の評価を基に、長寿命化修繕計画のさらなる改善を図ります。

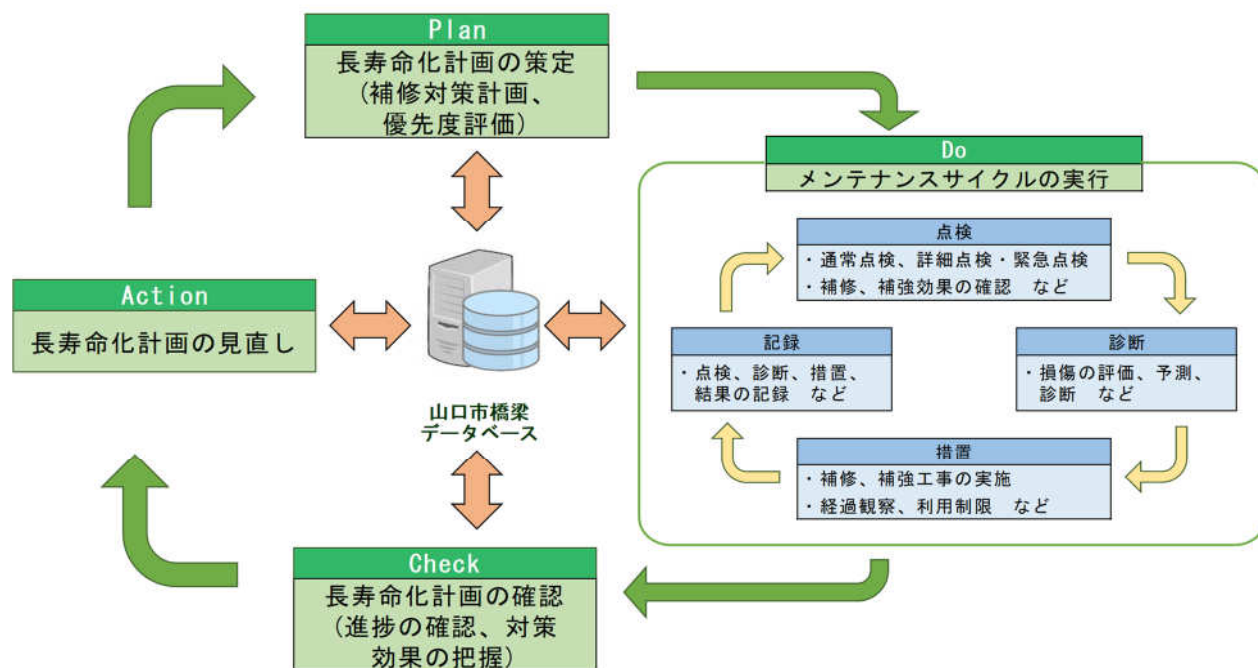


図 1.2 橋梁維持管理の流れ

2. 山口市管理の道路橋の状況

2.1 施設の基本情報

- 対象とする施設は、本市が管理する橋長 2.0m以上の橋梁 1,316 橋です。(表 2.1)

表 2.1 対象橋梁数

	橋長15m未満	橋長15m以上
橋梁数	1,011	305
合計	1,316	

- 市内の全橋梁のうち、コンクリートで作られた橋梁（溝橋、RC 橋、PC 橋）が約 90%を占めています。(表 2.2、図 2.1)
- 市内の全橋梁のうち、鋼（金属）で作られた橋梁が約 7%を占めています。(表 2.2、図 2.1)

表 2.2 橋梁種別ごとの橋梁数

橋梁種別	橋梁数	割合
溝橋	136	10.3%
RC橋	770	58.5%
PC橋	302	23.0%
鋼橋	87	6.6%
その他	21	1.6%
合計	1316	100.0%

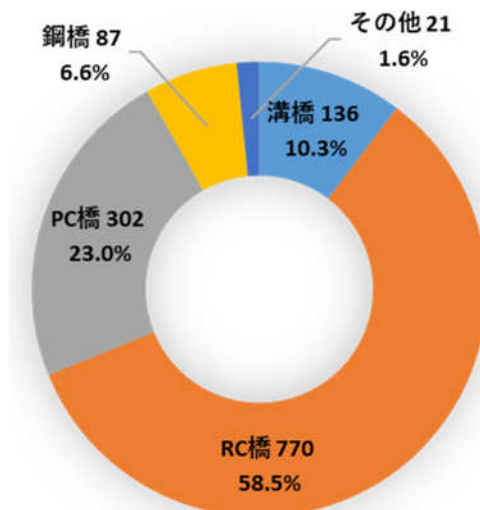


図 2.1 橋梁種別ごとの橋梁数

- ※1 溝 橋 : 橋長2m以上かつ土被り1m未満のカルバート
- ※2 RC 橋 : 主要構造（主桁）に鉄筋コンクリートを用いた橋梁
- ※3 PC 橋 : 主要構造（主桁）にプレストレストコンクリートを用いた橋梁
- ※4 鋼 橋 : 主要構造（主桁）に鋼材を用いた橋梁
- ※5 その他 : 1橋の中で鋼橋、RC 橋、PC 橋が混在する混合橋や石橋、木橋を含む橋梁


2.2 施設の損傷状況

- 「道路橋定期点検要領（国土交通省）」 「山口県橋梁点検要領（案）」に基づき点検・診断を行った結果、全体の 49 橋（3.7%）の橋梁が早期に対応が必要な「早期措置段階（Ⅲ判定）」、また、1 橋（0.1%）が「緊急措置段階（Ⅳ判定）」という結果になりました。（表 2.3、図 2.2）
- 一方で、「予防保全段階（Ⅱ判定）」の橋梁が大半（74.3%）を占めており、このまま放置すると、「早期措置段階（Ⅲ判定）」になることが懸念されます。（表 2.3、図 2.2）


表 2.3 健全度評価区分ごとの橋梁数

健全度	15m 未満		15m 以上		全体	
	橋梁数	構成比率	橋梁数	構成比率	橋梁数	構成比率
I：健全	243	24.0%	45	14.8%	288	21.9%
II：予防保全段階	747	73.9%	231	75.7%	978	74.3%
III：早期措置段階	20	2.0%	29	9.5%	49	3.7%
IV：緊急措置段階	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
合計	1,011		305		1,316	

橋長 15 m未満の橋梁

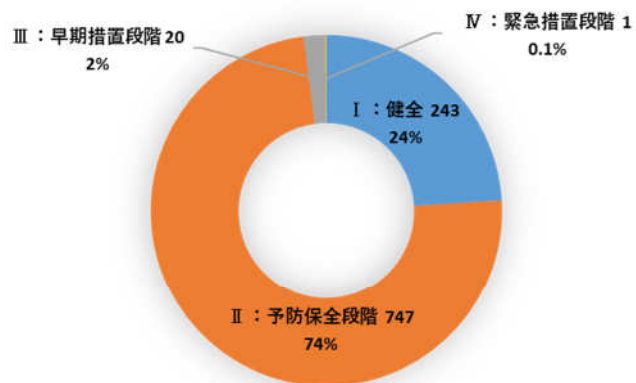

橋長 15 m以上の橋梁

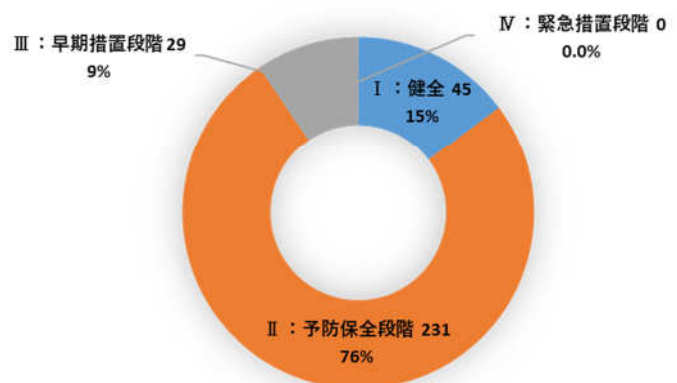

橋梁全体

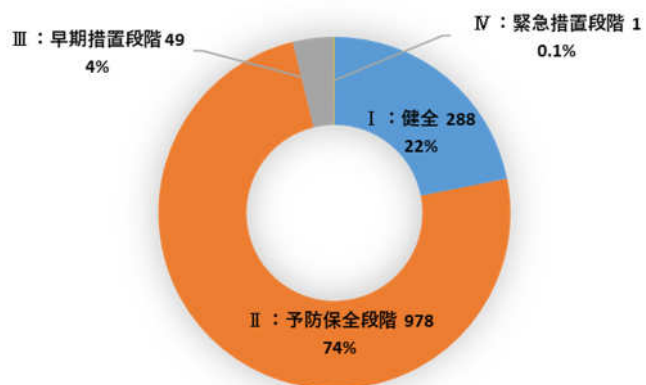


図 2.2 健全度評価区分ごとの橋梁

3. 長寿命化修繕計画

3.1 長寿命化修繕計画の基本条件

- 本市が管理する橋長 15m未満の橋梁 1,011 橋、橋長 15m以上の橋梁 305 橋の合計 1,316 橋を対象とします。
- 計画期間は 10 年間とします。ただし、5 年に 1 度の定期点検により、優先順位の見直しを実施します。
- 橋梁の規模、路線の性格、ライフサイクルコスト（以下、LCC）等の観点から橋梁毎に管理区分を設定します。管理手法としては全橋梁において予防保全型とします。

3.2 点検

- 「山口県橋梁点検要領（案）」に基づき、必要な知識及び技能を有する者が、近接目視により 5 年に 1 回の頻度で実施することを基本とします。

表 3.1 点検計画一覧表（令和 6 年 4 月現在）

点検年度	橋梁数
2024年	258
2025年	276
2026年	291
2027年	236
2028年	255

3.3 診断

- 橋梁の健全度はⅠ～Ⅳの４段階に分類し、部材単位および橋梁単位で健全性の診断を行います。

表 3.2 健全性の判定区分

区分		定義
Ⅰ	健全	道路橋の機能に支障が生じていない状態。
Ⅱ	予防保全段階	道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
Ⅲ	早期措置段階	道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
Ⅳ	緊急措置段階	道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

出典：橋梁定期点検要領 平成 31 年 3 月 国土交通省道路局国道・技術課

3.4 措置

- 橋梁毎に設定する施設の重要度と損傷の深刻度を考慮した対策優先度を評価した上で、計画的かつ効果的に対策を実施します。計画は点検や補修・補強だけではなく、更新（架替）も視野に入れ、LCC 分析により措置方針を検討し、計画的に取り組んでいきます。さらに、今後の人口推移や予算状況を踏まえ、集約化・撤去も視野に入れて取り組んでいきます。また、日常的には、パトロールや清掃などの維持管理に加え、市民からの通報等の情報をデータベース化することにより道路施設の安全性を保ちます。

3.4.1 対策内容と実施時期

点検で確認された各損傷について、対策工を実施します。対策工は点検結果でⅡ、Ⅲ、Ⅳと判定された損傷について実施します。対策時期は優先順位の高い橋梁より実施し、健全度がⅢと判定された橋梁については、**点検後 5 年以内**を目途に実施する方針とします。

3.4.2 対策優先度の評価

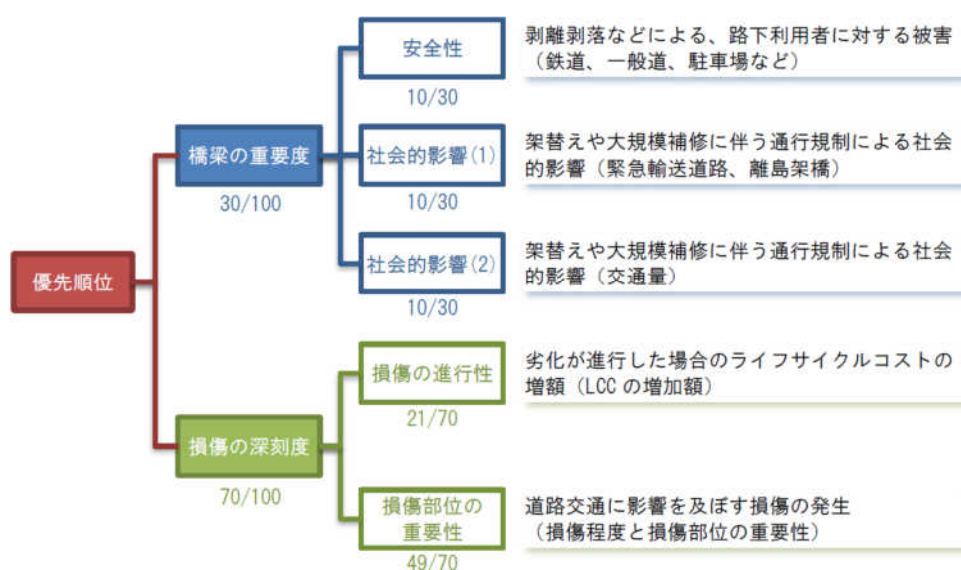


図 3.1 対策優先度評価の方法

3.4.3 対策工法の設定

対策工法については、対象部材や損傷の程度および橋長を考慮して検討します。

表 3.3 橋長区分ごとの対策工の設定一覧（橋長 15m 以上）

対象部材		対策工法		備考
		Ⅱ	Ⅲ	
主桁 ・床版	鋼	塗装塗替え工	塗装塗替え工	
	RC・PC	ひび割れ補修工	ひび割れ補修工	健全度により対策範囲を設定
		断面修復工	断面修復工	健全度により対策範囲を設定
		表面含浸工	表面含浸工（鉄筋腐食抑制）	
橋台・橋脚		ひび割れ補修工	ひび割れ補修工	健全度により対策範囲を設定
		断面修復工	断面修復工	健全度により対策範囲を設定
		表面含浸工	表面含浸工（鉄筋腐食抑制）	
橋面		床板防水工（シート系）	床板防水工（シート系）	
支承		支承塗装工	支承防錆工	
伸縮装置		伸縮装置取替工	伸縮装置取替工	
防護柵		防護柵防錆工（常温メッキ）	防護柵取替工	
仮設工		吊足場	吊足場	

表 3.4 橋長区分ごとの対策工の設定一覧（橋長 15m 未満）

対象部材		対策工法		備考
		Ⅱ	Ⅲ	
主桁 ・床版	鋼	塗装塗替え工	塗装塗替え工	
	RC・PC	ひび割れ補修工	ひび割れ補修工	健全度により対策範囲を設定
		断面修復工	断面修復工	健全度により対策範囲を設定
		表面含浸工	表面含浸工（鉄筋腐食抑制）	
橋台・橋脚		ひび割れ補修工	ひび割れ補修工	健全度により対策範囲を設定
		断面修復工	断面修復工	健全度により対策範囲を設定
		表面含浸工	表面含浸工（鉄筋腐食抑制）	
仮設工		吊足場	吊足場	

3.5 記録

- 継続的に点検・診断・措置の結果を蓄積します。又、蓄積された結果については、補修対策や次回点検にフィードバックし活用します。

3.6 優先度評価の検討

- 限られた予算で効果的な維持管理を実行するため、「橋梁の重要度」と「損傷の深刻度」を考慮し、対策の優先順位を設定します。
- 設定した優先順位に沿って、計画的に対策を実施し、橋梁の長寿命化を図ります。

3.7 対策内容と実施時期

- 橋梁点検結果を基に、損傷度に応じた対策工法を設定し、個々の橋梁について、修繕の内容、修繕の実施時期等を計画します。

3.8 長寿命化修繕計画の効果

3.8.1 LCC 縮減の考え方

- 損傷が軽微なうちに補修（予防保全型）することで、1 回当たりの修繕に要する費用を安価に抑えることにより、致命的欠陥が顕在化した段階で補修（事後保全型）する場合に比べて修繕の回数は多くなりますが、総費用が抑えられ、LCC の縮減が期待できます。

3.8.2 長寿命化修繕計画の策定・運用効果

- 今後 50 年間の事業費予測を、事後保全型管理手法で行った場合と、予防保全型管理手法で行った場合を比較します。（図 3.2）
- 従来型の管理に比べて、予防保全型管理手法を導入することにより、今後 50 年間で 900 億円→100 億円（▲800 億円）となり、約 9 割のコスト縮減効果が期待できます。（図 3.2）



図 3.2 長寿命化修繕計画によるコスト縮減効果（試算）

※) 用語の説明

- ・ LCC：ライフサイクルコスト（life-cycle cost）とは、橋梁の設計～建設～修繕～解体（更新）するまでの全期間に要する費用のことを示します。
- ・ メンテナンスサイクルとは、橋梁の安全安心等を確保するため、点検⇒診断⇒措置（修繕等）⇒記録を継続して行うことを示します。
- ・ 事後保全（橋梁の損傷が大きくなった段階で大規模な修繕、架替えを行う）から、予防保全（定期的に点検を行い早期発見、早期対策を計画的に行う）への転換により、橋梁の寿命を延ばすことで LCC の縮減が期待できます。

3.9 新技術等の活用及び集約化・撤去による費用の縮減に関する具体的な方針

3.9.1 新技術等の活用方針

山口市が管理する橋梁点検や修繕等の実施にあたっては、維持管理に関する最新のメンテナンス技術と従来技術を比較検討し、有効なものは積極的に活用していくことで効率化を目指します。なお、山口市では、点検調書作成システムを用いた効率化を図ります。

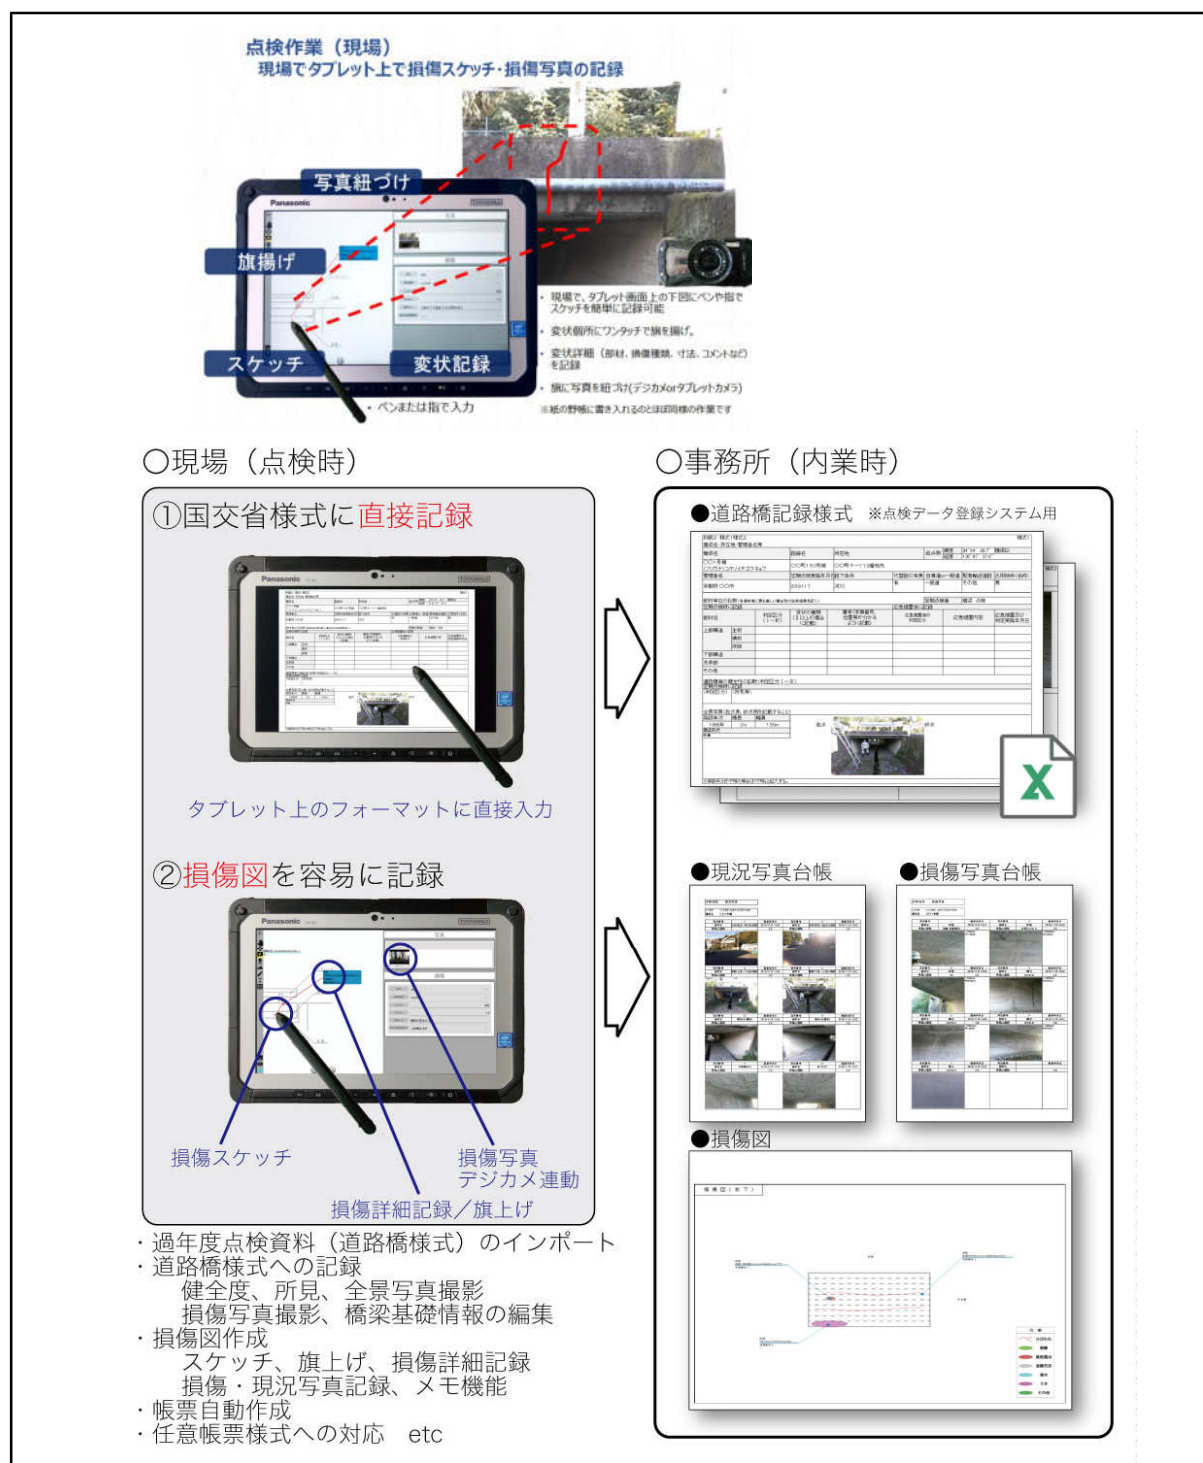


図 3.3 点検調書作成システムを用いた効率化の例

3.9.2 新技術等による費用縮減

本市が管理する1,316橋全ての橋りょうのうち適用可能なものについて、点検調書作成システムを活用することにより、令和6年度から令和10年度までの5年間で橋梁点検に要する費用を約1,500万円縮減します。

3.9.3 集約化・撤去による費用縮減

今後の人口推移や予算状況を踏まえて、集約化・撤去も視野に入れて取り組んでいきます。具体的には今後5年以内に集約化が考えられる2橋について、新規の道路（橋梁）に集約することで既往の路線を廃止することなどにより、撤去（利用停止）を行います。これにより、補修費用および定期点検に要する費用（19百万円）の縮減を目指します。

4. 計画の見直し改善

今回の長寿命化計画の検証・改善を図るため 10 年毎に修繕の実施状況、架替の実施状況を検証しながら、適切に長寿命化計画を改訂し、さらなる L C C の縮減を実施します。

表 4.1 段階的 PDCA サイクル

PDCA サイクルの段階		実施項目（見直す内容）
Plan	劣化予測	最新点検データを基に劣化予測の分析
	将来需要予測	対策工法単価の見直し（最新単価の適用）
	対策優先度	評価項目の見直し（実態に見合った指標の適用）
Do	点検・診断	近接目視点検（ドローン等含む）および診断の実施
	措置	点検結果に基づき補修を実施
	記録	点検・診断・措置の情報をデータベースに蓄積
Cheak	検証	長寿命化修繕計画の進捗状況の確認・検証
		橋梁点検要領の検証
Action	改善	長寿命化修繕計画の進捗状況の改善
		橋梁点検要領の改善

5. 計画策定担当部署および意見聴取した学識経験者

1) 計画策定担当部署

山口市 都市整備部 道路管理課 TEL : 083-934-2835

2) 意見聴取した学識経験者

山口大学 みやもとあやほ 宮本文穂 名誉教授

3) 実施時期

H31 年 3 月 作成

R02 年 3 月 一部改訂

R05 年 3 月 一部改訂

R05 年 6 月 一部改訂

R06 年 1 月 一部改訂

R06 年 11 月 一部改訂

山口市橋梁長寿命化修繕計画 対象橋梁一覧表

施設名	路線名	架設 年度	橋長(m)	幅員(m)	直近の点検 実施年度	直近の 判定区分	点検実施計画年度					修繕計画年度					修繕内容
							2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028	
中津江橋	下村花香線	1949	2	6.8	2021	II			○								
若山橋	若山臨港線	1965	5.3	7.7	2023	III					○					○	
第二中津江橋	下村花香線	1949	2.6	5.8	2021	II			○								
新道下橋	野口焼野線	1984	11.6	8.2	2023	II					○						
狼橋	長浜岩屋線	不明	3	3.8	2021	II			○								
第一中津江橋	下村花香線	1949	2.5	7.6	2021	II			○								
鬼君橋	長浜岩屋線	不明	4	6	2021	II			○								
川口橋	小古郷岡山線	不明	4	7.5	2023	II					○						
小古郷橋	西条小古郷線	不明	5.9	4.3	2023	II					○						断面修復等
小古郷大橋	海岸線	1958	8.6	13.3	2023	II					○						断面修復等
引野橋	焼野引野線	1972	12.6	7.2	2023	II					○						
梶取橋	焼野引野線	不明	2.4	3.8	2023	II					○						
第二屋戸橋	下村花香線	1949	2.2	3.8	2021	I			○								
櫻ヶ谷上橋	長通須田線	不明	2.9	7	2023	II					○						
出合川橋	赤迫仙在線	不明	7.1	6	2023	II					○						
小河原橋	長通須田線	1970	6.2	6.5	2023	II					○						
赤迫橋	長通須田線	1994	20	9	2020	II		○									
沖田橋	赤迫仙在線	1986	6	4.5	2023	III					○					○	
迫田橋	長通須田線	不明	5.3	9	2023	II					○						
水地橋	長浜岩屋線	不明	3	3.7	2021	II			○								
木床橋	木床南北線	1972	13.4	7.2	2023	II					○						
明石川橋	焼野引野線	不明	2.4	3.9	2023	I					○						
上赤迫橋	赤迫仙在線	2005	20	7.7	2020	I		○									
石丸橋	赤迫仙在線	1986	2.4	7.5	2023	II					○						
井関橋	犬ノ森仙在線	1999	20	7.7	2020	I		○									
福岡橋	前田小苗代線	1992	24	10.5	2020	II		○									
玉川橋	由良前仙在線	1971	11.4	7.3	2023	II					○						
野口橋	河内野口線	1997	17	7.7	2020	I		○									
阿知須大橋	海岸線	2000	66	15.9	2020	II		○									
中溝橋	浜表迫田線	不明	2.2	7.1	2023	II					○						
木船橋	西条浜村線	不明	3.2	4.3	2023	I					○						
垣ノ内橋	浜表野口線	不明	2.5	6.8	2023	II					○						
慶應橋	北砂郷木船線	1952	25	6.8	2021	III			○					○			
小笹橋	浜表野口線	不明	4.8	6.9	2023	II					○						
西条橋	船木西条線	不明	2.5	2.9	2023	I					○						
浜表橋	浜表野口線	1993	22	15.8	2020	II		○									
浜表小橋	浜表野口線	不明	3.2	6.8	2023	II					○						
上長溝橋	沖の原線	不明	2.2	7	2023	II					○						

山口市橋梁長寿命化修繕計画 対象橋梁一覧表

施設名	路線名	架設 年度	橋長(m)	幅員(m)	直近の点検 実施年度	直近の 判定区分	点検実施計画年度					修繕計画年度					修繕内容
							2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028	
上小川橋	二ノ宮南北線	1984	4.1	6.5	2023	II					○						
小川橋	浜村線	1978	6	5.5	2023	II					○						
潮引橋	岩倉浜線	不明	3.9	14.2	2023	II					○						
船渡北橋	御米橋砂郷線	不明	3.6	5.5	2023	II					○						
沢田上橋	沖の原線	不明	2.5	24.2	2023	II					○						
御米橋	岩倉浜線	1977	30	11.4	2020	III		○					○	○	○	○	
長浜橋	長浜岩屋線	不明	8	9.2	2021	II			○								
飛石橋	岩倉浜線	1940	8	13.3	2023	III					○					○	
杖川橋	縦貫線	1956	3	10.6	2020	II		○									
阿知須跨線橋	浜田飛石線	1974	18	10.2	2021	II			○								
新橋	長浜1号線	不明	6	5.5	2021	II			○								
跨道橋	浜田飛石線	1974	8.7	9.9	2023	II					○						断面修復等
干拓連絡1号線1号橋	干拓連絡1号線	不明	3.5	8.1	2023	II					○						
下左尾2号線1号橋	下左尾2号線	不明	3.7	8.6	2019	II	○										
湯の河内橋	河内原南線	1999	17	5.2	2020	I		○									
中の坪橋	宮ノ脇犬ノ森線	1973	19	7.2	2020	II		○									
出会川橋	源田畑線	不明	7.1	14.5	2023	II					○						
河内橋	由良前仙在線	1970	18	7.6	2020	II		○									
須田橋	河内野口線	1980	16.8	5.8	2023	II					○						断面修復等
逆水橋	長通須田線	1971	21	7.2	2020	II		○									
小浜橋	小浜線	1995	2.5	6.3	2022	II				○							
内浜橋	内浜線	1994	7.1	10.2	2022	II				○							
源田畑橋	源田畑線	不明	6	7	2023	II					○						
多屋橋	参宮道路線	1981	24	9.6	2020	II		○									
江畑橋	源田畑線	不明	8	7.3	2023	II					○						
黒潟縦貫線1号橋	黒潟縦貫線	不明	2.2	5.9	2022	II				○							
下多屋橋	午二郎線	1981	22	4.7	2020	II		○									
汐溜橋	六の切線	1970	9.5	6	2022	II				○							
内浜北橋	内浜線	不明	5.1	8.6	2022	II				○							断面修復等
辻跨線橋	岩倉西飛石線	1972	16	6.5	2022	II				○							
ひょうたん橋	惣在所2号線	不明	4	7.6	2021	II			○								
新川橋	大河内浜内線	1943	5.8	5.8	2022	II				○							
明神橋	塩田橋岩倉線	不明	5.3	8.1	2023	II					○						
新川上橋	東泉寺線	1978	7	8.1	2022	II				○							
塩田橋	塩田橋岩倉線	1969	13	6.2	2020	II		○									
三軒屋大橋	惣在所5号線	不明	22	8.2	2019	II	○										
牧跨線橋	岩倉南北線	1964	17	3	2022	II				○							
三軒屋第二小橋	惣在所5号線	不明	5	9	2021	II			○								

山口市橋梁長寿命化修繕計画 対象橋梁一覧表

施設名	路線名	架設 年度	橋長(m)	幅員(m)	直近の点検 実施年度	直近の 判定区分	点検実施計画年度					修繕計画年度					修繕内容
							2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028	
堰戸橋	南3号線	不明	3	3.5	2021	Ⅱ			○								
中条橋	大海峠線	1955	3.8	3.7	2022	Ⅱ				○							
由良橋	由良前阿知須3号線	1961	11	6.3	2019	Ⅱ	○										
由良前橋	由良前阿知須1号線	1988	9	6.2	2019	Ⅱ	○										
天田橋	青江宮の旦線	1971	8.3	9.8	2022	Ⅱ				○							
櫛ヶ崎橋	由良前須川前線	1997	33	10.5	2019	Ⅱ	○										
鳩岡橋	渚鳩岡線	不明	4	3.6	2019	Ⅱ	○										
鳩岡跨線橋	小路遠波線	不明	16	2.3	2022	Ⅲ				○				○	○	○	
藤尾橋	新地鳩岡線	2000	7	5.8	2019	Ⅰ	○										
浜中橋	大河内浜内線	1957	2.8	7.3	2022	Ⅱ				○							
六分橋	祢宜幸田線	不明	12	7.2	2021	Ⅱ			○								
由良後橋	原条東由良後線	不明	13	5.7	2019	Ⅱ	○										
天神橋	大河内浜内線	1943	4.3	6.8	2022	Ⅱ				○							
役神橋	祢宜2号線	不明	2	5	2021	Ⅱ			○								
前開作橋	小路須川前2号線	不明	9	17.4	2019	Ⅱ	○										
遠波2号橋	鳩岡北ノ江東2号線	不明	3	7.4	2019	Ⅰ	○										
大河内橋	大河内浜内線	1943	4	6.5	2022	Ⅱ				○							
遠波1号橋	鳩岡北ノ江東1号線	不明	4	9.2	2019	Ⅰ	○										
今井須川前線1号橋	今井須川前線	不明	7	7	2023	Ⅰ					○						
宮ノ旦橋	幸田宮ノ旦線	不明	2	3.1	2021	Ⅰ			○								
唐樋2号橋	鳩岡北ノ江東2号線	2001	4.6	25.2	2019	Ⅱ	○										
矢石下橋	鳩岡北ノ江東2号線	2001	4.6	11.2	2019	Ⅱ	○										
唐樋1号橋	鳩岡北ノ江東1号線	不明	4.5	15.5	2019	Ⅱ	○										
矢石中橋	鳩岡北ノ江東1号線	不明	21	12.9	2019	Ⅱ	○										
矢石新橋	唐樋原条西線	2001	3	20.8	2020	Ⅱ		○									
北ノ江開作6号橋	鳩岡北ノ江東2号線	不明	2	6.1	2019	Ⅱ	○										
北ノ江開作1号橋	鳩岡北ノ江東1号線	不明	2	6	2019	Ⅱ	○										
矢石橋	下中野寄江線	1997	10	6.2	2020	Ⅰ		○									
北ノ江開作7号橋	鳩岡北ノ江東2号線	不明	2	6	2019	Ⅱ	○										
北ノ江開作2号橋	鳩岡北ノ江東1号線	不明	2	6.1	2019	Ⅱ	○										
常盤橋	二島2号線	不明	3	5.5	2021	Ⅱ			○								
北ノ江開作8号橋	鳩岡北ノ江東2号線	不明	3	5.8	2019	Ⅰ	○										
北ノ江開作3号橋	鳩岡北ノ江東1号線	不明	3.2	6.2	2019	Ⅱ	○										
北ノ江開作9号橋	鳩岡北ノ江東2号線	不明	2	6	2019	Ⅱ	○										
北ノ江開作4号橋	鳩岡北ノ江東1号線	不明	2	7.6	2019	Ⅱ	○										
北ノ江開作10号橋	鳩岡北ノ江東2号線	不明	2.6	5.8	2019	Ⅱ	○										
北ノ江開作5号橋	鳩岡北ノ江東1号線	不明	2.4	7.9	2019	Ⅱ	○										
佐山西橋	原条東由良後線	不明	3.1	8	2019	Ⅰ	○										

山口市橋梁長寿命化修繕計画 対象橋梁一覧表

施設名	路線名	架設 年度	橋長(m)	幅員(m)	直近の点検 実施年度	直近の 判定区分	点検実施計画年度					修繕計画年度					修繕内容
							2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028	
東南橋	新開作東島上線	不明	4	4.6	2020	Ⅲ			○								
西山橋	仁光寺上田線	1994	16	7.7	2019	Ⅱ	○										
溝畑橋	今井須川前線	1992	13.8	7	2019	Ⅱ	○										
中川橋	新開作東島上線	不明	29	3.4	2019	Ⅱ	○										
仁光寺橋	仁光寺線	1967	10	11.1	2021	Ⅱ			○								
南今津橋	北ノ江西東今津線	不明	8	13.7	2020	Ⅰ		○									
上西山橋	大里仁光寺線	1994	6	6.2	2021	Ⅱ			○								
下今津橋	下中野寄江線	1990	33	5.2	2019	Ⅱ	○										
今江橋	東今津北ノ江東線	不明	28	6.2	2019	Ⅱ	○										
昭和西橋	新開作東島上線	不明	5	5.1	2023	Ⅱ					○						
玄珍小橋	岡屋深溝東線	不明	3	5.2	2020	Ⅰ		○									
玄珍橋	岡屋深溝東線	不明	24	6.2	2019	Ⅱ	○										
原条西橋	原条西線	不明	17	4.7	2019	Ⅱ	○										
原条跨線橋	干見折原条東２号線	不明	25	7.1	2021	Ⅱ			○								
第２原条側道橋	原条東原条西線	不明	15	20.7	2019	Ⅱ	○										
第１原条側道橋	干見折原条東２号線	1990	19	9.2	2019	Ⅱ	○										
上常盤橋（下り）	干見折原条東線	不明	24	6.2	2019	Ⅱ	○										
今津橋	下中野寄江線	1992	19	6.2	2019	Ⅱ	○										
上常盤橋（上り）	干見折原条東２号線	不明	24	6.3	2019	Ⅱ	○										
原条橋	原条東由良後線	不明	16	4.7	2019	Ⅱ	○										
新栄橋	新開作東上田線	不明	47	7.2	2019	Ⅱ	○										
上今津橋	上嘉川下高根線	不明	16	6.2	2019	Ⅱ	○										
平成橋	上田新開作東線	不明	45	2.5	2019	Ⅱ	○										
東西橋	新開作東新開作沖線	不明	13	4.5	2020	Ⅱ		○									
江崎大橋	上嘉川下高根線	不明	14	7.2	2020	Ⅱ		○									
上渡り1号線1号橋	上渡り1号線	不明	3.6	6.4	2023	Ⅰ					○						
小華橋	高見線	不明	6.2	5.8	2023	Ⅰ					○						
綾乃橋	高見相原線	不明	6.2	5.8	2023	Ⅰ					○						
下幸之江橋（下り）	干見折原条東線	不明	16	6.2	2019	Ⅰ	○										
下幸之江橋（上り）	干見折原条東２号線	不明	17	6.2	2019	Ⅱ	○										
幸之江橋	上高根上中野線	不明	10	4.2	2020	Ⅲ		○							○		
前原橋	上中野相原線	不明	3	8.7	2020	Ⅰ		○									
石唐樋橋	東開作昭和西線	不明	12	9.7	2020	Ⅰ		○									
参神橋	向山下祢宜線	不明	45	3.9	2019	Ⅱ	○										
新土手橋	上中野相原線	不明	3	7.5	2020	Ⅱ		○									
愛奈橋	上中野相原線	不明	3	5.9	2020	Ⅰ		○									
原跨線橋（下り）	干見折原条東線	不明	23	5.7	2020	Ⅰ		○									
小田尻橋	島下新開作西線	不明	5	6.1	2020	Ⅰ		○									

山口市橋梁長寿命化修繕計画 対象橋梁一覧表

[illegible]

山口市橋梁長寿命化修繕計画 対象橋梁一覧表

施設名	路線名	架設 年度	橋長(m)	幅員(m)	直近の点検 実施年度	直近の 判定区分	点検実施計画年度					修繕計画年度					修繕内容
							2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028	
壁田橋	免地東本郷線	不明	8	14	2020	II		○									
大蔵橋	今宿東黒山線	1987	18	3.6	2019	II	○										
小田2号橋	向山上西開作下線	不明	5.8	4.9	2023	I					○						
小野尻橋	中田畑小野線	不明	4	2.6	2020	I			○								
大内田1号橋	免地東本郷線	不明	2.4	6	2020	I			○								
大内田2号橋	免地東本郷線	不明	2.6	11.6	2020	I			○								
今宿橋	今宿東今宿西2号線	1987	17	6.1	2019	II	○										
踏打橋	今宿東天神原線	不明	4	3.1	2020	I			○								
潟上橋	潟上線	不明	10.6	4.2	2022	II				○							
新潟上橋	市潟上線	不明	10	6.7	2021	II			○								
竜王橋	今宿西和西線	不明	9	12.9	2020	II		○									
一ツ橋	今宿東南線	2015	18.3	7.2	2023	I					○						
唐樋橋	大村向山上線	不明	59	6.6	2019	II	○										
交通センター1号橋	総合交通センター2号線	不明	6	5.5	2021	I			○								
南橋	今宿東南線	1951	4	7.3	2020	II		○									断面修復等
交通センター2号橋	総合交通センター2号線	不明	2.3	5.5	2021	I			○								
三丁目橋	東開作西開作上線	不明	7	6.5	2020	II		○									
高橋橋	四辻立石線	不明	21	8	2019	II	○										
竜山橋	岡大道線	不明	3	4.9	2020	II		○									
南切戸橋	岡大道線	不明	5	4.9	2020	II		○									
四辻橋	今宿東四辻線	1959	25.6	8.8	2023	III					○						
向原2号橋	鷹ノ子線	不明	4	4.9	2020	II		○									
河添橋	稽古屋線	不明	6	4.3	2020	I		○									
天神原橋	天神原2号線	不明	5	3.4	2020	II		○									
小郡道路5号橋	小郡道路4号線	不明	7	6.3	2021	I			○								
縄手橋	岡大道線	不明	3	5.2	2020	I		○									
正鳴橋	稽古屋長谷線	2003	15.5	6.2	2023	I					○						
新川橋（下り）	小郡道路4号線	不明	13	6.5	2021	I			○								
小郡道路6号橋	小郡道路5号線	不明	7	5.9	2021	I			○								
下郷第4涵渠1	小郡道路4号線	不明	14	6.4	2023	II					○						
中溝北橋	稽古屋2号線	不明	13	6.2	2020	I		○									
新川橋（上り）	小郡道路5号線	不明	13	6	2021	I			○								
後中西橋	東開作西開作上線	不明	6	4.5	2020	II		○									
石佛橋	天神原和西線	不明	4	2.5	2020	III		○									
沖橋	沖島下線	不明	4	4.4	2021	II			○								
下郷第4涵渠2	小郡道路5号線	不明	14	6.1	2023	II					○						
綾木橋	四辻立石線	不明	10	6.2	2020	II		○									
新開橋	柏崎免地線	不明	2	3.6	2021	I			○								

山口市橋梁長寿命化修繕計画 対象橋梁一覧表

施設名	路線名	架設 年度	橋長(m)	幅員(m)	直近の点検 実施年度	直近の 判定区分	点検実施計画年度					修繕計画年度					修繕内容
							2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028	
下郷第2 函渠2	小郡道路3号線	不明	6	6	2021	I			○								
下郷第1 函渠2	小郡道路3号線	不明	3	7.9	2021	II			○								
小郡道路3号橋	小郡道路2号線	不明	3	5.9	2021	I			○								
小郡道路4号橋	小郡道路3号線	不明	5	7.7	2021	I			○								
下郷橋(側道)	小郡道路3号線	不明	14	9	2023	II					○						
榎野川橋	島下小郡線	不明	98	9	2019	II	○										
米光橋	郷下向山上線	不明	3	5.6	2021	II			○								
新川1号橋	新開三軒屋線	不明	20	7.2	2021	I			○								
岡村橋	新開三軒屋線	不明	2	6.5	2020	II		○									
新川橋	新開三軒屋線	不明	8	2.3	2020	I		○									
小郡道路2号橋	小郡道路1号線	不明	3	10.1	2021	II			○								
小郡道路1号橋	小郡道路1号線	不明	5	8.2	2021	II			○								
鷹の子2号橋	鷹ノ子2号線	不明	6	4.8	2020	II		○									
河内橋	中市西本郷線	不明	4	4.2	2020	II		○									
柏崎跨線橋	柏崎新開線	不明	14	6	2022	II				○							
芻田橋	四辻立石線	不明	7	14.3	2021	II			○								
高関1号橋	沖島下線	不明	2.5	4.1	2022	I				○							
下鷹の子橋	鷹ノ子小森線	不明	8	4.8	2020	II		○									
古土手橋	島下島上線	不明	4.3	5.4	2023	II					○						
山田口西橋	稽古屋長谷線	2003	8.7	6.2	2023	I					○						
上市橋	市潟上線	不明	19	6.5	2019	II	○										
鷹の子橋	鷹ノ子和西線	不明	4	3.9	2020	II		○									
駅南1 3号橋	駅南3 6号線	2003	3	8.3	2021	I			○								
河端橋	鑄銭司岡線	1990	10	4.2	2020	II		○									
駅南7号橋	駅南3 4号線	不明	4	12.4	2021	I			○								
駅南6号橋	駅南3 1号線	不明	4	10.2	2021	I			○								
塩田橋	丸尾沖島下線	不明	4	4.3	2020	I		○									
第一長妻川橋	島下西陶線	不明	5.6	22.9	2022	II				○							
駅南1 4号橋	駅南3 7号線	2003	3	9	2023	II					○						
第二長妻川橋	西陶島下線	不明	8.5	9.9	2022	II				○							
瀬原橋	沖西陶線	不明	2.8	4	2021	II			○								
花園町1号線1号橋	花園町1号線	不明	3.5	7	2023	II					○						
前田橋	立石中河原線	不明	5.4	3.1	2022	II				○							
花園町1号線4号橋	花園町1号線	不明	3.5	10.2	2023	II					○						
西開作橋	西開作上西開作下線	不明	3.4	2.3	2023	I					○						
平砂橋	駅南3 1号線	不明	15	9.8	2021	I			○								
駅南5号橋	駅南2 9号線	不明	4	12.4	2021	I			○								
新川側道橋(上り)	花園町1号線	不明	15.3	7	2023	II					○						

山口市橋梁長寿命化修繕計画 対象橋梁一覧表

施設名	路線名	架設 年度	橋長(m)	幅員(m)	直近の点検 実施年度	直近の 判定区分	点検実施計画年度					修繕計画年度					修繕内容
							2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028	
新川側道橋(下り)	花園町1号線	不明	15.3	7	2023	Ⅱ					○						
小森橋	岡小森線	不明	7	3.7	2020	Ⅱ		○									
駅南4号橋	駅南28号線	不明	4	11	2021	Ⅰ			○								
橋本橋	西陶市線	不明	22	5.8	2019	Ⅱ	○										
花園町1号線2号橋	花園町1号線	不明	3	7	2023	Ⅱ					○						
駅南3号橋	駅南27号線	不明	4	12.4	2021	Ⅰ			○								
陽己橋	郷下1号線	不明	2	10.4	2021	Ⅱ			○								
花園町1号線3号橋	花園町1号線	不明	3	6	2023	Ⅱ					○						
川西橋	柏崎駅南線	不明	7	4.5	2021	Ⅱ			○								
駅南2号橋	駅南26号線	不明	4	12.4	2021	Ⅰ			○								
陶高架橋(下り)	郷下島下線	不明	195	6.2	2020	Ⅱ		○									
駅南8号橋	船倉中開作線	不明	3	17.2	2021	Ⅰ			○								
陶高架橋(上り)	郷下島下2号線	不明	167	6.2	2020	Ⅰ		○									
院内橋	免地東本郷線	不明	5	6.2	2020	Ⅰ		○									
下小森橋	岡小森線	不明	3	5.7	2020	Ⅱ		○									
中河原橋	中河原糸根線	不明	6	12.2	2021	Ⅱ			○								
駅南1号橋	駅南24号線	不明	4	11.2	2021	Ⅰ			○								
後西村橋	島下島上線	不明	3.6	6.1	2023	Ⅱ					○						
山下橋	中市西本郷線	不明	7	3.5	2020	Ⅱ		○									
西光寺橋	小森線	不明	2	2.5	2020	Ⅱ		○									
永谷跨線橋	長谷駅南線	不明	105	3.7	2023	Ⅲ					○			○	○	○	
和西2号橋	鷹ノ子小森線	不明	11	4.8	2020	Ⅱ		○									
焼畑跨線橋	和西1号線	不明	35	4.8	2021	Ⅱ			○								
新唐樋橋	中領長谷線	2020	18	17.8	2021	Ⅰ			○								
島上橋	島下丸尾東線	不明	2.5	5.1	2023	Ⅱ					○						
金池橋	金池線	1951	24	4.5	2023	Ⅱ					○						
東畑橋	免地東本郷線	不明	3	6.1	2020	Ⅲ		○									
荒郷橋	郷上糸根線	不明	5	5.4	2022	Ⅱ				○							
和西橋	今宿西和西線	不明	7	3.5	2020	Ⅱ		○									
新井手橋	和西2号線	不明	4	5.8	2020	Ⅱ		○									
長谷西橋	長谷西2号線	不明	5	15.2	2021	Ⅰ			○								
古川橋	長谷古川線	不明	14	5.7	2023	Ⅱ					○						
新井手橋	岡小森線	不明	5	3.5	2020	Ⅱ		○									
宮の前橋	郷上糸根線	不明	12.7	6.2	2022	Ⅱ				○							
西畑橋	中市西本郷線	不明	4	4.3	2020	Ⅰ		○									
東扇田橋	小森和西線	不明	9.3	4	2023	Ⅳ					○		○	○	○	○	
友輪橋	郷上糸根線	不明	3	5	2021	Ⅱ			○								
上西畑橋	中市西本郷線	不明	8	4.8	2020	Ⅰ		○									

山口市橋梁長寿命化修繕計画 対象橋梁一覧表

施設名	路線名	架設 年度	橋長(m)	幅員(m)	直近の点検 実施年度	直近の 判定区分	点検実施計画年度					修繕計画年度					修繕内容
							2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028	
源吾2号橋	東本郷西本郷線	不明	4	6.9	2023	II					○						
唐樋橋	津市柏崎線	不明	8	5.5	2021	I			○								
源吾橋	東本郷西本郷線	不明	5	5.8	2020	II		○									
竹ノ下橋	矢足新山口線	1966	8	11.3	2019	II	○										
郷松橋	小森和西線	不明	9	4	2021	III			○								
郷松2号橋	小森2号線	不明	8	4.8	2020	II		○									
上小森橋	鷹ノ子小森線	不明	8	4.8	2020	II		○									
藪先橋	竹ノ下塩田線	不明	2.2	6	2021	III			○								
福田橋	古林町矢足線	不明	7	4.3	2020	II		○									
福田2号橋	古林町矢足線	不明	4	4.9	2020	II		○									
亀谷橋	東津大正町線	不明	2	7.6	2020	II		○									断面修復等
伸江橋	西陶線	不明	2	7.3	2021	II			○								
野地橋	東津大正町線	不明	2	3.7	2020	I		○									
下山手橋	長谷福田線	不明	3	6.3	2021	I			○								
藪先上橋	竹ノ下塩田線	不明	3	5.7	2021	I			○								
大正上橋	東津大正町線	不明	2	4.6	2020	II		○									
平佐上橋	4区2号線	不明	4	4	2020	II		○									
下出葉橋	中市西本郷線	不明	3	2.9	2020	II		○									
塩田下橋	昭和通り山手線	不明	5	4	2021	I			○								
第2下郷橋	柳井田津市線	不明	4	12.3	2023	II					○						
正福寺橋	昭和通り正福寺線	不明	2	2	2020	I		○									
東津橋側道橋	東津橋線	2012	143	3	2021	I			○								
東津橋	東津橋線	1979	143	7	2021	II			○								
塩田上橋	古林町山手線	不明	3	4.8	2021	I			○								
東津下橋	東津山手線	不明	2	4.8	2021	I			○								
出葉橋	中市西本郷線	不明	4	2.6	2020	I		○									
栄山橋	栄山マイクロウェーブ線	不明	3	7.2	2020	II		○									
長通り橋	長通り線	不明	2	4	2020	I		○									
第1下郷橋	柳井田津市線	不明	4	11.9	2016	II	○										
木屋橋	山手津市線	不明	3	5.5	2020	I		○									
宮の本橋	畑線	不明	5	4.8	2020	II		○									
沖田橋	山手津市線	不明	5	9.3	2020	II		○									
寿橋	東津山手線	不明	2	7.3	2021	I			○								
八枚橋	津市柳井田線	不明	2	4.2	2020	II		○									
中市西本郷線1号橋	中市西本郷線	不明	2.6	2.7	2020	II		○									
登記所橋	蔵敷中線	不明	2	3.8	2020	II		○									
畑2号橋	畑2号線	不明	7	5.7	2020	II		○									
塚田橋	東津山手線	不明	5	10.1	2021	II			○								

山口市橋梁長寿命化修繕計画 対象橋梁一覧表

施設名	路線名	架設 年度	橋長(m)	幅員(m)	直近の点検 実施年度	直近の 判定区分	点検実施計画年度					修繕計画年度					修繕内容
							2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028	
断食橋	蔵敷上線	不明	2	5.8	2020	Ⅱ		○									
足溜橋	畑線	不明	3	3.1	2020	Ⅱ		○									
相刈橋	4区1号線	1990	4	5.2	2020	Ⅱ		○									
金子山橋	6区8区線	1986	8	2.8	2020	Ⅱ		○									
上山手橋	中山手線	不明	3	7.8	2020	Ⅱ		○									
船ヶ頭1号橋	6区2号線	不明	4	4.6	2020	Ⅱ		○									
船ヶ頭2号橋	6区2号線	不明	4	3.6	2020	Ⅱ		○									
橋本橋	5区1号線	不明	4	3.7	2020	Ⅱ		○									
狼橋	4区1区線	不明	5	5.4	2020	Ⅱ		○									
中領橋	中領長谷線	不明	3	12.1	2021	I			○								
河原橋	5区1号線	不明	8	5.2	2020	I		○									
田中橋	6区8区線	不明	2	5.6	2020	Ⅱ		○									
竹下橋	2区2号線	不明	4	3.8	2020	Ⅱ		○									
泉福寺橋	柳井田江良線	不明	27	2.3	2021	Ⅱ			○								
江良歩道橋	自歩道江良橋線	1964	27	3.3	2021	Ⅱ			○								
江良橋	小浜江良線	1981	30	6.2	2019	Ⅱ	○										
八方原橋	新町岡田線	不明	125	6.8	2019	Ⅱ	○										
八方原2号橋	新町岡田線	不明	3	7.1	2021	I			○								
新町東橋	新町上郷線	不明	4	6.1	2020	Ⅱ		○									
出合新橋	4区1区線	不明	6	5	2020	I		○									
出合橋	3区2区1号線	不明	15	7.2	2019	Ⅱ	○										
宮橋	3区3号線	不明	3	4.5	2020	Ⅱ		○									
森下橋	森下八方原線	不明	6	5.3	2018	Ⅱ	○										
萬玉橋	万玉辻上線	不明	19	5.6	2021	Ⅱ			○								
八方原1号橋	新町岡田線	不明	5	16.6	2021	I			○								
円座橋	新町西桂ヶ谷線	2002	30.5	11	2022	Ⅱ				○							
桂ヶ谷3号橋	桂ヶ谷線	不明	4	3.9	2020	Ⅱ		○									
桂ヶ谷4号橋	桂ヶ谷線	不明	4	4.8	2020	Ⅱ		○									
新町橋	新町上郷線	不明	7	7.3	2021	I			○								
宮ノ下橋	新町宮ノ下線	不明	4	3	2020	Ⅱ		○									断面修復等
宮ノ原橋	小浜宮ノ原線	不明	7	6.3	2021	I			○								
桂ヶ谷2号橋	桂ヶ谷線	不明	5	3.9	2020	Ⅱ		○									
桂ヶ谷橋	桂ヶ谷線	1976	19	6.6	2021	Ⅱ			○								
畑上橋	鍛冶畑線	2003	8	7.2	2020	I		○									
寺河内橋	7区15区線	不明	5	5.8	2020	Ⅱ		○									
門前2号橋	6区8区線	不明	4	7.2	2020	I		○									
上八方原橋	八方原中線	不明	2.8	7.3	2021	I			○								
下千坊橋	7区15区線	不明	6	3.2	2020	Ⅱ		○									

山口市橋梁長寿命化修繕計画 対象橋梁一覧表

施設名	路線名	架設 年度	橋長(m)	幅員(m)	直近の点検 実施年度	直近の 判定区分	点検実施計画年度					修繕計画年度					修繕内容
							2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028	
鶴田橋	新町上郷線	不明	4	6.3	2021	I			○								
鶴田2号橋	新町上郷線	不明	4	5.3	2021	I			○								
千坊橋	7区15区線	不明	4	6.8	2020	II		○									
丸山橋	仁保津釜ヶ淵線	不明	8	5.6	2021	I			○								
光ヶ丘橋	光が丘街路16号線	2002	33.6	7	2022	I				○							
中村橋	8区1区線	不明	18	8.2	2019	II	○										
千歳橋	岩屋線	不明	3.5	2.7	2021	I			○								
鍛冶畑下橋	仁保津釜ヶ淵線	2003	9	7.5	2021	I			○								
岩屋2号橋	岩屋線	不明	4	8.8	2020	II		○									
岩屋1号橋	岩屋線	不明	4	8.2	2021	I			○								
小出橋	吉野小出線	不明	8	4.8	2023	II					○						
千坊上橋	7区15区線	不明	3.5	5	2020	I		○									
権現堂橋	中ノ岡権現堂線	1998	139	11.8	2019	II	○										
長迫橋	仁保津釜ヶ淵線	1976	13	6.8	2023	II					○						
仁保津橋	中ノ岡権現堂線	1991	15	11.4	2019	II	○										
明神橋	吉野2号線	不明	7.8	5.3	2023	II					○						
仁保津東2号橋	新町上郷線	不明	8	8.5	2021	I			○								
仁保津東橋	仁保津4号線	不明	7	12.2	2021	I			○								
桜木大橋	13区1区線	不明	21.6	6.2	2022	I				○							
吉野小橋	吉野2号線	不明	6.7	5.2	2023	II					○						
下八反田橋	9区8区線	不明	2	6.5	2020	I		○									
下小出橋	小出2号線	不明	6.9	4.8	2023	II					○						
中畑橋	鍛冶中畑線	1976	14	3.4	2020	II		○									
茶屋川1号橋	上仁保津2号線	不明	9	8.2	2021	I			○								
上吉野橋	吉野小出線	不明	8.6	3.5	2023	II					○						
茶屋川2号橋	大畑原村線	不明	6	15.8	2020	II		○									
山根橋	河内小出線	不明	4.5	10.1	2023	I					○						
龍橋	河内小出線	不明	5.8	5.6	2023	II					○						
岡田橋	堂紺吉野線	不明	9.9	4.7	2022	II				○							
鍛冶畑橋	鍛冶畑線	1999	6	7.2	2021	I			○								
関屋橋	坂東小郡線	不明	16	8.2	2023	II					○						
殿橋	河内小出線	不明	4.6	5.6	2023	I					○					断面修復等	
多良郷橋	中ノ岡多良郷線	不明	17	16.4	2019	II	○										
左尾橋	岡小路河内線	不明	2.6	8.5	2023	I					○						
正田橋	9区13区線	不明	18	8.2	2019	II	○										
せきや2号橋	朝田3号線	不明	11.7	4.8	2022	II				○							
馬橋	9区13区線	不明	21	6.4	2019	II	○										
鍛冶畑上橋	鍛冶畑線	不明	4	5	2020	II		○									

山口市橋梁長寿命化修繕計画 対象橋梁一覧表

施設名	路線名	架設 年度	橋長(m)	幅員(m)	直近の点検 実施年度	直近の 判定区分	点検実施計画年度					修繕計画年度					修繕内容
							2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028	
馬橋	管内３号線	1986	7	5.2	2020	I		○									
中畑１号橋	鍛冶中畑線	不明	5	4	2020	II		○									
上左屋橋	河内小出２号線	不明	10.5	5.8	2022	I				○							
柳井橋	岩屋平野線	不明	6.6	4.6	2023	II					○						
下左屋橋	小出岡小路線	不明	10.5	5.8	2022	I				○							
月光橋	９区２号線	不明	12	6.6	2020	II		○									
紺屋橋	平野吉野線	不明	2.4	4.5	2023	III					○						
中畑２号橋	鍛冶中畑線	不明	5	4	2020	II		○									
願社橋	中村西線	不明	2	5	2023	I					○						
高富橋	１５区線	不明	3	2.9	2020	II		○									
屋敷橋	朝田流通センター線	不明	13.5	5.8	2022	II				○							
多良郷１号橋	中ノ岡多良郷線	不明	8	5.7	2019	II	○										
樋口橋	西京１号線	不明	10.2	9.8	2022	II				○							
中畑３号橋	鍛冶中畑線	不明	5	4	2020	II		○									
下吉野橋	平野吉野線	不明	9.9	4.4	2022	II				○							
丁の首橋	中村小出線	不明	6.7	8	2023	II					○						
大塚橋	神郷３号線	不明	4	3.5	2023	II					○						
第六稔畑橋	１５区２号線	不明	7	6.1	2020	II		○									
石井手橋	１２区９区線	不明	20	2.3	2019	II	○										
郷多良橋	朝田馬庭２号線	不明	15	3.8	2019	II	○										
稔畑橋	１５区２号線	2009	7	14	2020	II		○									
上村橋	蔵場・上村線	1999	27	6	2021	I			○								
坂本橋	１６区１号線	不明	5	4.5	2020	II		○									
上村・田戸線1号橋	上村・田戸線	不明	8.4	4.6	2022	II				○							
稲谷橋	岡大塚間線	不明	4.8	3.4	2023	I					○						
中畑４号橋	鍛冶中畑線	不明	4	4	2020	II		○									
島地・平木線2号橋	島地・平木線	不明	5	3.5	2019	II	○										
天吹橋	菅内小野線	不明	9	3.6	2020	II		○									
第一新宮橋	上村・田戸線	1973	66	3.6	2019	II	○										
吉野橋	吉野１号線	不明	35	5	2019	II	○										
上仁保津橋	上仁保津１号線	1985	48	12	2019	II	○										
岸の下橋	西小出線	1979	21	11.1	2019	II	○										
阿弥陀橋	一貫野１６区線	不明	8	12	2020	II		○									
多良郷２号橋	中ノ岡多良郷線	不明	6	8.6	2019	II	○										
坂本橋	一貫野１６区線	不明	4	6.2	2020	II		○									
高田橋	田屋島岩富線	不明	143	6.4	2019	II	○										
小野7号線1号橋	小野7号線	不明	3.6	6	2019	I	○										
竹重橋	１６区２号線	不明	5	4	2020	II		○									

山口市橋梁長寿命化修繕計画 対象橋梁一覧表

施設名	路線名	架設 年度	橋長(m)	幅員(m)	直近の点検 実施年度	直近の 判定区分	点検実施計画年度					修繕計画年度					修繕内容
							2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028	
高良田橋	西1号線	不明	23	4.3	2019	Ⅲ	○						○	○	○		
粍の木・河合線2号橋	粍の木・河合線	不明	3.4	3.8	2022	Ⅱ				○							
四反田橋	神郷岡大塚線	不明	4.2	4.6	2023	Ⅰ					○						
新橋	朝田馬庭2号線	不明	15	3.8	2019	Ⅱ	○										
下藤木・沼田峠線1号橋	下藤木・沼田峠線	不明	3	4	2021	Ⅱ			○								
河内橋	和田河内線	不明	8	6.6	2023	Ⅱ					○						
泥橋	12区管内2号線	不明	3	8.6	2020	Ⅱ		○									
三作橋	坂東小郡線	不明	8	9	2021	Ⅱ			○								
小路橋	中村小出線	不明	17	7.6	2019	Ⅱ	○										
多良郷3号橋	中ノ岡多良郷線	不明	4	2.5	2019	Ⅱ	○										
岩富橋	田屋島岩富線	不明	3.4	9	2023	Ⅰ					○						
下九田橋	岡小路線	不明	17	4.6	2019	Ⅱ	○										
長池橋側道橋	間住宅閘線	不明	17	8.4	2019	Ⅱ	○										
長池橋	間住宅閘線	不明	17	9	2019	Ⅱ	○										
神岡橋	御堀平井線	2007	11.3	17	2022	Ⅱ				○							
郷塚橋	岡大塚馬木坂本線	不明	3.6	4	2022	Ⅱ				○							
志多里橋	小野高芝線	不明	10	3.9	2020	Ⅱ		○									
乙中橋	和田河内線	不明	5	2.7	2021	Ⅱ			○								
乙下橋	和田河内線	不明	5	3.6	2021	Ⅱ			○								
粍の木・河合線1号橋	粍の木・河合線	不明	4.7	2.6	2022	Ⅱ				○							
田中橋	中村小出線	不明	2.6	9.8	2023	Ⅱ					○						
九田橋	御堀平井線	2007	14.3	24.8	2022	Ⅰ				○							
鴨原団地2号橋	鴨原団地3号線	不明	3	4.6	2023	Ⅱ					○						
郷上橋	神郷2号線	不明	2.7	4.2	2023	Ⅱ					○						
大塚沖2号線1号B橋	大塚沖2号線	不明	6.5	5	2023	Ⅰ					○						
岩富3号橋	岩富線	不明	3.4	6.4	2023	Ⅱ					○						
閘橋	大塚沖閘線	不明	16	4.6	2019	Ⅲ	○						○	○	○		
鴨原団地1号橋	鴨原団地3号線	不明	3.5	6.2	2023	Ⅱ					○						
鯖地橋	9区11区線	不明	4	6.2	2020	Ⅱ		○									
大岩口橋	朝田馬庭線	不明	7	3	2019	Ⅱ	○										
小丸山橋	蔵場・西村線	1953	56	4.4	2019	Ⅱ	○										
岩富2号橋	岩富線	不明	3.8	4.4	2023	Ⅱ					○						
黒僧橋	台中野線	不明	10.6	3.6	2022	Ⅱ				○							
大歳橋	勝井中矢原線	不明	52	5.4	2019	Ⅱ	○										
大塚橋歩道橋	岡大塚馬木坂本線	不明	10.9	2.3	2023	Ⅰ					○						
大塚橋	岡大塚馬木坂本線	不明	10.8	5.9	2023	Ⅲ					○						
森橋	朝田馬庭線	不明	6	3	2019	Ⅱ	○										
中大歳橋	勝井中矢原線	不明	4.5	4.5	2023	Ⅱ					○						

山口市橋梁長寿命化修繕計画 対象橋梁一覧表

施設名	路線名	架設 年度	橋長(m)	幅員(m)	直近の点検 実施年度	直近の 判定区分	点検実施計画年度					修繕計画年度					修繕内容
							2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028	
岡本橋	小野2号線	不明	13.8	2.8	2023	Ⅲ					○						
高畑橋	勝井下湯田線	不明	3	7.7	2021	Ⅱ			○								
小原橋	中村小出線	不明	2.3	40.5	2023	Ⅰ					○						
岩富1号橋	岩富線	不明	2.7	5.4	2023	Ⅱ					○						
森長西経納線1号橋	森長西経納線	不明	9.8	2.8	2022	Ⅱ				○							断面修復等
供有橋	坂東2号線	不明	42	4.7	2019	Ⅱ	○										
樋ノ口線2号橋	樋ノ口線	不明	15	5	2021	Ⅰ			○								
木道子橋	小野1号線	不明	14	2.7	2021	Ⅱ			○								
樋ノ口線1号橋	樋ノ口線	不明	3.2	3.8	2022	Ⅱ				○							
樋ノ口・野尻線2号橋	樋ノ口・野尻線	不明	11	8.2	2022	Ⅱ				○							
上藤木・後谷線1号橋	上藤木・後谷線	不明	3	6.6	2023	Ⅱ					○						
檜木橋	坂東1号線	不明	2	6.4	2023	Ⅱ					○						
神郷橋	神郷1号線	不明	8.5	11	2023	Ⅱ					○						
岩鼻橋	小野3号線	不明	5	3.6	2020	Ⅰ		○									
車川橋	奥畑線	不明	9	4.9	2020	Ⅱ		○									
中塚橋	樋ノ口・野尻線	1974	146	7.8	2019	Ⅱ	○										
樋ノ口・野尻線1号橋	樋ノ口・野尻線	不明	10	7.7	2022	Ⅱ				○							
馬庭橋	朝田馬庭線	不明	6	4.5	2021	Ⅱ			○								
小田橋	佐野・小田線	1997	55	8	2019	Ⅱ	○										
石津橋	中村小出線	1988	169	10.8	2021	Ⅱ			○								
黒川橋	黒川市坂東線	不明	45	6.2	2019	Ⅱ	○										
上藤木・坂根線1号橋	上藤木・坂根線	不明	5.5	3.5	2022	Ⅱ				○							
下市橋	勝井下湯田線	不明	4.6	9.6	2023	Ⅰ					○						
中野橋	平井中野線	不明	2.2	5	2023	Ⅰ					○						
立石線1号橋	立石線	1984	8.8	6	2023	Ⅱ					○						
黒川小橋	黒川市坂東線	不明	2.2	8.3	2023	Ⅱ					○						
中野2号線1号橋	中野2号線	不明	3.5	11.7	2023	Ⅱ					○						
野尻・奥麻生線1号橋	野尻・奥麻生線	不明	5.1	3.3	2022	Ⅱ				○							
神田橋	茅野神田小野線	不明	49	5.8	2019	Ⅲ	○					○	○	○			
千代丸橋	勝井下湯田線	不明	46	8.7	2019	Ⅱ	○										
坂東橋	勝井下湯田線	不明	2.9	10.4	2023	Ⅱ					○						
光門寺橋	小野高芝線	不明	57	5.8	2019	Ⅲ	○					○	○	○			伸縮装置修繕等
新出橋	小野氷上線	不明	53	5.7	2021	Ⅱ			○								
新出橋	小野氷上線	1997	68	12	2021	Ⅱ			○								
藪小路橋	上矢田茅野神田線	不明	49	3.6	2019	Ⅲ	○										
岩本橋	間田小野線	不明	5	4.4	2020	Ⅰ		○									
面坊橋	1 1 区 1 2 区線	不明	43	6.1	2019	Ⅲ	○					○	○				断面修繕等
15区17区線1号橋	15区17区線	不明	4	4	2020	Ⅰ		○									

山口市橋梁長寿命化修繕計画 対象橋梁一覧表

施設名	路線名	架設 年度	橋長(m)	幅員(m)	直近の点検 実施年度	直近の 判定区分	点検実施計画年度					修繕計画年度					修繕内容
							2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028	
立石橋	藤木・立石線	1984	9.1	6	2022	II				○							
樋ノ口橋	樋ノ口線	1988	14.7	5.2	2022	II				○							
上戎原橋	下矢原矢原住宅線	不明	2.2	5.8	2023	I					○						
島地・平木線1号橋	島地・平木線	不明	3	3.5	2019	I		○									
森重橋	奥畑線	不明	9	4.8	2020	II		○									
土井・下線1号橋	土井・下線	不明	3.6	4.2	2022	I				○							
大町橋	大町・東西線	1958	41	2.3	2019	II	○										
上原橋	9区11区線	不明	3	17.4	2020	II		○									
徳行・森永線2号橋	徳行・森永線	不明	4	4	2022	II				○							
下中村橋	上千坊3号線	不明	3	9.5	2020	II		○									
台橋	上平井台線	不明	4	9.3	2023	II					○						
田町橋	問田1号線	不明	2	5.5	2020	I		○									
川上橋	中村小出線	不明	2.5	11.2	2023	II					○						
甚左田橋	中村坂東線	不明	9.4	3.7	2023	II					○						
矢原橋	中矢原矢原住宅線	不明	2	5.2	2023	II					○						
船原橋	中村小出線	不明	2.4	11	2023	II					○						
合蔵橋	合蔵線	不明	8.5	4.2	2023	II					○						
古曽中原指出線1号橋	古曽中原指出線	不明	3.4	7.3	2023	I					○						
麻生橋	土井・麻生線	1957	105	2.3	2019	II	○										
二斗代橋	中村小出線	不明	41	10.7	2019	II	○										
統中小橋	長野3号線	不明	5	6.5	2020	I		○									
土井橋	土井・麻生線	不明	10	3.3	2022	II				○							
穂積2号橋	穂積町1号線	不明	2.1	7.5	2023	I					○						
中矢原橋	矢原町穂積町線	不明	2.4	4.4	2023	II					○						
片川橋	問田5号線	不明	7	8.5	2020	II		○									
藪台橋	奥畑線	不明	9	4.8	2020	II		○									
塚田橋	中村小出線	不明	5	10.2	2023	II					○						
浅ノ久保橋	中園町台線	不明	3.9	4.9	2023	I					○						
中村小橋	下千坊上千坊2号線	不明	5	4.5	2020	I		○									
徳地藤木線1号橋	徳地藤木線	不明	13	3.8	2022	III				○							
片川橋	問田2号線	不明	6	5.7	2020	I		○									
徳行・森永線1号橋	徳行・森永線	不明	4.3	3.7	2022	I				○							
下山田橋	姫山ひびき線	不明	4	11.3	2023	II					○						
穂積1号橋	穂積町1号線	不明	3.2	3.7	2023	II					○						
九門橋	下千坊問田線	不明	4	4.5	2020	I		○									
慶福橋	大久保・大町線	1990	46	6	2022	II				○							
上八幡橋	中矢原下東線	不明	2.3	4.8	2023	III					○						プレキャストボックスカルバート設置
平ヶ谷橋	一貫野16区線	不明	4	3.6	2020	II		○									

山口市橋梁長寿命化修繕計画 対象橋梁一覧表

施設名	路線名	架設 年度	橋長(m)	幅員(m)	直近の点検 実施年度	直近の 判定区分	点検実施計画年度					修繕計画年度					修繕内容
							2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028	
上山田橋	姫山ひびき線	不明	4.4	11	2023	I					○						
湯田橋	中矢原下東線	不明	27	4.7	2019	II	○										
細田橋	下藤木・沼田峠線	不明	10	5	2021	II			○								
長野4号線1号橋	長野4号線	不明	3	8.5	2020	II		○									
永代橋	宮島町間田線	1988	68	11	2019	II	○										
勘坊橋	下千坊間田線	不明	4	5.1	2020	I		○									
長野1号線1号橋	長野1号線	不明	3	4	2020	II		○									
高芝橋	小野高芝線	不明	2	4	2020	I		○									
横部橋	高芝2号線	不明	4	4.7	2020	II		○									
熊野橋	間田姫山台線	不明	21	5.7	2019	II	○										
徳行・上線1号橋	徳行・上線	不明	3.1	4.8	2022	II				○							
下馬渡橋	下東宝町線	不明	5	2.9	2021	II			○								
上溝橋	上平井台線	不明	2.6	4.4	2023	I					○						
鬼ヶ平橋	一貫野16区線	不明	3	2.7	2020	II		○									
森河内橋	木崎佐畑1号線	不明	9.8	6.4	2022	I				○							
殿河内高芝線1号橋	殿河内高芝線	不明	2.3	5.8	2022	II				○							
菜洗橋	島地・下藤木線	1976	47	6.2	2019	II	○										
法の木橋	一貫野16区線	不明	4	3	2020	II		○									
へそくり橋	木崎佐畑1号線	不明	2	5	2023	II					○						
地吉橋	一貫野16区線	不明	4	3	2020	II		○									
下千坊橋	上千坊下千坊線	不明	3	3.3	2020	I		○									
大橋団地2号橋	下東2号線	不明	6.1	3.6	2022	II				○							
矢井西線1号橋	矢井西線	不明	9.1	3.9	2022	II				○							
舟川橋	一貫野16区線	不明	5	3.2	2020	II		○									
西大津・田屋ヶ浴線1号橋	西大津・田屋ヶ浴線	不明	6	3.8	2022	II				○							
立石橋	上平井台線	不明	2.7	4.8	2023	II					○						
氷上橋歩道橋	上矢田御堀線	2014	74.2	3.8	2023	I					○						
氷上橋	上矢田御堀線	1948	73	6.4	2019	II	○										
仕出ノ木橋	石曽根・蔵場線	不明	6.6	3.3	2022	II				○							
下出屋橋	上矢原上東2号線	不明	19	15	2019	II	○										
姫山橋	下千坊間田線	不明	59	6.2	2019	II	○										
下市橋	長野御堀2号線	不明	74	5.8	2019	II	○										伸縮装置修繕等
氷上小橋	上矢田御堀線	不明	9	6.2	2020	II		○									
田屋ヶ浴橋	西大津・田屋ヶ浴線	不明	8	3.5	2022	II				○							
広村橋	中園町台線	不明	4.2	5.1	2023	II					○						
前田橋	上矢原上東2号線	不明	14.6	12.8	2022	II				○							
中田屋橋	下市町前町線	不明	4	3.8	2021	II			○								
葵二丁目橋	葵二丁目3号線	不明	3.3	5.1	2022	I				○							

山口市橋梁長寿命化修繕計画 対象橋梁一覧表

施設名	路線名	架設 年度	橋長(m)	幅員(m)	直近の点検 実施年度	直近の 判定区分	点検実施計画年度					修繕計画年度					修繕内容
							2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028	
善原橋	前町富田原町線	不明	3	4	2021	Ⅱ			○								
上平井橋	上平井台線	不明	4.1	4.6	2023	Ⅱ					○						
大橋団地4号橋	大橋町1号線	不明	2	5.3	2022	Ⅱ				○							
葵二丁目1号橋	葵二丁目1号線	不明	3.2	3.9	2022	Ⅱ				○							
向原橋	殿河内高芝線	不明	3.1	5.2	2022	Ⅰ				○							
平安橋	島地・石曽根線	1955	55	6	2022	Ⅲ				○					○	○	
中村橋	木崎佐畑1号線	不明	2	4	2023	Ⅱ					○						
矢井中央橋	矢井中央線	2019	17.9	4	2023	Ⅰ					○						
御堀東橋	氷上5号線	不明	2	4.9	2020	Ⅱ		○									
豊年橋	中園町台線	不明	117	6.8	2021	Ⅱ			○								
下東橋	下東1号線	不明	2.2	3.6	2022	Ⅱ				○							
下千坊2号橋	下千坊氷上線	不明	6	5.5	2020	Ⅰ		○									
下市小橋	長野御堀2号線	不明	3	5	2020	Ⅱ		○									
東泉寺橋	上矢田御堀線	不明	4	5.6	2020	Ⅱ		○									
秋葉小橋	前町富田原町線	不明	4	3.6	2021	Ⅱ			○								
宮島町問田線1号橋	宮島町問田線	不明	3	7	2020	Ⅱ		○									断面修復等
葵橋	葵二丁目下東線	不明	2.4	5.3	2022	Ⅱ				○							
中西大津線1号橋	中西大津線	不明	2.6	3.5	2023	Ⅱ					○						
吉敷大橋	下東中村線	不明	35	4.1	2019	Ⅱ	○										断面修復・橋脚巻き立て
安楽橋	一貫野16区線	不明	5	3.3	2020	Ⅱ		○									
下津屋・いかだ線2号橋	下津屋・いかだ線	不明	2.5	3.7	2023	Ⅱ					○						
上京面橋	葵二丁目下東線	不明	19	4.5	2019	Ⅱ	○										
田屋橋	宮の馬場殿河内線	不明	3	5.9	2020	Ⅰ		○									
若宮橋	中村佐畑線	不明	8.6	7.2	2022	Ⅰ				○							
木船橋	中村佐畑線	不明	2.2	4.1	2022	Ⅰ				○							
真清橋	中園町台線	不明	6.1	6.8	2022	Ⅱ				○							
下津屋・いかだ線1号橋	下津屋・いかだ線	不明	2.2	9	2023	Ⅱ					○						
榎橋	葵二丁目線	不明	19	15.8	2019	Ⅱ	○										
一ッ橋	上東湯田温泉五丁目線	不明	15	6	2019	Ⅱ	○										
中川橋	宮島町問田線	1974	82	9.5	2019	Ⅱ	○					○	○	○			
千晴橋	湯田温泉六丁目9号線	不明	9.6	3.8	2022	Ⅱ				○							
上井手ヶ原橋	上平井台線	不明	4	4.7	2023	Ⅱ					○						
宮の前橋	石曽根・中村線	1978	58	6.2	2022	Ⅱ				○							
新前田橋	泉町平川線	不明	14	12	2021	Ⅱ			○								
船津・新田線1号橋	船津・新田線	不明	5.7	3.5	2022	Ⅰ				○							
滝河内1号橋	中村佐畑線	不明	6.3	4.7	2022	Ⅲ				○					○	○	
滝河内2号橋	中村佐畑線	不明	7.3	5.1	2022	Ⅱ				○							
大久保・石曽根線1号橋	大久保・石曽根線	不明	3.9	2.9	2022	Ⅱ				○							

山口市橋梁長寿命化修繕計画 対象橋梁一覧表

施設名	路線名	架設 年度	橋長(m)	幅員(m)	直近の点検 実施年度	直近の 判定区分	点検実施計画年度					修繕計画年度					修繕内容
							2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028	
滝河内 3 号橋	中村佐畑線	不明	8	4.8	2022	II				○							
下津屋橋	島地・下津屋線	不明	8.4	4.8	2022	I				○							
円光坊橋	氷上 2 号線	不明	2	3.9	2020	I		○									
白井田橋	宮の前橋線	不明	50	2.5	2022	III				○							
三和町橋	三和町 2 号線	不明	3	2.5	2021	II			○								
滝橋	佐畑 1 号線	不明	5	4	2023	II					○						
堀・片地線2号橋	堀・片地線	不明	3.1	6.7	2023	II					○						
南大橋	湯田温泉二丁目泉町線	不明	9	7.5	2021	II			○								
小高橋	赤田佐畑線	不明	6	5.7	2023	I					○						
錦橋	東山二丁目岩富線	不明	18	3.5	2019	II	○										
上錦橋	東山二丁目岩富線	不明	4	4	2021	II			○								
稲葉団地 1 号橋	稲葉町 7 号線	不明	2.3	5	2022	II				○							
稲葉団地 2 号橋	稲葉町 8 号線	不明	2.3	5.9	2022	II				○							
三旭橋	東山通り下矢原 2 号線	1986	18	16	2019	II	○										
東大橋	湯田温泉二丁目赤妻町線	不明	9	5.1	2021	II			○								
黒主橋	稲葉町線	不明	2.4	17.3	2022	II				○							
上新川橋	中恋路上矢田線	不明	10	5.2	2020	II		○									
遠内・和田線1号橋	遠内・和田線	不明	15	4	2021	II			○								
上河原橋	上東赤田線	不明	4.3	4.4	2022	II				○							
深野 4 号線 1 号橋	深野 4 号線	不明	3	9.2			○										
昭和橋	旭通り二丁目旭通り一丁目線	不明	18	4.6	2019	III	○					○	○	○			
鰐石橋	宮島町白石二丁目線	不明	46	7.2	2019	II	○										
藪台 4 号橋	奥畑線	不明	5	4.2	2021	I			○								
鰐石小橋	宮島町白石二丁目線	不明	3	5.6	2021	II			○								
山水橋	中央二丁目湯田温泉四丁目線	1979	7.6	30.7	2023	II					○						断面修復等
西寺橋	佐畑 2 号線	不明	6	9	2022	I				○							
宮部橋	元町 1 号線	不明	5	5.8	2021	II			○								
緑町橋	緑町 2 号線	不明	8.5	7.3	2022	II				○							
黄金橋	本町二丁目駅通り二丁目線	不明	10	7.1	2021	II			○								
荒田橋	元町湯田温泉六丁目線	不明	8	6.7	2021	II			○								
上小僧子橋	元町湯田温泉六丁目線	不明	7	9	2021	II			○								
下羽畠橋	糸米一丁目線	不明	7	2.5	2021	II			○								
遠内新橋	浅木・遠内線	不明	15	4.8	2019	II	○										
楠木橋	楠木町 1 号線	不明	3	3.2	2021	II			○								
中ノ尾橋	奥畑線	不明	4	3.8	2021	I			○								
伊梶橋	赤妻町上東線	不明	3	4.5	2023	II					○						
羽畠橋	糸米羽坂 2 号線	不明	7	6.5	2021	II			○								
下河原橋	赤田 3 号線	不明	2.5	9.8	2022	I				○							

山口市橋梁長寿命化修繕計画 対象橋梁一覧表

施設名	路線名	架設 年度	橋長(m)	幅員(m)	直近の点検 実施年度	直近の 判定区分	点検実施計画年度					修繕計画年度					修繕内容
							2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028	
新橋	宮島町白石二丁目線	不明	10	4.1	2021	II			○								
楠木町橋	神田町上東線	不明	3	6.3	2021	II			○								
螢見橋	上東赤田線	不明	23	6.2	2019	II	○										
新田橋	二ノ宮・船津線	1969	118	5.2	2022	II				○							
下向山橋	糸米一丁目線	不明	5	3	2021	II			○								
根崎小橋	糸米一丁目旭通り一丁目線	不明	6	11.2	2021	II			○								
神田町橋	神田町線	不明	2	4.2	2021	I			○								
船津橋	二ノ宮・山根線	1987	21	10.7	2019	II	○										
阿部橋	道祖町旭通り一丁目線	不明	11	4.6	2021	II			○								
新中田橋	浅木・遠内線	2003	18	4.8	2019	I	○										
二宮大橋	二ノ宮・山根線	1987	161	10.8	2019	II	○										
遠内上線1号橋	遠内上線	不明	5.3	3.6	2023	II					○						
河内上橋	二ノ宮・中開作線	不明	8	3.8	2022	II				○							
向山橋	糸米一丁目線	不明	6	3	2021	II			○								
船津・古森線1号橋	船津・古森線	不明	3	4.2	2023	II					○						
朝倉西橋	錦町線	不明	8	12.8	2021	II			○								
糸米橋	糸米羽坂2号線	不明	4	5.1	2021	II			○								
南白石橋	宮島町白石二丁目線	不明	7	7.5	2021	II			○								
えびす橋	黄金町野田1号線	不明	16	11.1	2019	III	○					○					断面修繕等
深野橋	中恋路上矢田線	不明	56	7.2	2019	II	○										
沖田船津線2号橋	沖田船津線	不明	3.8	3.5	2023	II					○						
赤田橋	赤田3号線	不明	3	2.7	2023	II					○						
古熊下橋	東山二丁目古熊二丁目線	不明	46	6	2019	II	○										
大野・白谷線1号橋	大野・白谷線	不明	3.1	4.3	2022	I				○							
山畑大野西線1号橋	山畑大野西線	不明	3.7	2.8	2023	II					○						
新白石橋	白石一丁目線	2005	12	4.2	2021	II			○								
新道橋	黄金町野田1号線	不明	2	14.3	2021	II			○								断面修復等
笠着橋	米屋町1号線	2012	12	8.2	2023	I					○						
大野・白谷線2号橋	大野・白谷線	不明	4.7	3.4	2022	II				○							
朝倉団地1号線1号B橋	朝倉団地1号線	不明	2.8	6.5	2022	II				○							
大番橋	漆尾志手原線	不明	5	5	2021	I			○								
須路・中村線2号橋	須路・中村線	不明	3	4	2021	I			○								
御局橋	駅通り二丁目米屋町線	2009	13	5	2021	II			○								
大野・白谷線3号橋	大野・白谷線	不明	4.2	3	2022	II				○							
白石第一橋	白石一丁目2号線	2008	9.5	5.2	2023	I					○						
二ノ宮・奥開作線1号橋	二ノ宮・奥開作線	不明	12.5	3.4	2022	II				○							
深野小橋	丸山東園線	不明	6	6.3	2019	II	○										
今茶屋橋	赤田3号線	不明	9	3.4	2023	II					○						

山口市橋梁長寿命化修繕計画 対象橋梁一覧表

施設名	路線名	架設 年度	橋長(m)	幅員(m)	直近の点検 実施年度	直近の 判定区分	点検実施計画年度					修繕計画年度					修繕内容
							2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028	
側道 開作線1号橋	側道 開作線	不明	10	5.4	2023	Ⅱ					○						
谷尻橋	下林河内谷尻線	不明	4.9	3.4	2023	Ⅱ					○						
二ノ宮・奥開作線2号橋	二ノ宮・奥開作線	不明	5	3.6	2022	Ⅱ				○							
大野・白谷線4号橋	大野・白谷線	不明	3.2	3.2	2022	Ⅱ				○							
御茶屋橋	中市町中河原線	不明	13	6.3	2021	Ⅱ			○								
大坪橋	赤田2号線	不明	21	5.2	2019	Ⅱ	○										
漆尾橋	漆尾・引谷線	1987	16	6.2	2019	Ⅱ	○										
二ノ宮・奥開作線3号橋	二ノ宮・奥開作線	不明	2.8	3	2022	Ⅰ				○							
沖田船津線1号橋	沖田船津線	不明	9.2	5.2	2023	Ⅱ					○						
向原橋	下畑・向原線	1977	64	5.2	2019	Ⅱ	○										
亀山橋	下後河原線	1972	12.8	4.3	2022	Ⅱ				○							
沖の原橋	漆尾志手原線	1972	129	4.2	2019	Ⅱ	○										
月見橋	一貫野線	不明	9	4.4	2020	Ⅱ		○									
側道・開作・北野線1号橋	側道・開作・北野線	不明	11	4.8	2023	Ⅱ					○						
鴻東橋	桜島一丁目下後河原線	不明	14	3.1	2021	Ⅱ			○								
宮の後橋	中尾東下中尾東上線	不明	12	3	2023	Ⅱ					○						断面修復等
上白石橋	春日町2号線	不明	8	18.3	2016	Ⅱ	○										断面修復等
漆尾線1号橋	漆尾線	不明	8	4.6	2023	Ⅱ					○						
東山橋	古熊三丁目道祖町線	不明	46	8.2	2019	Ⅱ	○										
琴水橋	下堅上下後河原線	不明	13.6	5.5	2022	Ⅱ				○							
乱橋	赤田1号線	不明	8	4.2	2023	Ⅱ					○						
東山小橋	古熊三丁目道祖町線	不明	3.3	5.3	2022	Ⅰ				○							断面修復等
前橋	古熊三丁目道祖町線	不明	15	4.8	2019	Ⅱ	○										
下恋路2号橋	下恋路2号線	不明	2.6	8.8	2021	Ⅱ			○								
須路・中村線1号橋	須路・中村線	不明	4	3	2021	Ⅰ			○								
五十鈴橋	春日町1号線	不明	5.2	5	2022	Ⅱ				○							
春日橋	大手町野田線	不明	13	3.7	2021	Ⅱ			○								
側道・開作・北野線2号橋	側道・開作・北野線	不明	11	4.4	2023	Ⅱ					○						
流田・源代名線1号橋	流田・源代名線	不明	6	12.5	2022	Ⅱ				○							
堀・片地線1号橋	堀・片地線	不明	4	15	2019	Ⅱ	○										
八王子橋	東園5号線	不明	55	7.2	2019	Ⅱ	○										
漆尾・引谷線1号橋	漆尾・引谷線	不明	5	3.4	2021	Ⅱ			○								
大国橋	折本一丁目下恋路線	不明	14	4.5	2021	Ⅱ			○								
清水橋	下恋路中恋路線	不明	18.9	5.3	2022	Ⅱ				○							
側道・開作・北野線3号橋	側道・開作・北野線	不明	6.9	11.4	2023	Ⅱ					○						
坂本深野8号橋	坂本深野線	不明	11	4.6	2020	Ⅱ		○									
伊勢橋	石観音伊勢橋2号線	不明	12	11	2021	Ⅱ			○								
筋違橋	桜島一丁目下後河原線	不明	8	7.6	2021	Ⅱ			○								

山口市橋梁長寿命化修繕計画 対象橋梁一覧表

施設名	路線名	架設 年度	橋長(m)	幅員(m)	直近の点検 実施年度	直近の 判定区分	点検実施計画年度					修繕計画年度					修繕内容
							2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028	
梅ノ木橋	古熊三丁目1号線	不明	2	3	2021	Ⅱ			○								
薬師橋	中恋路線	不明	14	2.6	2021	Ⅱ			○								
鳴谷・茂知木線1号橋	鳴谷・茂知木線	不明	7.4	8.1	2022	Ⅱ				○							
下河原橋	折本一丁目下恋路線	不明	2.2	7.2	2021	Ⅱ			○								
一ッ橋	水の上町香山町線	不明	13.6	3.8	2022	Ⅲ				○					○	○	
下恋路橋	折本一丁目下恋路線	不明	41	6.6	2016	Ⅲ	○					○					上部工補修
下恋路橋側道橋	折本一丁目下恋路線	2011	45	3.8	2022	Ⅰ				○							
伏野下・東西線1号橋	伏野下・東西線	不明	2.9	5.1	2023	Ⅱ					○						
東園橋	丸山東園線	不明	7	5.9	2019	Ⅱ	○										
法泉寺1号橋	滝町2号線	不明	9.2	4.8	2022	Ⅱ				○							
須崎橋	堀・片地線	1964	55	3.7	2019	Ⅱ	○										
下江良橋	八幡馬場江良線	不明	3	6.5	2021	Ⅱ			○								
柳橋	沖田須路線	1956	55	3.6	2019	Ⅱ	○										
折本一丁目橋	折本二丁目折本一丁目線	不明	5	3	2021	Ⅱ			○								
陰地第一橋	串・陰地線	1969	18	3.4	2021	Ⅲ			○								
香山橋	水の上町香山町線	不明	13.6	3.8	2022	Ⅱ				○							
丸山橋	中尾東下中尾東上線	不明	3	3.6	2023	Ⅱ					○						
漆尾・引谷線2号橋	漆尾・引谷線	不明	5	4.3	2023	Ⅱ					○						
堀・西川線1号橋	堀・西川線	不明	3	5.4	2019	Ⅱ	○										
法泉寺2号橋	滝町2号線	不明	10.4	5.3	2022	Ⅱ				○							
陰地橋	陰地・中串線	1961	15	3.6	2019	Ⅱ	○										
元山橋	中恋路上矢田線	1991	23	6.2	2021	Ⅰ			○								
中恋路橋	桜畠二丁目中恋路線	不明	43	5.8	2021	Ⅱ			○								
折本橋	桜畠一丁目下後河原線	不明	3	7.6	2021	Ⅰ			○								
小高野橋	東園6号線	1987	65	7.2	2019	Ⅱ	○										
坂本深野7号橋	坂本深野線	不明	3	4.2	2020	Ⅱ		○									
護国橋	上金古曽初瀬線	不明	4	11.6	2020	Ⅱ		○									
旭・西川線1号橋	旭・西川線	不明	2.7	3	2023	Ⅱ					○						
側道 庄方・上佐線1号橋	側道 庄方・上佐線	不明	11.5	5.2	2023	Ⅱ					○						
中尾西橋	中尾西線	不明	5	5.2	2023	Ⅱ					○						
庄方・才契線1号橋	庄方・才契線	不明	6.4	5	2022	Ⅰ				○							
丸山橋	中尾西中尾東上2号線	不明	6.9	6.2	2022	Ⅰ				○							
上恋路橋	上恋路中恋路線	不明	18	3	2021	Ⅱ			○								
江良橋	八幡馬場江良線	不明	5	6.1	2021	Ⅱ			○								
中尾橋	中尾東下中尾東上線	不明	6	3.3	2023	Ⅱ					○						
上田橋	田屋・上田線	不明	10	3.4	2022	Ⅱ				○							
桜畠小橋	上桜畠桜畠一丁目線	不明	16	5.2	2021	Ⅰ			○								
西の浴橋	中尾西線	不明	4	5.2	2023	Ⅱ					○						

山口市橋梁長寿命化修繕計画 対象橋梁一覧表

施設名	路線名	架設 年度	橋長(m)	幅員(m)	直近の点検 実施年度	直近の 判定区分	点検実施計画年度					修繕計画年度					修繕内容
							2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028	
俊竜寺橋	木町天花2号線	不明	11	2.8	2020	II		○									
坂本深野1号橋	坂本深野線	不明	3	5.9	2020	II		○									
栗林橋	中尾西中尾東上線	不明	10	3.3	2023	III					○				○	○	
側道 連絡4号線1号橋	側道 連絡4号線	不明	4.6	4.7	2023	II					○						
関・中央線1号橋	関・中央線	不明	4.3	3.8	2023	II					○						
西桜畠橋	桜畠一丁目西桜畠線	不明	16	6.2	2021	I			○								
初瀬橋	平野5号線	不明	2.5	15.7	2021	II			○								断面修復等
青木橋	桜畠二丁目上恋路線	不明	43	6.2	2021	II			○								
坂本深野6号橋	坂本深野線	不明	4	5	2020	II		○									
平野橋	平野5号線	不明	2.3	12.1	2021	II			○								
殿河内橋	桜畠一丁目西桜畠線	不明	4.3	4.7	2021	II			○								
上恋路線1号橋	上恋路線	不明	2.4	7.4			○										
丸山3号橋	下郷丸山5号線	不明	4	5.7	2020	II		○									
熊坂2号橋	熊坂2号線	不明	3.3	4.3	2021	II			○								
上角・中角線1号橋	上角・中角線	不明	6.8	3.3	2023	II					○						
下土井橋	上桜畠桜畠三丁目線	不明	7	4.1	2021	II			○								
坂本深野5号橋	坂本深野線	不明	5	5	2020	II		○									
一渡瀬橋	下郷丸山6号線	不明	79	7.2	2019	II	○										
丸山橋	下郷丸山1号線	不明	8	5.9	2019	II	○										
丸山2号橋	下郷丸山5号線	不明	5	8.1	2020	II		○									
上角・保堂線1号橋	上角・保堂線	不明	10	6.6	2022	II				○							
常栄寺橋	平野線	不明	2	8.3	2020	II		○									
桜畠1号橋	桜畠三丁目1号線	不明	13	17.4	2021	II			○								
徳間草橋	安養地・高瀬線	1984	17	7.7	2022	III				○							
丸山1号橋	丸山東園線	不明	5	14.4	2019	II	○										
落合橋	住吉熊坂線	不明	6	4.5	2020	II		○									
向河内橋	上串・上角線	1954	14.6	6	2023	II					○						
漆尾・引谷線3号橋	漆尾・引谷線	不明	6.2	5.8	2023	II					○						
桜畠2号橋	桜畠四丁目西桜畠線	不明	3.7	4.8	2019	II	○										
才谷線1号橋	才谷線	不明	3	4.1	2023	II					○						
中田橋	熊坂線	不明	3	5.3	2019	II	○										
木船橋	初瀬江良線	不明	3.7	10.2	2021	II			○								
中尾西吉敷畑線1号橋	中尾西吉敷畑線	不明	4	9.1	2022	I				○							
上串・上角線1号橋	上串・上角線	不明	5.8	5.4	2023	II					○						
足谷橋	足谷・山ノ奥線	1986	12.4	6.2	2022	II				○							
小古祖・元折線2号橋	小古祖・元折線	不明	8	5.8	2019	I	○										
坂本深野4号橋	坂本深野線	不明	7	5.2	2020	II		○									
庄方・才契線2号橋	庄方・才契線	不明	4.9	2.8	2022	II				○							

山口市橋梁長寿命化修繕計画 対象橋梁一覧表

施設名	路線名	架設 年度	橋長(m)	幅員(m)	直近の点検 実施年度	直近の 判定区分	点検実施計画年度					修繕計画年度					修繕内容
							2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028	
安養地・真蒲線1号橋	安養地・真蒲線	不明	13	3.3	2023	Ⅱ					○						
上串・上角線2号橋	上串・上角線	不明	3	5.8	2023	Ⅱ					○						断面修復等
上川尻橋	熊坂線	不明	4	3.7	2019	Ⅱ	○										
川尻橋	熊坂線	不明	3	3.6	2019	Ⅱ	○										
第2俊竜寺橋	天花線	不明	10	2.9	2021	Ⅱ			○								
上三蔵橋	中尾西中尾東上線	不明	7	3.4	2023	Ⅱ					○						
登尾橋	坂本線	不明	19	4.5	2019	Ⅱ	○										
才谷・中央線1号橋	才谷・中央線	不明	2.8	2	2022	Ⅰ				○							
北野橋	才谷・北野線	1958	94	3.3	2019	Ⅱ	○										
泉花寺橋	上桜畠桜畠三丁目線	不明	5	4.1	2021	Ⅱ			○								
洗川橋	丸山東園線	1990	7	6.6	2019	Ⅰ	○										
古堂橋	木町天花1号線	不明	2	4.4	2021	Ⅰ			○								
三蔵橋	中尾西中尾東上線	不明	6.5	3.4	2023	Ⅱ					○						
大方橋	下郷丸山2号線	不明	6	6.2	2020	Ⅱ		○									
初音橋	住吉熊坂線	1960	30.6	5.1	2023	Ⅲ					○	○	○	○	○		断面修復等
初音橋側道橋	住吉熊坂線	1989	34	3.3	2021	Ⅱ			○								
江良上橋	八幡馬場江良線	不明	4	2.7	2021	Ⅱ			○								
庄方・才契線3号橋	庄方・才契線	不明	3.4	4.3	2022	Ⅱ				○							
柳屋大橋	住吉河原線	不明	2.6	2.4	2019	Ⅱ	○										
天神橋	大山路河原線	不明	25.3	3.4	2022	Ⅱ				○							防護柵修繕
一里塚橋	河原住吉線	不明	7	6.1	2021	Ⅱ			○								
宮野中央住吉線1号橋	宮野中央住吉線	不明	2.7	4.7	2021	Ⅱ			○								
椿橋	桜畠三丁目上桜畠線	不明	6	3	2021	Ⅱ			○								
堀・小古祖線1号橋	堀・小古祖線	不明	4.6	5.7	2022	Ⅱ				○							
足谷・山ノ奥線2号橋	足谷・山ノ奥線	不明	4.4	3.2	2022	Ⅱ				○							
小古祖・元折線1号橋	小古祖・元折線	不明	9	5.3	2019	Ⅰ	○										
上角北線1号橋	上角北線	不明	4.7	2.6	2023	Ⅱ					○						
堀・小古祖線2号橋	堀・小古祖線	不明	7.5	8.6	2022	Ⅱ				○							
田中橋	住吉1号線	不明	4	3.7	2020	Ⅱ		○									
鯖・三島線1号橋	鯖・三島線	不明	7.4	3.4	2022	Ⅱ				○							
尾崎橋	河原線	不明	3	5.6	2021	Ⅱ			○								
夫婦橋	安養地・帆柱線	不明	7.7	4.8	2022	Ⅱ				○							
永楽橋	河原大山路線	1992	30	9	2023	Ⅱ					○						
蔵渡瀬橋	土井両浴線	不明	50	7	2019	Ⅱ	○										
観音橋	大山路4号線	1955	2.8	4.6	2019	Ⅱ	○										
坂本深野2号橋	坂本深野線	不明	11	4.4	2020	Ⅱ		○									
御用院橋	桜畠三丁目上桜畠線	不明	6	2.6	2021	Ⅱ			○								
風呂ノ本線1号橋	風呂ノ本線	不明	5.3	2.7	2023	Ⅱ					○						断面修復等

山口市橋梁長寿命化修繕計画 対象橋梁一覧表

施設名	路線名	架設 年度	橋長(m)	幅員(m)	直近の点検 実施年度	直近の 判定区分	点検実施計画年度					修繕計画年度					修繕内容
							2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028	
森3号橋	大山路北恋路線	不明	9	3	2021	Ⅱ			○								
森2号橋	大山路北恋路線	不明	3	3	2021	Ⅱ			○								
滑谷橋	小古祖・元折線	不明	10	5.8	2019	Ⅱ	○										
坂本深野3号橋	坂本深野線	不明	3	4.8	2020	Ⅱ		○									
足谷・山ノ奥線1号橋	足谷・山ノ奥線	不明	4.5	3	2022	Ⅱ				○							
鯖・向ヶ迫線1号橋	鯖・向ヶ迫線	不明	7.5	4.4	2023	Ⅱ					○						
松柄橋	松柄線	不明	4	4.8	2019	Ⅰ	○										
上小古祖東線2号橋	上小古祖東線	不明	5.5	3	2022	Ⅱ				○							
畑橋	住吉1号線	不明	4	3.5	2020	Ⅱ		○									
森1号橋	大山路北恋路線	不明	4	5.4	2021	Ⅱ			○								
上小古祖東線1号橋	上小古祖東線	不明	5.2	3.2	2022	Ⅱ				○							
台田上橋	中尾西線	不明	8	4.3	2023	Ⅱ					○						
竹ノ丸中橋	土井野上線	1990	22	7.2	2019	Ⅱ	○										
大江橋	石丸2号線	不明	7	3	2021	Ⅱ			○								
御所野線1号橋	御所野線	不明	10.3	6.2	2022	Ⅱ				○							
井領橋	原河内2号線	不明	21	6	2019	Ⅱ	○										
湯屋橋	原河内4号線	不明	5	5.6	2020	Ⅱ		○									
井開田東坂本線1号橋	井開田東坂本線	不明	4.4	4.1	2022	Ⅰ				○							
うつか橋	堀・小古祖線	不明	16	5.5	2019	Ⅱ	○										
御所野橋	小古祖・元折線	1991	18	5	2019	Ⅱ	○										
北野橋	小古祖・元折線	1992	12	6.5	2019	Ⅱ	○										
雲明橋	小古祖・元折線	不明	9	5.2	2019	Ⅱ	○										
竹の丸上橋	高野東線	不明	22	5	2019	Ⅱ	○										
旧蔵橋	石丸線	不明	10	3.1	2021	Ⅱ			○								断面修復等
新蔵橋	石丸線	不明	27	4.1	2021	Ⅱ			○								
大蔵橋	天花畑4号線	不明	9.5	4.3	2022	Ⅰ				○							
ニッ堂2号橋	天花畑3号線	不明	5	3.2	2021	Ⅱ			○								
才契中線1号橋	才契中線	不明	6.5	3	2023	Ⅱ					○						
目眠橋	天花畑2号線	不明	7	3.2	2021	Ⅱ			○								
上中野橋	河原竜花線	不明	3	5.2	2021	Ⅱ			○								
泉竜花線1号橋	泉竜花線	不明	4.6	9.8	2022	Ⅰ				○							
ニッ堂3号橋	天花畑3号線	不明	5	3.3	2021	Ⅱ			○								
深谷橋	深谷・巢垣線	不明	10.4	3.4	2022	Ⅱ				○							
柿ノ木橋	戸祢・瀬戸原線	1992	19	6.8	2021	Ⅱ			○								
ニッ堂1号橋	天花畑3号線	不明	8.7	3.3	2022	Ⅱ				○							断面修復等
下河内・原線1号橋	下河内・原線	不明	9	3.3	2022	Ⅱ				○							
才契上線1号橋	才契上線	不明	5.7	5.1	2023	Ⅱ					○						
安養地・帆柱線1号橋	安養地・帆柱線	不明	4.3	4.5	2022	Ⅱ				○							

山口市橋梁長寿命化修繕計画 対象橋梁一覧表

施設名	路線名	架設 年度	橋長(m)	幅員(m)	直近の点検 実施年度	直近の 判定区分	点検実施計画年度					修繕計画年度					修繕内容
							2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028	
観音橋	天花畑 2 号線	1984	9	5	2021	Ⅱ			○								
漆尾・引谷線4号橋	漆尾・引谷線	不明	7.4	4.6	2023	Ⅱ					○						
榎谷橋	戸祢・瀬戸原線	不明	7.8	3.2	2022	Ⅱ				○							
井開田橋	井開田西 1 号線	不明	25	6.3	2019	Ⅱ	○										
橋詰橋	漆尾・引谷線	1997	10.9	9.7	2023	Ⅱ					○						
安養地・帆柱線2号橋	安養地・帆柱線	不明	4.8	4.4	2022	Ⅱ				○							
七房橋	七房 3 号線	不明	5	4	2019	Ⅱ	○										断面修復等
引明橋	深谷線	1990	5	5.2	2023	Ⅱ					○						
御所野・鯖線1号橋	御所野・鯖線	不明	11	6.4	2022	Ⅱ				○							
安養地・帆柱線3号橋	安養地・帆柱線	不明	5.4	4.6	2022	Ⅱ				○							
下川添・落合線1号橋	下川添・落合線	不明	7.7	2.3	2022	Ⅱ				○							
廣瀬橋	小古祖・横野線	2003	74.1	9.2	2023	Ⅱ					○						
仁保市橋	仁保市線	不明	15	5.2	2019	Ⅱ	○										
兄弟橋	土井両浴線	1987	9	3.3	2019	Ⅱ	○										
上八坂・才契線2号橋	上八坂・才契線	不明	5.5	3.6	2022	Ⅱ				○							
上八坂・才契線1号橋	上八坂・才契線	不明	5.3	3.3	2022	Ⅱ				○							
浅地 3 号橋	両浴 1 号線	不明	3	6	2019	Ⅱ	○										
上石川橋	両浴 1 号線	不明	3	6	2019	Ⅱ	○										
西・狸尾線1号橋	西・狸尾線	不明	6.7	2.5	2022	Ⅱ				○							
教林寺橋	土井両浴線	1994	12	4	2019	Ⅱ	○										
横野・公会堂線1号橋	横野・公会堂線	不明	3	6	2022	I				○							
土田橋	引谷小学校線	不明	16	5	2022	I				○							
皇徳寺橋	高野西高畠線	不明	26	3.1	2019	Ⅲ	○										
橘橋	泉竜花線	不明	33	5.2	2021	Ⅱ			○								
養着橋	両浴 1 号線	不明	3	4.6	2019	Ⅱ	○										
上黒岩橋	七房 1 号線	不明	5	7.6	2021	Ⅱ			○								
塩川 1 号橋	北河内 3 号線	不明	2	3.9	2020	Ⅱ		○									
瀧橋	天花畑 1 号線	不明	8	1.5	2021	Ⅱ			○								
両浴橋	両浴 5 号線	不明	9	3.1	2020	Ⅱ		○									
恋頭橋	両浴 5 号線	不明	9	3.6	2020	Ⅱ		○									
下中畑橋	下中畑・大峠線	1955	19	5.2	2022	I				○							
下田橋	北河内高畠線	不明	26	5.6	2019	Ⅲ	○										
土囲の下橋	北河内高畠線	不明	3	4.5	2020	I		○									
楮原橋	両浴 1 号線	不明	10	5.4	2019	Ⅱ	○										
柳田・戸祢線1号橋	柳田・戸祢線	不明	6.1	4.6	2022	I				○							
大峠橋	大峠・石ヶ原線	不明	15	3.7	2021	Ⅲ			○								
黒石下橋	北河内 3 号線	不明	4	3.8	2020	I		○									
野稻橋	土井両浴線	不明	7	3.5	2019	Ⅱ	○										

山口市橋梁長寿命化修繕計画 対象橋梁一覧表

施設名	路線名	架設 年度	橋長(m)	幅員(m)	直近の点検 実施年度	直近の 判定区分	点検実施計画年度					修繕計画年度					修繕内容
							2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028	
浅地1号橋	両浴1号線	不明	6	3.5	2019	Ⅱ	○										
川口上線1号橋	川口上線	不明	11.4	3	2022	Ⅱ				○							
奥川口橋	川口・刈干線	不明	3.3	4.9	2023	Ⅱ					○						
小河内中橋	北河内5号線	不明	8	5	2020	Ⅰ		○									
北河内6号線1号橋	北河内6号線	不明	24.6	3.1	2022	Ⅱ				○							
上勘橋	岩杖線	不明	6	3	2020	Ⅱ		○									
黒石橋	北河内2号線	不明	25	4.8	2019	Ⅱ	○										
二反田橋	土井両浴線	不明	7	3.9	2019	Ⅱ	○										
三谷川橋	乙女・上八坂線	1954	35	6.3	2023	Ⅲ					○			○	○	○	
梶木橋	岩杖線	不明	8	3.7	2020	Ⅱ		○									
家成線1号橋	家成線	不明	15	2.5	2021	Ⅱ			○								
巢垣橋	円清・奈良原線	1964	19	3.4	2021	Ⅱ			○								
新巢垣橋	深谷・巢垣線	1978	21	4.8	2015	Ⅱ	○										
円清・奈良原線1号橋	円清・奈良原線	不明	3.5	5.4	2022	Ⅰ				○							
荷背橋	岩杖線	不明	3	2.7	2020	Ⅱ		○									
北谷橋	北谷線	不明	12.5	5.2	2023	Ⅰ					○						
真名子橋	上八坂・才契線	1975	84	5.8	2021	Ⅱ			○								
神原橋	日平・神原線	1965	23	2.7	2021	Ⅱ			○								
小河内橋	北河内1号線	不明	7	8.3	2019	Ⅱ	○										
円清・奈良原線2号橋	円清・奈良原線	不明	6.6	4.8	2022	Ⅱ				○							
国木線1号橋	国木線	不明	9.5	3.2	2023	Ⅱ					○						断面修復等
船谷橋	神原・下船谷線	1962	16	3.9	2021	Ⅱ			○								
三谷橋	円清・奈良原線	不明	16	4.8	2021	Ⅱ			○								
国木橋	北谷・山ノ上線	不明	6.6	3.3	2022	Ⅱ				○							
縄手橋	岩杖線	不明	6	3	2021	Ⅱ			○								
森の下橋	岩杖線	不明	7	4	2021	Ⅱ			○								
名古脇小橋	一ノ瀬2号線	不明	10	3.7	2020	Ⅱ		○									橋面防水工
深瀬東線1号橋	深瀬東線	不明	10.5	3.4	2023	Ⅱ					○						
中谷橋	木地屋・中谷線	1964	20	2.2	2021	Ⅱ			○								
北谷・山ノ上線1号橋	北谷・山ノ上線	不明	9.8	3.6	2022	Ⅱ				○							
城山橋	一ノ瀬2号線	1989	23	4.2	2019	Ⅱ	○										
白水橋	一ノ瀬線	不明	5	4	2020	Ⅱ		○									
法雲院橋	一ノ瀬線	1990	22	4.7	2019	Ⅱ	○										防護柵修繕
高瀬橋	下庄・丸山線	1982	63	6.2	2019	Ⅱ	○										
宮河内橋	川口・屋敷線	不明	12	5.6	2019	Ⅱ	○										
田代第四号橋	田代線	不明	4.6	3	2022	Ⅰ				○							
金坪橋	金坪線	不明	6	5.7	2020	Ⅰ		○									
田代第三号橋	田代線	不明	2	4.5	2022	Ⅰ				○							

山口市橋梁長寿命化修繕計画 対象橋梁一覧表

施設名	路線名	架設 年度	橋長(m)	幅員(m)	直近の点検 実施年度	直近の 判定区分	点検実施計画年度					修繕計画年度					修繕内容
							2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028	
前原・志手ノ木線4号橋	前原・志手ノ木線	不明	12.2	3.9	2023	Ⅱ					○						
下奥谷線1号橋	下奥谷線	不明	2.1	2.9	2023	Ⅱ					○						
前原・志手ノ木線1号橋	前原・志手ノ木線	不明	3.8	4	2022	Ⅰ				○							
原橋	船路大月線	1998	17	6.2	2019	Ⅱ	○										
大畠2号線1号橋	大畠2号線	不明	8	4.8	2020	Ⅱ		○									
田代第二号橋	田代線	不明	6.1	4.2	2023	Ⅱ					○						断面修復等
岩倉下橋	上郷大畠線	不明	9	3.4	2019	Ⅱ	○										
船路大月線1号橋	船路大月線	不明	5	4.4	2019	Ⅰ	○										
大峠橋	大峠線	1970	4.1	3.7	2022	Ⅰ				○							
岩倉上橋	上郷大畠線	不明	9	3.4	2019	Ⅱ	○										
船路大月線7号橋	船路大月線	不明	3	3.3	2019	Ⅱ	○										
板見堂橋	板見堂線	不明	5.8	3	2022	Ⅰ				○							
田代第一号橋	田代線	不明	3	3.5	2021	Ⅱ			○								
椿橋	板見堂線	不明	9.5	3	2022	Ⅰ				○							
船路大月線6号橋	船路大月線	不明	5	6	2019	Ⅱ	○										
前原・志手ノ木線2号橋	前原・志手ノ木線	不明	4.5	3.2	2022	Ⅱ				○							
奥河内線1号橋	奥河内線	不明	11.6	2.7	2022	Ⅱ				○							
岩倉橋	上郷大畠線	不明	6	2.4	2019	Ⅰ	○										
文珠橋	大峠線	1958	3.5	3	2022	Ⅰ				○							
文珠上橋	篠目文珠線	1979	4	4.1	2021	Ⅱ			○								
間方橋	御馬・間方線	1959	57	2.7	2021	Ⅲ			○								
上奥河内線1号橋	上奥河内線	不明	13.3	4.2	2023	Ⅱ					○						
文珠下橋	篠目文珠線	不明	4	4.5	2021	Ⅱ			○								
船路大月線5号橋	船路大月線	不明	6	3.5	2019	Ⅱ	○										
桃木線1号橋	桃木線	不明	7.8	3.3	2022	Ⅱ				○							
船路大月線2号橋	船路大月線	不明	13	4.4	2019	Ⅱ	○										
船路大月線3号橋	船路大月線	不明	11	3.6	2019	Ⅱ	○										
船路大月線4号橋(彌六橋)	船路大月線	不明	8	3	2019	Ⅱ	○										
屋敷・長者ヶ原線1号橋	屋敷・長者ヶ原線	不明	4	4.6	2023	Ⅱ					○						断面修復等
乱橋	篠目文珠線	1938	20	5.5	2019	Ⅱ	○										
久保橋	川口・屋敷線	1988	43	10.1	2019	Ⅱ	○										
屋敷・長者ヶ原線2号橋	屋敷・長者ヶ原線	不明	5.4	3.8	2023	Ⅱ					○						
第二大江河内橋	大江河内線	不明	10.2	3	2022	Ⅰ				○							
下谷口橋	見付線	不明	8.8	3.5	2022	Ⅰ				○							
林橋	見付線	不明	10.1	3	2022	Ⅰ				○							
梶畑線3号橋	梶畑線	不明	3	3.6	2023	Ⅱ					○						
白口橋	見付線	不明	4.2	3.3	2022	Ⅰ				○							
古釜橋	見付線	不明	3	3.5	2022	Ⅰ				○							

山口市橋梁長寿命化修繕計画 対象橋梁一覧表

施設名	路線名	架設 年度	橋長(m)	幅員(m)	直近の点検 実施年度	直近の 判定区分	点検実施計画年度					修繕計画年度					修繕内容
							2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028	
前原・志手ノ木線3号橋	前原・志手ノ木線	不明	8.9	4.1	2022	II				○							
第一大江河内橋	大江河内線	不明	10.3	4	2022	II				○							
滝の下橋	見付線	不明	4	4	2022	I				○							
出合橋	御馬・ゆづりは線	1938	41	5.9	2022	III				○					○	○	
見付橋	見付線	1964	13	3.6	2021	II			○								
中郷(向山)橋	篠目文珠線	不明	2	3.4	2022	II				○							
見附東橋	見付東線	不明	12	4.2	2019	II	○										
梶畑線2号橋	梶畑線	不明	4.7	3.7	2023	II					○						断面修復等
志手ノ木線1号橋	志手ノ木線	不明	2.7	3.9	2022	II				○							
馬渡瀬橋	小河内線	不明	8.4	3.2	2022	II				○							
桃木・梶畑線1号橋	桃木・梶畑線	不明	8.9	4.4	2022	II				○							
第三細野橋	細野線	不明	3	3.1	2022	I				○							
梶畑線1号橋	梶畑線	不明	5	3.4	2023	III					○						
白井谷橋	御馬・ゆづりは線	1988	19	7.7	2022	II				○							
海禅寺橋	上中郷線	不明	10.3	4	2022	I				○							
白瀬橋	大林線	不明	12	1.3	2019	II	○										
第二細野橋	細野線	不明	2.4	3.5	2022	I				○							
中郷橋	中郷中線	1989	22	3.1	2020	II		○									
柴崎橋	中郷細野線	1965	5.9	6.7	2022	I				○							
小林橋	細野小林線	1974	19	3.6	2019	III	○										
九鬼橋	桃木・梶畑線	1959	15	4	2021	II			○								
吉原橋	中郷細野線	1950	5	4.6	2022	I				○							
高明橋	釣山梶畑線	不明	13.9	4	2022	II				○							
第一細野橋	細野線	不明	2.7	4.3	2022	II				○							
第二北谷橋	御馬・ゆづりは線	1953	14.8	6.2	2023	II					○						
細野橋	篠目文珠線	1950	15	5.6	2019	II	○										
第3北谷橋	北谷・白井線	不明	13	5.2	2022	II				○							
釣山梶畑線10号橋	釣山梶畑線	不明	2.1	3.6	2022	II				○							
第4北谷橋	北谷・白井線	不明	6	5.2	2022	II				○							
下出合・釣山線1号橋	下出合・釣山線	不明	4.9	3.6	2022	II				○							断面修復等
河井橋	篠目文珠線	不明	3	4.8	2021	II			○								
釣山梶畑線5号橋	釣山梶畑線	不明	5.4	3.9	2022	II				○							
釣山梶畑線4号橋	釣山梶畑線	不明	9.4	3.9	2023	II					○						
釣山梶畑線9号橋	釣山梶畑線	不明	5.1	3.8	2022	II				○							
第二隠蔽橋	釣山梶畑線	1959	22.2	4.5	2023	II					○						
北谷・白井線2号橋	北谷・白井線	不明	15	4.6	2021	II			○								
釣山梶畑線8号橋	釣山梶畑線	不明	8.1	3.9	2023	II					○						
橋本橋	橋本細野線	1972	23	3.1	2019	II	○										

山口市橋梁長寿命化修繕計画 対象橋梁一覧表

施設名	路線名	架設 年度	橋長(m)	幅員(m)	直近の点検 実施年度	直近の 判定区分	点検実施計画年度					修繕計画年度					修繕内容
							2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028	
釣山梶畑線6号橋	釣山梶畑線	不明	2.6	3.9	2022	I				○							
隠蔽橋	隠蔽・滑線	1955	17.5	3.9	2023	II					○						
釣山梶畑線7号橋	釣山梶畑線	不明	2.4	3.8	2022	II				○							
釣山梶畑線2号橋	釣山梶畑線	不明	3	3.8	2022	II				○							
釣山梶畑線3号橋	釣山梶畑線	不明	3	3.8	2022	II				○							
北谷・白井線1号橋	北谷・白井線	不明	9	4.7	2019	II	○										
下滑橋	隠蔽・滑線	1955	19.8	4	2023	II					○						
日暮川橋	釣山梶畑線	1955	20.2	3.9	2023	II					○						
嫁叶橋	岡草嫁叶線	1972	27	3.5	2019	II	○										
下出合・釣山線2号橋	下出合・釣山線	不明	4.8	5.4	2022	II				○							
下今明橋	釣山梶畑線	1967	11.1	3.9	2023	II					○						
隠蔽・滑線1号橋	隠蔽・滑線	不明	3.2	4	2022	II				○							
隠蔽・滑線2号橋	隠蔽・滑線	不明	7.7	4.2	2023	II					○						
畠中橋	岡草嫁叶線	不明	7	4	2021	II			○								
隠蔽・滑線3号橋	隠蔽・滑線	不明	14.4	4.2	2023	II					○						
岡草橋	岡草嫁叶線	1972	37	6.3	2019	II	○										
釣山梶畑線1号橋	釣山梶畑線	不明	3.7	4.8	2022	II				○							
中村橋	岡草嫁叶線	不明	9.5	4.2	2023	I					○						
養徳原下祖父線1号橋	養徳原下祖父線	不明	5.2	3.7	2023	II					○						
釣山橋	釣山梶畑線	1951	26.3	4.4	2023	II					○						
祖父第2橋	釣山梶畑線	2007	28	6	2021	I			○								
祖父第一橋	釣山梶畑線	1977	32	5	2021	I			○								
釣山祖父線1号橋	釣山祖父線	不明	7	3.3	2022	II				○							
祖父橋	笹ヶ滝・祖父線	1987	28.1	4.6	2023	II					○						
祖父・野夫線1号橋	祖父・野夫線	不明	6.8	3	2022	I				○							
祖父・野夫線2号橋	祖父・野夫線	不明	3.4	2.7	2023	II					○						
笹ヶ滝橋	笹ヶ滝・祖父線	2004	26	2.5	2021	I			○								
堂ヶ谷橋	御堂原千頭線	不明	6	3.2	2021	II			○								
日の迫橋	御堂原千頭線	不明	6	3.5	2021	II			○								
千頭橋	千頭大野線	1956	52	3.7	2019	II	○										
母屋橋	千頭大野線	不明	3	2.9	2021	II			○								
大谷橋	千頭大野線	不明	7	3.8	2021	II			○								
柳ヶ浴橋	築地西線	不明	5	2	2021	II			○								
芝添橋	築地線	不明	6	4	2021	II			○								
渡川橋	渡川停車場線	1974	61	3.7	2019	III	○								○	○	
渡川小橋	渡川停車場線	不明	2	6.5	2021	II			○								
小野・高巣線2号橋	小野・高巣線	不明	3.9	7.5	2022	II				○							
下柚木線1号橋	下柚木線	不明	4.2	3	2022	I				○							

山口市橋梁長寿命化修繕計画 対象橋梁一覧表

施設名	路線名	架設 年度	橋長(m)	幅員(m)	直近の点検 実施年度	直近の 判定区分	点検実施計画年度					修繕計画年度					修繕内容
							2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028	
小野・高巢線1号橋	小野・高巢線	不明	5	4.5	2022	Ⅱ				○							
第一清丸橋	清丸線	2001	7	4.8	2021	Ⅱ			○								
榎谷橋	榎谷杉原線	1974	61	3.7	2019	Ⅱ	○										
榎谷小橋	榎谷線	不明	6	3.2	2021	Ⅱ			○								
第二清丸橋	清丸線	不明	10	3.1	2021	Ⅱ			○								
柚木大橋	柚木・刀迫線	1981	35	6.7	2019	Ⅱ	○										
栃谷橋	栃谷線	不明	4	3.2	2021	Ⅱ			○								
杉ノ原橋	開作西側線	不明	7	3	2022	I				○							
今明橋	小野・高巢線	1959	28	2.9	2021	Ⅱ			○								
開作橋	開作横断線	1953	25	3.8	2020	Ⅱ		○									
上杉原橋	杉原三谷線	1974	53	2.7	2020	Ⅱ		○									
古屋敷橋	古屋敷線	不明	4	7.2	2021	Ⅱ			○								
柚木・刀迫線1号橋	柚木・刀迫線	不明	4	4.3	2019	Ⅱ	○										
刀迫線1号橋	刀迫線	不明	4.7	3.2	2023	Ⅱ					○						
風呂橋	刀迫・大内谷線	不明	19	7.8	2021	I			○								
中野橋	中野・河内線	1989	16	6.2	2022	Ⅱ				○							
上三谷橋	上三谷線	1964	17	3.2	2019	Ⅱ	○										
第二市井原橋	第2市井原線	1974	17	3.2	2019	Ⅱ	○										
中野線1号橋	中野線	不明	4	3.4	2023	Ⅱ					○						
中野線2号橋	中野線	不明	4.3	2.6	2023	Ⅱ					○						
下鷹ノ巣橋	たかのす阿代河内線	1974	53	3.6	2019	Ⅱ	○										
鷹の巣橋	たかのす牛人屋線	1972	53	3.7	2019	Ⅱ	○										
長尾橋	長尾線	1990	41	5	2020	Ⅱ		○									
大内谷・大藤線1号橋	大内谷・大藤線	不明	2.9	4.9	2022	Ⅱ				○							
第二八幡原橋	山田追分線	不明	7	4.8	2021	Ⅱ			○								
八幡原橋	八幡原線	不明	9	4.8	2021	I			○								
山田原橋	山田追分線	不明	5	5.8	2021	Ⅱ			○								
杉尾橋	天子中線	不明	4.5	2.8	2022	I				○							
鷹子橋	若小幡線	1972	6	7.8	2021	Ⅱ			○								
若林橋	八幡原我河内線	1973	20	3.7	2019	Ⅱ	○										
第三大藤橋	大内谷・大藤線	不明	8.5	4.6	2022	Ⅱ				○							断面修復
河内・川上線1号橋	河内・川上線	不明	7	5.7	2022	Ⅱ				○							
岩永橋	長尾寺河内線	1967	37	3.6	2020	Ⅱ		○									
荒瀬橋	杉原荒瀬線	不明	13	4.7	2021	Ⅱ			○								
栃崎橋	栃崎線	不明	5.5	3	2022	I				○							
村木橋	栃崎線	不明	2.5	3	2022	I				○							
第三懸橋	名草懸線	不明	4	3.3	2021	Ⅱ			○								
名草橋	市井原線	1967	59	5.2	2019	Ⅲ	○								○	○	

山口市橋梁長寿命化修繕計画 対象橋梁一覧表

施設名	路線名	架設 年度	橋長(m)	幅員(m)	直近の点検 実施年度	直近の 判定区分	点検実施計画年度					修繕計画年度					修繕内容
							2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028	
山田小橋	山田追分線	不明	2	4.2	2021	I			○								
山田橋	封秀線	1965	54.2	6.9	2023	II					○						
山田橋側道橋	封秀線	2007	58	2.5	2019	I	○										
第二懸橋	名草懸線	不明	2	2.9	2021	I			○								
愛宕橋	河内・川上線	1984	22	6.2	2022	II				○							
川向橋	芋尻暮床線	不明	2.8	3	2022	I				○							
第一懸橋	名草懸線	不明	2	2.5	2021	I			○								
暮床橋	芋尻暮床線	1967	37	3.6	2020	II		○									
暮床奥橋	芋尻暮床線	不明	3	3	2022	I				○							
第四大藤橋	大内谷・大藤線	不明	6.5	5	2022	II				○							
中間丈橋	井出口沖田線	1966	59	3.8	2019	II	○										
封秀橋	封秀線	1986	9	8.2	2021	II			○								
牛入屋橋	たかのす牛入屋線	1967	20	4.5	2019	II	○										
新牛入屋橋	たかのす牛入屋線	2003	28	6.2	2019	II	○										
第二沖田橋	惣原山田線	1961	4	6	2021	II			○								
曾根橋	さくら小学校線	不明	2	3.3	2021	I			○								
沖田橋	惣原山田線	1961	6	6	2021	II			○								
井手口橋	井出口沖田線	1992	57	4.8	2019	II	○										
惣原橋	惣原線	不明	4	2.8	2021	II			○								
第2岡橋	地福市惣原線	1952	5	8.1	2021	II			○								
開敷小橋	開敷線	不明	3	3.6	2021	II			○								
川上・東線1号橋	川上・東線	不明	2.7	2.3	2023	II					○						
岡橋	地福市惣原線	1995	14	8.2	2021	II			○								
開敷橋	開敷線	不明	12	4.1	2021	II			○								
惣原橋	地福市惣原線	不明	5	8.8	2021	II			○								
中惣原橋	店屋線	不明	4	3	2021	I			○								
用路墓地橋	用路墓地線	不明	5	3.3	2021	I			○								
大谷山橋	大谷山線	1967	12	4	2021	II			○								
用路橋	用路線	不明	5	3.6	2021	I			○								
下地橋	下地線	1969	38	3.4	2020	II		○									
西ヶ原橋	栃崎線	不明	4.6	3.3	2022	I				○							
第2下地橋	寺田線	不明	3.9	4	2022	I				○							
店屋橋	長谷原線	不明	2	5.1	2021	II			○								
開原橋	寺田線	不明	5.2	4	2022	I				○							
赤根屋橋	赤根屋墓地線	不明	7	3.6	2021	II			○								
的場橋	森ヶ久保線	1990	22	5	2019	II	○										
寺田線1号橋	寺田線	不明	2.3	3.2	2022	II				○							
鍋倉橋	鍋倉東線	1966	52	6.9	2016	III	○					○	○	○			

山口市橋梁長寿命化修繕計画 対象橋梁一覧表

施設名	路線名	架設 年度	橋長(m)	幅員(m)	直近の点検 実施年度	直近の 判定区分	点検実施計画年度					修繕計画年度					修繕内容
							2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028	
寺田沖橋	寺田沖線	不明	7.1	4.8	2023	I					○						
寺田橋	寺田木和田線	1967	35	3.6	2020	II		○									
足王橋	足王線	不明	11	4.9	2021	II			○								
郷橋	寺田木和田線	不明	2	8	2022	II				○							
徳佛橋	鍋倉東線	2019	74.3	5	2019	I	○										
清水橋	上市中村線	1993	37	4.8	2020	I		○									
中村橋	寺田木和田線	不明	4.7	3	2022	I				○							
第2徳佛橋	徳佛線	不明	6	5.9	2021	I			○								
小藤治橋	古市寺田線	不明	6.9	7	2023	I					○						
麦谷橋	須の原線	不明	6.2	3.5	2022	II				○							
大河内小橋	寺田線	不明	7.4	3	2022	II				○							
掛ノ原橋	的場線	不明	14	4	2021	II			○								
第二大河内橋	古市木和田線	不明	6.3	4.1	2022	II				○							
大河内橋	古市木和田線	1967	26	4.6	2020	II		○									
九箱橋	九箱線	不明	9.3	8.1	2023	II					○						
常盤橋	古市木和田線	不明	8	8.1	2022	II				○							
第三木和田橋	木和田線	1950	10.2	7.6	2023	II					○						
新須の原橋	須の原線	1994	14	8.2	2021	II			○								
森長橋	第2相上線	1988	33	5	2020	II		○									
野道橋	下市野道線	不明	4	3.4	2021	II			○								
町線1号橋	町線	不明	3.1	12.3	2022	I				○							
栃原橋	開作秋鹿線	不明	4.1	4.4	2023	II					○						
銅橋	阿東むつみ線	不明	7.9	4.1	2022	I				○							
西目谷橋	西目谷線	1972	16	4	2019	II	○										
下谷橋	東側線	1952	18	5.9	2019	II	○										
西村橋	長沢開作線	不明	10	3.7	2021	II			○								
姥金橋	姥金線	1966	31	3.6	2020	II		○									
東畑橋	東畑線	不明	6	3.3	2021	I			○								
法田寺前橋	法田寺墓地線	不明	3	4.6	2023	I					○						
長沢開作線1号橋	長沢開作線	不明	5	3.2	2021	I			○								
新白井谷橋	白井谷須の原線	1993	10.6	5	2022	II				○							
荒瀬川橋	徳佐六市線	不明	13	4.3	2020	II		○									
成谷橋	成谷線	不明	4.9	3.4	2023	II					○						断面修復等
第1観月橋	東側線	1952	13	6.1	2020	II		○									
朝早橋	下市坂田線	2017	61	6.8	2019	I	○										
第2観月橋	徳佐六市線	不明	14.3	9.6	2023	III					○						
新台明橋	下市坂田線	不明	4	4.6	2021	II			○								
掛沖第二橋	掛沖線	不明	11	2.6	2021	II			○								

山口市橋梁長寿命化修繕計画 対象橋梁一覧表

施設名	路線名	架設 年度	橋長(m)	幅員(m)	直近の点検 実施年度	直近の 判定区分	点検実施計画年度					修繕計画年度					修繕内容
							2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028	
嘉年川橋	西側線	1992	40	6.2	2019	II	○										
御所川内橋	御所河内墓地線	不明	5	3.3	2021	II			○								
大久保橋	下市坂田線	1988	43	6.2	2019	II	○										
成仏橋	東側線	1973	13.3	5.8	2023	III					○						
下小原橋	小原線	2017	34.3	5.2	2023	I					○						
久保橋	久保線	不明	4.1	2.7	2023	II					○						
小南第2橋	上市小南線	不明	2.2	6	2023	II					○						
正地橋	正地線	1967	28.6	3.6	2023	I					○						再塗装、コンクリート巻き立て
上小原橋	小原線	1986	24	3.4	2021	I			○								
藤目谷橋	藤目谷線	不明	5.8	3.5	2022	I				○							
大山橋	久保線	1954	50	3.4	2020	II		○									
念仏橋	真土線	1967	25	4.4	2019	II	○										伸縮装置修繕等
下向橋	鍛冶ヶ原線	2017	50.9	5.2	2023	I					○						
第2正地橋	藤目谷線	不明	6.9	6	2022	II				○							
昭和橋	駅通上宇津根線	1982	36	6.2	2019	II	○										
昭和橋	駅通上宇津根線	1967	23	4.1	2019	II	○										
森川内橋	徳佐中央線	1977	6	7.7	2021	II			○								
赤松東橋	赤松東線	不明	5.2	3.9	2023	II					○						
坂手橋	東側線	1961	21	5.3	2019	II	○										
平丸第2橋	西側線	不明	4.5	6.3	2023	II					○						
竜宮橋	小南東線	不明	7	3.1	2021	II			○								
平丸第1橋	西側線	不明	3.4	6	2023	II					○						
小南橋	上市小南線	不明	7	3.8	2021	II			○								
赤松橋	赤松線	不明	7	3.6	2022	II				○							
野地橋	大山線	1998	38	3.5	2020	II		○									
大山橋	阿東むつみ線	1928	45.1	5	2023	II					○						
第2野地橋	赤松野地線	不明	3.2	3	2023	I					○						
南河内橋	南河内線	2016	45.8	4.2	2021	I			○								
貞行橋	西側線	不明	5	5.5	2020	II		○									
貞行橋	貞行小南線	不明	23	2.4	2019	II	○										
稲成第一橋	稲成線	不明	4	3	2022	I				○							
稲成第2橋	稲成線	不明	5	2.8	2023	II					○						
九十郎橋	徳佐中央線	1976	12	7.7	2021	II			○								
日ノ向橋	神角日向線	1967	21	3.5	2019	I	○										
桶敷橋	桶敷線	1971	24	3.2	2019	II	○										
上日ノ向橋	神角日向線	2016	28.4	5.2	2019	I	○										
水戸第2橋	西側線	不明	2.5	6.1	2023	II					○						
矢柱橋	矢柱線	不明	9.6	3	2022	II				○							

山口市橋梁長寿命化修繕計画 対象橋梁一覧表

施設名	路線名	架設 年度	橋長(m)	幅員(m)	直近の点検 実施年度	直近の 判定区分	点検実施計画年度					修繕計画年度					修繕内容
							2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028	
市之瀬橋	井戸市之瀬線	不明	8	4.8	2020	II		○									
上油免橋	油免線	不明	5	3.2	2020	II		○									
八反田橋	八反田線	不明	15	3.7	2019	II	○										
火打原橋	井戸市之瀬線	不明	6	8	2021	II			○								
夏焼橋	八反田線	不明	13	4.1	2020	II		○									
砂田橋	八反田線	不明	2	5.9	2020	II		○									
井戸川橋	井戸市之瀬線	不明	5	5.4	2020	II		○									
大迫沖橋	第1大迫線	不明	2.4	14	2020	II		○									
大迫橋	長迫線	不明	2.5	5	2023	II					○						
殿山橋	殿山線	不明	9	4.5	2020	II		○									
居坂橋	瀬戸線	不明	7	4	2020	II		○									
八幡橋	長迫線	不明	5.4	5.5	2023	I					○						
西居坂橋	西居坂線	不明	5	16.7	2020	II		○									
鞍馬橋	居坂国牛線	1968	11	4.4	2020	II		○									
瀬戸橋	瀬戸線	1971	10	3	2020	II		○									
藤木橋	藤木線	不明	2.5	6.9	2023	II					○						
松橋	堂免開籠線	不明	2	5.6	2021	II			○								
第2堂免橋	嘉年上線	不明	4	5.1	2021	II			○								
高田橋	高田線	不明	3	6.4	2021	I			○								
第1堂免橋	嘉年上線	不明	5	5.6	2021	II			○								
第1神田橋	嘉年上線	1983	8	8.2	2020	I		○									
神田橋	嘉年上線	1981	7	8.2	2020	II		○									
出戸線1号橋	出戸線	不明	3	3.5	2020	II		○									
千坊橋	堂免開籠線	不明	6	3.8	2021	II			○								
