

山口市橋梁長寿命化修繕計画



徳佛橋（とくぶつばし） 令和元年5月 竣工

令和8年1月

山口市

目次

1. はじめに.....	1
1.1 背景.....	1
1.2 目的.....	2
1.3 基本方針.....	2
2. 山口市管理の道路橋の状況.....	3
2.1 施設の基本情報.....	3
2.2 施設の損傷状況.....	4
3. 長寿命化修繕計画.....	6
3.1 長寿命化修繕計画の基本条件.....	6
3.2 点検.....	6
3.3 診断.....	7
3.4 措置.....	7
3.4.1 対策内容と実施時期.....	7
3.4.2 対策優先度の評価.....	7
3.4.3 対策工法の設定.....	8
3.5 記録.....	8
3.6 優先度評価の検討.....	8
3.7 対策内容と実施時期.....	9
3.8 長寿命化修繕計画の効果.....	9
3.8.1 LCC 縮減の考え方.....	9
3.8.2 長寿命化修繕計画の策定・運用効果.....	9
3.9 新技術等の活用及び集約化・撤去による費用の縮減に関する具体的な方針.....	10
3.9.1 新技術等の活用方針.....	10
3.9.2 新技術等による費用縮減.....	11
3.9.3 集約化・撤去による費用縮減.....	11
4. 計画の見直し改善.....	12
5. 計画策定担当部署および意見聴取した学識経験者.....	12

1. はじめに

1.1 背景

山口市は山口県のほぼ中央に位置し、豊かな自然や歴史が共存する文化都市です。また、室町時代には大内氏が本拠としたことで発展し「西の京」と称され、幕末には藩庁が移され、明治維新の中心的役割を果たしました。これら歴史や文化資源が今に残されており、湯田温泉などを含めて、観光地としての魅力も備えた都市でもあります。

また、国道、県道、高速自動車道などの広域交通網が整い、山陽新幹線、山口宇部空港といった高速交通網との接続の便もよく、広域交流の拠点としての優位性を有しています。

道路網に代表される社会資本は、社会・経済活動ならびに安心・安全な生活を送る上で最も重要な基盤であり、これらの道路施設の多くが1950年代から1980年代にかけて整備されたことから、施設の老朽化が著しく、2040年には80%以上の道路施設が建設後50年以上を経過することとなります。（表1.1、表1.2、図1.1）

このため、これまでの「事後保全型」による維持管理では更新費用の確保や持続的な機能の保持が困難となることが予想されることから、今ある施設の集約化・撤去を視野に入れつつ、計画的・効果的に修繕を行うことにより長期的に利用できるよう、「予防保全型」の維持管理を行うことが重要な課題となっています。

表 1.1 山口市における整備後経過年数（2022年時点）

供用年数／橋梁数			
30年未満	30年～50年未満	50年以上	合計
189	712	415	1316
14.4%	54.1%	31.5%	100%

表 1.2 山口市における整備後経過年数（2042年時点）

供用年数／橋梁数			
30年未満	30年～50年未満	50年以上	合計
15	174	1127	1316
1.1%	13.2%	85.6%	100%

※架設年度不明なものは構造形式等により推定

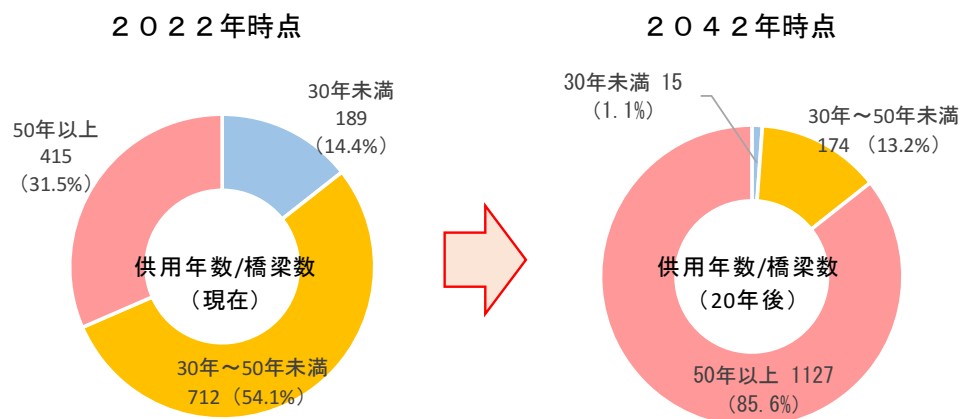


図 1.1 山口市における高齢化橋梁の状況

1.2 目的

市民のみならず多くの来訪者が安心・安全に道路を通行できるように、橋梁の特性や財政状況を踏まえて適切な維持管理を行い、維持管理コストの平準化と縮減を図ることを目的とします。

1.3 基本方針

予防保全型の維持管理に転換し、橋梁の長寿命化を図ります。（図 1.2）

点検	5年に1度の定期点検を実施し、橋梁の状態を継続的に把握します。
診断	橋梁の健全性を評価し、対策の必要性を適切に判断します。
措置	健全性の回復を図るとともに劣化要因を除去するための対策を実施します。
記録	実施した結果を継続的に蓄積します。

また、PDCA サイクルに基づき計画の策定・運用・改善を継続的に実行します。（図 1.2）

Plan	適切な優先度評価基準を指標とした優先度評価を行い、計画的に補修計画を立案します。
Do	点検・診断・措置・記録のメンテナンスサイクルを実行します。
Check	実施した計画の進捗確認を行い、対策内容の効果を踏まえ、事業の実施状況进行评估します。
Action	進捗確認ならびに対策内容の評価を基に、長寿命化修繕計画のさらなる改善を図ります。

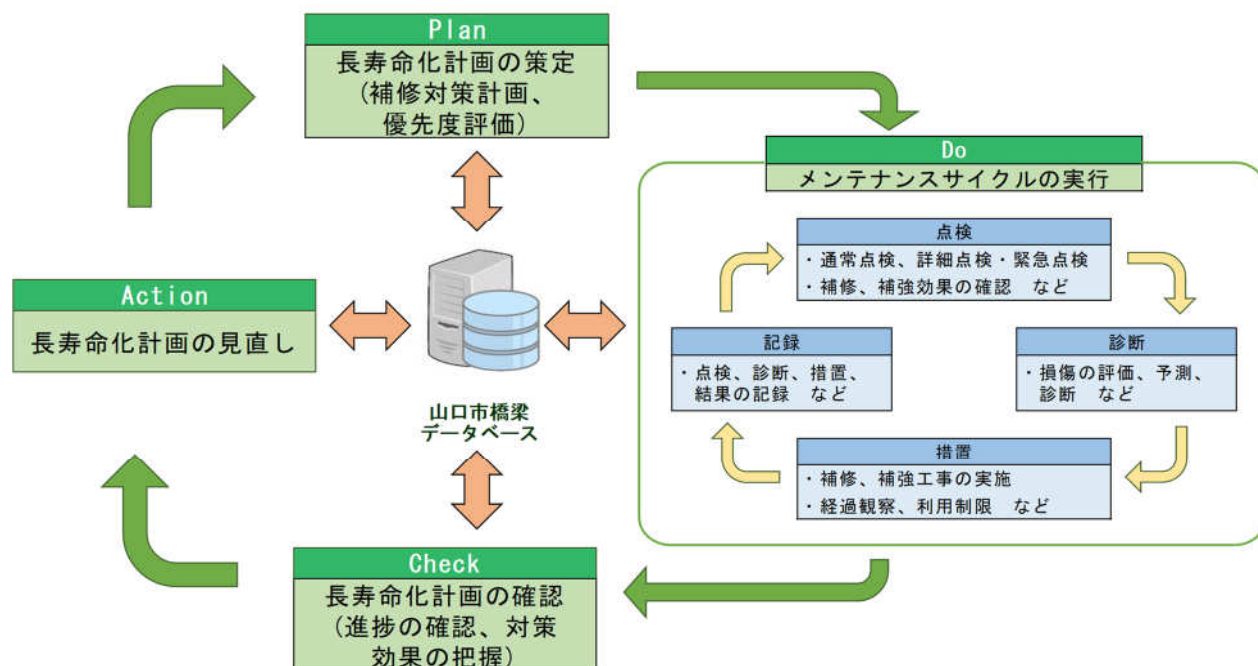


図 1.2 橋梁維持管理の流れ

2. 山口市管理の道路橋の状況

2.1 施設の基本情報

対象とする施設は、本市が管理する橋長2.0m以上の橋梁1,316橋です。(表2.1)

市内の全橋梁のうち、コンクリートで作られた橋梁(溝橋、RC橋、PC橋)が約90%を占めています。(表2.2、図2.1)

市内の全橋梁のうち、鋼(金属)で作られた橋梁が約7%を占めています。(表2.2、図2.1)

表 2.1 対象橋梁数

	橋長15m未満	橋長15m以上
橋梁数	1,011	305
合計	1,316	

表 2.2 橋梁種別ごとの橋梁数

橋梁種別	橋梁数	割合
溝橋	136	10.3%
RC橋	770	58.5%
PC橋	302	23.0%
鋼橋	87	6.6%
その他	21	1.6%
合計	1316	100.0%

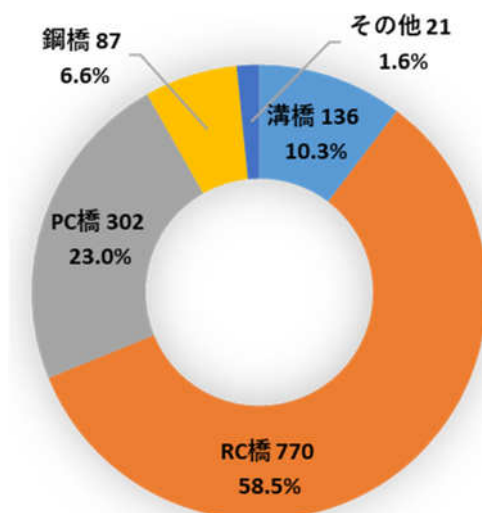


図 2.1 橋梁種別ごとの橋梁数

- ※1 溝 橋 : 橋長2m以上かつ土被り1m未満のカルバート
- ※2 RC 橋 : 主要構造（主桁）に鉄筋コンクリートを用いた橋梁
- ※3 PC 橋 : 主要構造（主桁）にプレストレストコンクリートを用いた橋梁
- ※4 鋼 橋 : 主要構造（主桁）に鋼材を用いた橋梁
- ※5 その他 : 1橋の中で鋼橋、RC 橋、PC 橋が混在する混合橋や石橋、木橋を含む橋梁

2.2 施設の損傷状況

道路メンテナンス2巡目終了時点である令和5（2023）年度末における、本市の道路施設に係る損傷状況は下記のとおりです。


「道路橋定期点検要領（国土交通省）」「山口県橋梁点検要領（案）」に基づき点検・診断を行った結果、全体の49橋（3.7%）の橋梁が早期に対応が必要な「早期措置段階（Ⅲ判定）」、また、1橋（0.1%）が「緊急措置段階（Ⅳ判定）」という結果になりました。（表2.3、図2.2）

一方で、「予防保全段階（Ⅱ判定）」の橋梁が大半（74.3%）を占めており、このまま放置すると、「早期措置段階（Ⅲ判定）」になることが懸念されます。（表2.3、図2.2）


表 2.3 健全度評価区分ごとの橋梁数

健全度	15m 未満		15m 以上		全体	
	橋梁数	構成比率	橋梁数	構成比率	橋梁数	構成比率
I：健全	243	24.0%	45	14.8%	288	21.9%
II：予防保全段階	747	73.9%	231	75.7%	978	74.3%
III：早期措置段階	20	2.0%	29	9.5%	49	3.7%
IV：緊急措置段階	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
合計	1,011		305		1,316	

橋長 15 m未満の橋梁

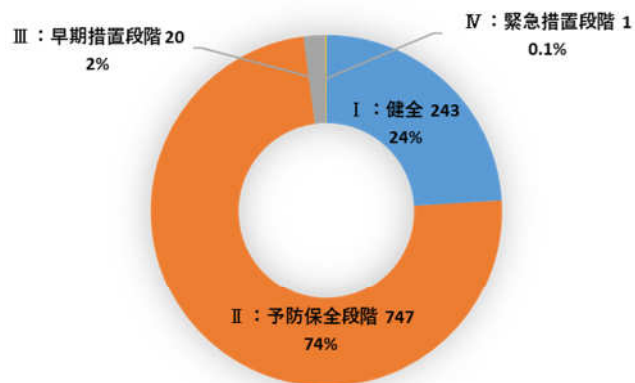

橋長 15 m以上の橋梁

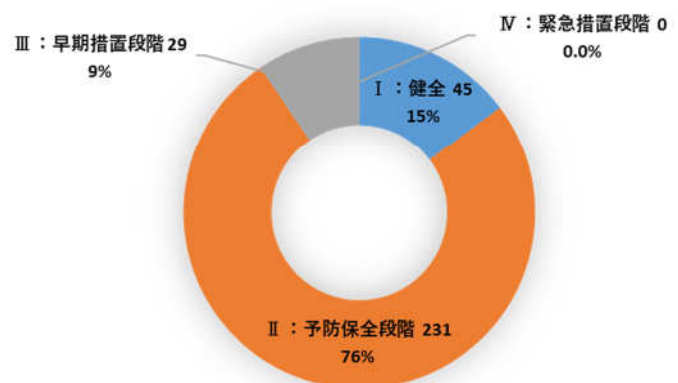

橋梁全体

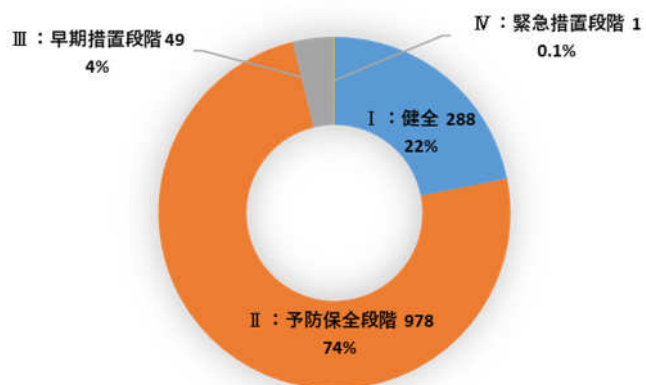


図 2.2 健全度評価区分ごとの橋梁（2巡目終了時点）

3. 長寿命化修繕計画

3.1 長寿命化修繕計画の基本条件

本市が管理する橋長15m未満の橋梁1,011橋、橋長15m以上の橋梁305橋の、合計1,316橋を対象とします。

計画期間は10年間とします。ただし、5年に1度の定期点検により、優先順位の見直しを実施します。

橋梁の規模、路線の性格、ライフサイクルコスト（以下、LCC）等の観点から橋梁毎に管理区分を設定します。管理手法としては全橋梁において予防保全型とします。

3.2 点検

「山口県橋梁点検要領（案）」に基づき、必要な知識及び技能を有する者が、近接目視により5年に1回の頻度で実施することを基本とします。

表 3.1 点検計画一覧表（3巡目点検）

点検年度	橋梁数
令和6（2024）年度	258
令和7（2025）年度	276
令和8（2026）年度	291
令和9（2027）年度	236
令和10（2028）年度	255

3.3 診断

橋梁の健全度はⅠ～Ⅳの４段階に分類し、部材単位および橋梁単位で健全性の診断を行います。

表 3.2 健全性の判定区分

区分		定義
Ⅰ	健全	道路橋の機能に支障が生じていない状態。
Ⅱ	予防保全段階	道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
Ⅲ	早期措置段階	道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
Ⅳ	緊急措置段階	道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

出典：橋梁定期点検要領 平成 31 年 3 月 国土交通省道路局国道・技術課

3.4 措置

橋梁毎に設定する施設の重要度と損傷の深刻度を考慮した対策優先度を評価した上で、計画的かつ効果的に対策を実施します。計画は点検や補修・補強だけではなく、更新（架替）も視野に入れ、LCC分析により措置方針を検討し、計画的に取り組んでいきます。

さらに、今後の人口推移や予算状況を踏まえ、集約化・撤去も視野に入れて取り組んでいきます。また、日常的には、パトロールや清掃などの維持管理に加え、市民からの通報等の情報をデータベース化することにより道路施設の安全性を保ちます。

3.4.1 対策内容と実施時期

点検で確認された各損傷について、対策工を実施します。対策工は点検結果でⅡ、Ⅲ、Ⅳと判定された損傷について実施します。対策時期は優先順位の高い橋梁より実施し、健全度がⅢと判定された橋梁については、点検後５年以内を目途に実施する方針とします。

3.4.2 対策優先度の評価

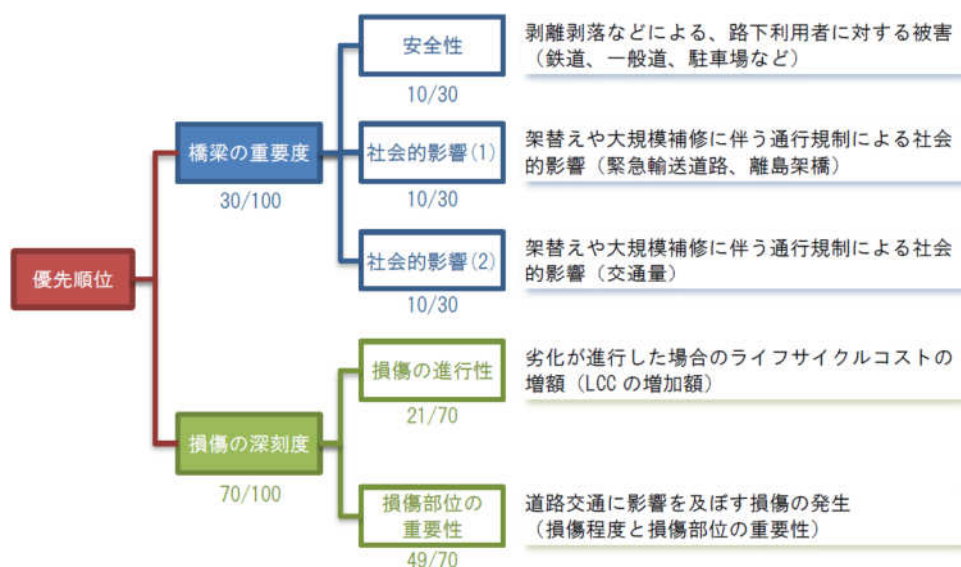


図 3.1 対策優先度評価の方法

3.4.3 対策工法の設定

対策工法については、対象部材や損傷の程度および橋長を考慮して検討します。

表 3.3 橋長区分ごとの対策工の設定一覧（橋長 15 m 以上）

対象部材		対策工法		備考
		Ⅱ	Ⅲ	
主桁 ・床版	鋼	塗装塗替え工	塗装塗替え工	
	RC・PC	ひび割れ補修工	ひび割れ補修工	健全度により対策範囲を設定
		断面修復工	断面修復工	健全度により対策範囲を設定
		表面含浸工	表面含浸工（鉄筋腐食抑制）	
橋台・橋脚		ひび割れ補修工	ひび割れ補修工	健全度により対策範囲を設定
		断面修復工	断面修復工	健全度により対策範囲を設定
		表面含浸工	表面含浸工（鉄筋腐食抑制）	
橋面		床板防水工（シート系）	床板防水工（シート系）	
支承		支承塗装工	支承防錆工	
伸縮装置		伸縮装置取替工	伸縮装置取替工	
防護柵		防護柵防錆工（常温メッキ）	防護柵取替工	
仮設工		吊足場	吊足場	

表 3.4 橋長区分ごとの対策工の設定一覧（橋長 15 m 未満）

対象部材		対策工法		備考
		Ⅱ	Ⅲ	
主桁 ・床版	鋼	塗装塗替え工	塗装塗替え工	
	RC・PC	ひび割れ補修工	ひび割れ補修工	健全度により対策範囲を設定
		断面修復工	断面修復工	健全度により対策範囲を設定
		表面含浸工	表面含浸工（鉄筋腐食抑制）	
橋台・橋脚		ひび割れ補修工	ひび割れ補修工	健全度により対策範囲を設定
		断面修復工	断面修復工	健全度により対策範囲を設定
		表面含浸工	表面含浸工（鉄筋腐食抑制）	
仮設工		吊足場	吊足場	

3.5 記録

継続的に点検・診断・措置の結果を蓄積します。又、蓄積された結果については、補修対策や次回点検にフィードバックし活用します。

3.6 優先度評価の検討

限られた予算で効果的な維持管理を実行するため、「橋梁の重要度」と「損傷の深刻度」を考慮し、対策の優先順位を設定します。

設定した優先順位に沿って、計画的に対策を実施し、橋梁の長寿命化を図ります。

3.7 対策内容と実施時期

橋梁点検結果を基に、損傷度に応じた対策工法を設定し、個々の橋梁について、修繕の内容、修繕の実施時期等を計画します。

3.8 長寿命化修繕計画の効果

3.8.1 LCC縮減の考え方

損傷が軽微なうちに補修（予防保全型）することで、1回当たりの修繕に要する費用を安価に抑えることにより、致命的欠陥が顕在化した段階で補修（事後保全型）する場合に比べて修繕の回数は多くなりますが、総費用が抑えられ、LCCの縮減が期待できます。

3.8.2 長寿命化修繕計画の策定・運用効果

今後50年間の事業費予測を、事後保全型管理手法で行った場合と、予防保全型管理手法で行った場合を比較します。（図3.2）

従来型の管理に比べて、予防保全型管理手法を導入することにより、今後50年間で900億円が100億円（▲800億円）となり、約9割のコスト縮減効果が期待できます。（図3.2）

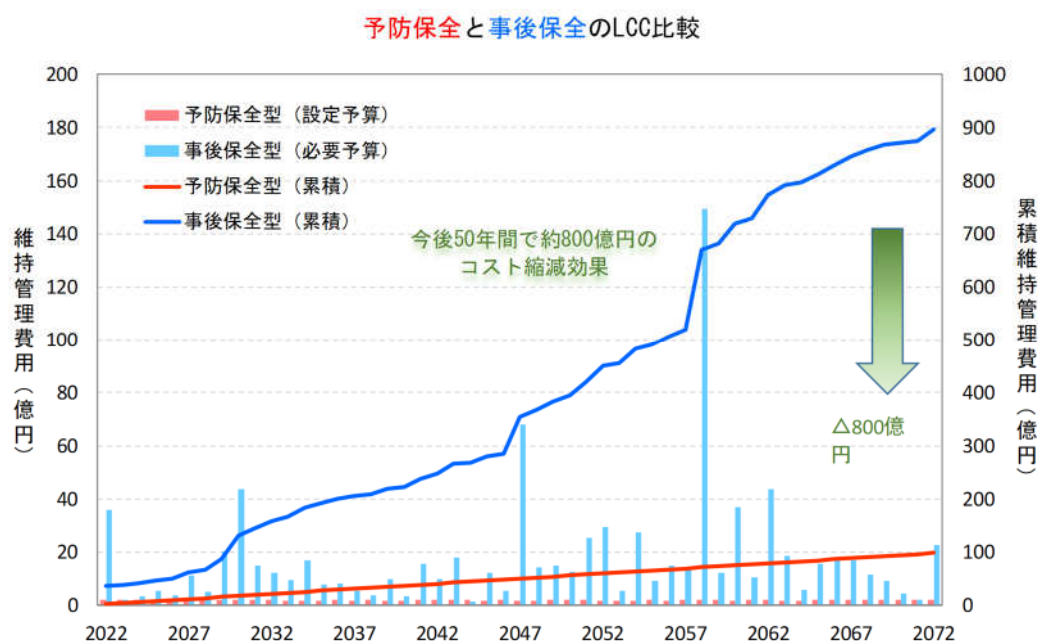


図 3.2 長寿命化修繕計画によるコスト縮減効果（試算）

※）用語の説明

- ・LCC：ライフサイクルコスト（life-cycle cost）とは、橋梁の設計～建設～修繕～解体（更新）するまでの全期間に要する費用のことを示します。
- ・メンテナンスサイクルとは、橋梁の安全安心等を確保するため、点検⇒診断⇒措置（修繕等）⇒記録を継続して行うことを示します。
- ・事後保全（橋梁の損傷が大きくなった段階で大規模な修繕、架替えを行うこと）から、予防保全（定期的に点検を行い早期発見、早期対策を計画的に行うこと）への転換により、橋梁の寿命を延ばすことでLCCの縮減が期待できます。

3.9 新技術等の活用及び集約化・撤去による費用の縮減に関する具体的な方針

3.9.1 新技術等の活用方針

山口市が管理する橋梁点検や修繕等の実施にあたっては、維持管理に関する最新のメンテナンス技術と従来技術を比較検討し、有効なものは積極的に活用していくことで効率化を目指します。なお、山口市では、点検調書作成システムを用いた効率化を図ります。

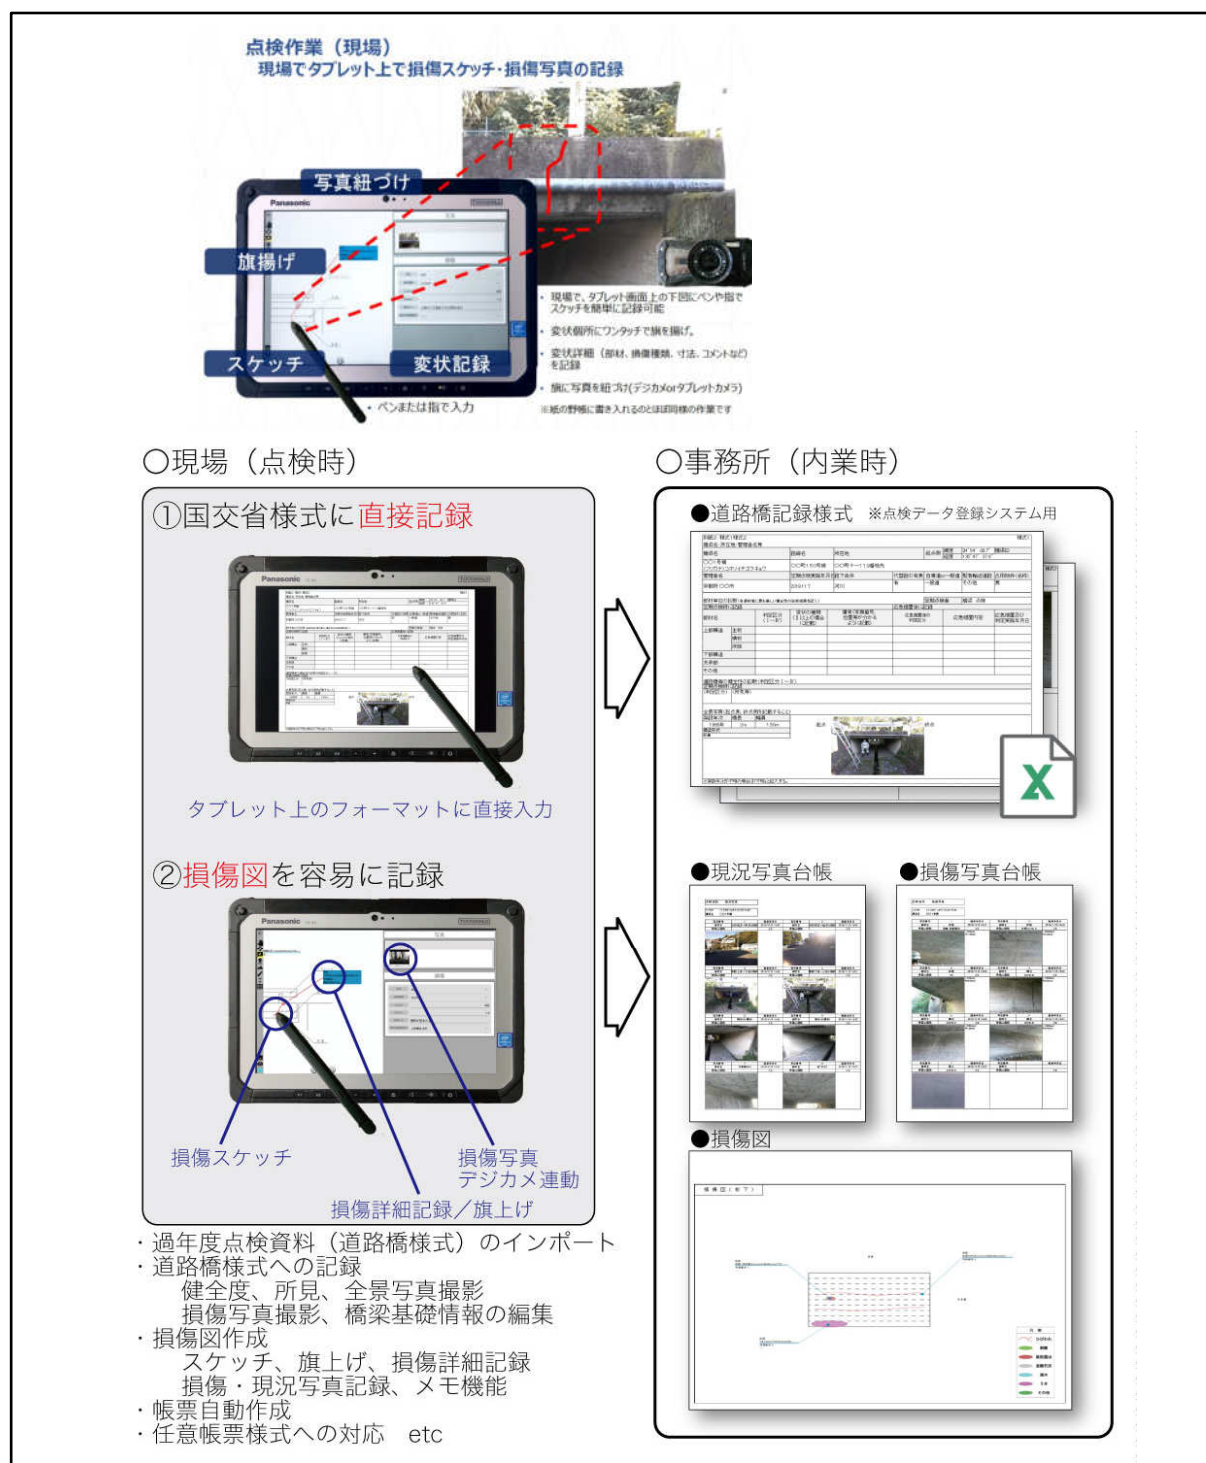


図 3.3 点検調書作成システムを用いた効率化の例

3.9.2 新技術等による費用縮減

本市が管理する1,316橋全ての橋りょうのうち適用可能なものについて、点検調書作成システムを活用することにより、令和6年度から令和10年度までの5年間で橋梁点検に要する費用を約1,500万円縮減します。

3.9.3 集約化・撤去による費用縮減

今後の人口推移や予算状況を踏まえて、集約化・撤去も視野に入れて取り組んでいきます。具体的には今後5年以内に集約化が考えられる2橋について、新規の道路（橋梁）に集約することで既往の路線を廃止することなどにより、撤去（利用停止）を行います。これにより、補修費用および定期点検に要する費用（19百万円）の縮減を目指します。

4. 計画の見直し改善

今回の長寿命化計画の検証・改善を図るため、10年毎に修繕の実施状況、架替の実施状況を検証しながら、適切に長寿命化計画を改定し、さらなるLCCの縮減を実施します。

表 4.1 段階的PDCAサイクル

PDCA サイクルの段階		実施項目（見直す内容）
Plan	劣化予測	最新点検データを基に劣化予測の分析
	将来需要予測	対策工法単価の見直し（最新単価の適用）
	対策優先度	評価項目の見直し（実態に見合った指標の適用）
Do	点検・診断	近接目視点検（ドローン等含む）および診断の実施
	措置	点検結果に基づき補修を実施
	記録	点検・診断・措置の情報をデータベースに蓄積
Check	検証	長寿命化修繕計画の進捗状況の確認・検証
		橋梁点検要領の検証
Action	改善	長寿命化修繕計画の進捗状況の改善
		橋梁点検要領の改善

5. 計画策定担当部署および意見聴取した学識経験者

1) 計画策定担当部署

山口市 都市整備部 道路建設課 TEL：083-934-2686

2) 意見聴取した学識経験者

山口市大学 ^{みやもとあやほ} 宮本文穂 名誉教授

3) 実施時期

H31 年 3 月 作成

R02 年 3 月 一部改訂

R05 年 3 月 一部改訂

R05 年 6 月 一部改訂

R06 年 1 月 一部改訂

R06 年 11 月 一部改訂

R08 年 1 月 一部改訂

施設名	路線名	架設年度	橋長(m)	種類	所在	幅員(m)	直近の点 検実施年	直近の判 定区分	点検実施計画年度						修繕計画年度						補修内容	概算補修金額 (百万円)
									2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
中津江橋	下村花香線	1949	2	RC橋	秋穂	6.8	2021	Ⅱ			○											
若山橋	若山臨港線	1965	5.3	RC橋	阿知須	7.7	2023	Ⅲ					○						○	○	断面修復	20
第二中津江橋	下村花香線	1949	2.6	RC橋	秋穂	5.8	2021	Ⅱ			○											
新道下橋	野口焼野線	1984	11.6	PC橋	阿知須	8.2	2023	Ⅱ					○									
狼橋	長浜岩屋線	不明	3	RC橋	秋穂二島	3.8	2021	Ⅱ			○											
第一中津江橋	下村花香線	1949	2.5	RC橋	秋穂	7.6	2021	Ⅱ			○											
鬼君橋	長浜岩屋線	不明	4	RC橋	秋穂二島	6	2021	Ⅱ			○											
川口橋	小古郷岡山線	不明	4	RC橋	阿知須	7.5	2023	Ⅱ					○									
小古郷橋	西条小古郷線	不明	5.9	RC橋	阿知須	4.3	2023	Ⅱ					○								断面修復等	1
小古郷大橋	海岸線	1958	8.6	RC橋	阿知須	13.3	2023	Ⅱ					○								断面修復等	2
引野橋	焼野引野線	1972	12.6	PC橋	阿知須	7.2	2023	Ⅱ					○									
梶取橋	焼野引野線	不明	2.4	RC橋	阿知須	3.8	2023	Ⅱ					○									
第二屋戸橋	下村花香線	1949	2.2	RC橋	秋穂	3.8	2021	Ⅰ			○											
櫻ヶ谷上橋	長通須田線	不明	2.9	RC橋	阿知須	7	2023	Ⅱ					○									
出合川橋	赤迫仙在線	不明	7.1	RC橋	阿知須	6	2023	Ⅱ					○									
小河原橋	長通須田線	1970	6.2	RC橋	阿知須	6.5	2023	Ⅱ					○									
赤迫橋	長通須田線	1994	20	PC橋	阿知須	9	2020	Ⅱ		○												
沖田橋	赤迫仙在線	1986	6	RC橋	阿知須	4.5	2023	Ⅲ					○		○						断面修復	1
迫田橋	長通須田線	不明	5.3	RC橋	阿知須	9	2023	Ⅱ					○									
水地橋	長浜岩屋線	不明	3	RC橋	秋穂二島	3.7	2021	Ⅱ			○											
木床橋	木床南北線	1972	13.4	PC橋	阿知須	7.2	2023	Ⅱ					○									
明石川橋	焼野引野線	不明	2.4	RC橋	阿知須	3.9	2023	Ⅰ					○									
上赤迫橋	赤迫仙在線	2005	20	PC橋	阿知須	7.7	2020	Ⅰ		○												
石丸橋	赤迫仙在線	1986	2.4	RC橋	阿知須	7.5	2023	Ⅱ					○									
井関橋	犬ノ森仙在線	1999	20	PC橋	阿知須	7.7	2020	Ⅰ		○												
福岡橋	前田小苗代線	1992	24	PC橋	阿知須	10.5	2020	Ⅱ		○												
玉川橋	由良前仙在線	1971	11.4	PC橋	阿知須	7.3	2023	Ⅱ					○									
野口橋	河内野口線	1997	16.3	PC橋	阿知須	7.7	2020	Ⅰ		○												
阿知須大橋	海岸線	2000	66	PC橋	阿知須	15.9	2020	Ⅱ		○												
中溝橋	浜表迫田線	不明	2.2	RC橋	阿知須	7.1	2023	Ⅱ					○									
木船橋	西条浜村線	不明	3.2	RC橋	阿知須	4.3	2023	Ⅰ					○									
垣ノ内橋	浜表野口線	不明	2.5	RC橋	阿知須	6.8	2023	Ⅱ					○									
慶應橋	北砂郷木船線	1952	25	RC橋	阿知須	6.8	2021	Ⅲ			○								○	○	断面修復等	74
小笹橋	浜表野口線	不明	4.8	RC橋	阿知須	6.9	2023	Ⅱ					○									
西条橋	船木西条線	不明	2.5	RC橋	阿知須	2.9	2023	Ⅰ					○									
浜表橋	浜表野口線	1993	22	PC橋	阿知須	15.8	2020	Ⅱ		○												
浜表小橋	浜表野口線	不明	3.2	RC橋	阿知須	6.8	2023	Ⅱ					○									
上長溝橋	沖の原線	不明	2.2	RC橋	阿知須	7	2023	Ⅱ					○									
上小川橋	二ノ宮南北線	1984	4.1	RC橋	阿知須	6.5	2023	Ⅱ					○									
小川橋	浜村線	1978	6	RC橋	阿知須	5.5	2023	Ⅱ					○									
潮引橋	岩倉浜線	不明	3.9	RC橋	阿知須	14.2	2023	Ⅱ					○									
船渡北橋	御米橋砂郷線	不明	3.6	RC橋	阿知須	5.5	2023	Ⅱ					○									
沢田上橋	沖の原線	不明	2.5	RC橋	阿知須	24.2	2023	Ⅱ					○									
御米橋	岩倉浜線	1977	30	鋼橋	阿知須	11.4	2020	Ⅲ		○							○	○	○	○	塗装塗替、断面修復等	113
長浜橋	長浜岩屋線	不明	8	PC橋	秋穂二島	9.2	2021	Ⅱ			○											
飛石橋	岩倉浜線	1940	8	RC橋	阿知須	13.3	2023	Ⅲ					○						○	○	断面修復等	20

施設名	路線名	架設年度	橋長(m)	種類	所在	幅員(m)	直近の点 検実施年	直近の判 定区分	点検実施計画年度						修繕計画年度						補修内容	概算補修金額 (百万円)
									2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
杖川橋	縦貫線	1956	3	RC橋	阿知須	10.6	2020	Ⅱ		○												
阿知須跨線橋	浜田飛石線	1974	18	PC橋	阿知須	10.2	2021	Ⅱ			○											
新橋	長浜 1 号線	不明	6	RC橋	秋穂二島	5.5	2021	Ⅱ			○											
跨道橋	浜田飛石線	1974	8.7	RC橋	阿知須	9.9	2023	Ⅱ					○								断面修復等	1
干拓連絡1号線1号橋	干拓連絡1号線	不明	3.5	RC橋	阿知須	8.1	2023	Ⅱ					○									
下左尾2号線1号橋	下左尾2号線	不明	3.7	RC橋	秋穂	8.6	2019	Ⅱ	○					○								
湯の河内橋	河内原南線	1999	16	PC橋	阿知須	5.2	2020	Ⅰ		○												
中の坪橋	宮ノ脇犬ノ森線	1973	19	鋼橋	阿知須	7.2	2020	Ⅱ		○												
出会川橋	源田畑線	不明	7.1	RC橋	阿知須	14.5	2023	Ⅱ					○									
河内橋	由良前仙在線	1970	18	PC橋	阿知須	7.6	2020	Ⅱ		○												
須田橋	河内野口線	1980	16.8	RC橋	阿知須	5.8	2023	Ⅱ					○								断面修復等	2
逆水橋	長通須田線	1971	21	鋼橋	阿知須	7.2	2020	Ⅱ		○												
小浜橋	小浜線	1995	2.5	RC橋	秋穂	6.3	2022	Ⅱ				○										
内浜橋	内浜線	1994	7.1	RC橋	秋穂	10.2	2022	Ⅱ				○										
源田畑橋	源田畑線	不明	6	RC橋	阿知須	7	2023	Ⅱ					○									
多屋橋	参宮道路線	1981	24	PC橋	阿知須	9.6	2020	Ⅱ		○												
江畑橋	源田畑線	不明	8	RC橋	阿知須	7.3	2023	Ⅱ					○									
黒湯縦貫線1号橋	黒湯縦貫線	不明	2.2	RC橋	秋穂	5.9	2022	Ⅱ				○										
下多屋橋	午二郎線	1981	22	鋼橋	阿知須	4.7	2020	Ⅱ		○												
汐溜橋	六の切線	1970	9.5	RC橋	秋穂	6	2022	Ⅱ				○										
内浜北橋	内浜線	不明	5.1	RC橋	秋穂	8.6	2022	Ⅱ				○									断面修復等	1
辻跨線橋	岩倉西飛石線	1972	16	鋼橋	阿知須	6.5	2022	Ⅱ				○										
ひょうたん橋	惣在所 2 号線	不明	4	RC橋	秋穂二島	7.6	2021	Ⅱ			○											
新川橋	大河内浜内線	1943	5.8	RC橋	秋穂	5.8	2022	Ⅱ				○										
明神橋	塩田橋岩倉線	不明	5.3	RC橋	阿知須	8.1	2023	Ⅱ					○									
新川上橋	東泉寺線	1978	7	RC橋	秋穂	8.1	2022	Ⅱ				○										
塩田橋	塩田橋岩倉線	1969	26	鋼橋	阿知須	6.2	2020	Ⅱ		○												
三軒屋大橋	惣在所 5 号線	不明	22	PC橋	秋穂二島	8.2	2024	Ⅱ	○					○								
牧跨線橋	岩倉南北線	1964	17	鋼橋	阿知須	3	2022	Ⅱ				○										
三軒屋第二小橋	惣在所 5 号線	不明	5	RC橋	秋穂二島	9	2021	Ⅱ			○											
堰戸橋	南 3 号線	不明	3	RC橋	秋穂二島	3.5	2021	Ⅱ			○											
中条橋	大海峠線	1955	3.8	RC橋	秋穂	3.7	2022	Ⅱ				○										
由良橋	由良前阿知須 3 号線	1961	11	RC橋	佐山	6.3	2019	Ⅱ	○					○								
由良前橋	由良前阿知須 1 号線	1988	9	RC橋	佐山	6.2	2019	Ⅱ	○					○								
天田橋	青江宮の旦線	1971	8.3	PC橋	秋穂	9.8	2022	Ⅱ				○										
櫛ヶ崎橋	由良前須川前線	1997	33	PC橋	佐山	10.5	2019	Ⅱ	○					○								
鳩岡橋	渚鳩岡線	不明	4	RC橋	佐山	3.6	2019	Ⅱ	○					○								
鳩岡跨線橋	小路遠波線	不明	16	RC橋	佐山	2.3	2022	Ⅲ				○					○	○	○	○	断面修復等	500
藤尾橋	新地鳩岡線	2000	7	RC橋	佐山	5.8	2019	Ⅰ	○					○								
浜中橋	大河内浜内線	1957	2.8	RC橋	秋穂	7.3	2022	Ⅱ				○										
六分橋	祢宜幸田線	不明	12	PC橋	秋穂二島	7.2	2021	Ⅱ			○											
由良後橋	原条東由良後線	不明	13	PC橋	佐山	5.7	2019	Ⅱ	○					○								
天神橋	大河内浜内線	1943	4.3	RC橋	秋穂	6.8	2022	Ⅱ				○										
役神橋	祢宜 2 号線	不明	2	RC橋	秋穂二島	5	2021	Ⅱ			○											
前開作橋	小路須川前 2 号線	不明	9	RC橋	佐山	17.4	2019	Ⅱ	○					○								
遠波 2 号橋	鳩岡北ノ江東 2 号線	不明	3.6	RC橋	佐山	6.4	2024	Ⅱ	○					○								

施設名	路線名	架設年度	橋長(m)	種類	所在	幅員(m)	直近の点 検実施年	直近の評 定区分	点検実施計画年度						修繕計画年度						補修内容	概算補修金額 (百万円)
									2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
大河内橋	大河内浜内線	1943	4	RC橋	秋穂	6.5	2022	Ⅱ				○										
遠波 1号橋	鳩岡北ノ江東 1号線	不明	4	RC橋	佐山	10.7	2024	Ⅱ	○					○								
今井須川前線 1号橋	今井須川前線	不明	7	RC橋	佐山	7	2023	Ⅰ					○									
宮ノ旦橋	幸田宮ノ旦線	不明	2	RC橋	秋穂二島	3.1	2021	Ⅰ			○											
唐樋 2号橋	鳩岡北ノ江東 2号線	2001	4.6	RC橋	嘉川	25.2	2019	Ⅱ	○					○								
矢石下橋	鳩岡北ノ江東 2号線	2001	4.6	RC橋	嘉川	11.2	2019	Ⅱ	○					○								
唐樋 1号橋	鳩岡北ノ江東 1号線	不明	5.1	PC橋	嘉川	25.1	2024	Ⅱ	○					○								
矢石中橋	鳩岡北ノ江東 1号線	不明	21	RC橋	佐山	12.9	2024	Ⅰ	○					○								
矢石新橋	唐樋原条西線	2001	3	PC橋	深溝	20.8	2020	Ⅱ		○												
北ノ江開作 6号橋	鳩岡北ノ江東 2号線	不明	2.3	PC橋	嘉川	12.8	2024	Ⅱ	○					○								
北ノ江開作 1号橋	鳩岡北ノ江東 1号線	不明	2	RC橋	嘉川	13	2024	Ⅱ	○					○								
矢石橋	下中野寄江線	1997	10	PC橋	深溝	6.2	2020	Ⅰ		○												
北ノ江開作 7号橋	鳩岡北ノ江東 2号線	不明	2.3	PC橋	嘉川	7.3	2024	Ⅱ	○					○								
北ノ江開作 2号橋	鳩岡北ノ江東 1号線	不明	2	RC橋	嘉川	7.3	2024	Ⅱ	○					○								
常盤橋	二島 2号線	不明	3	RC橋	秋穂二島	5.5	2021	Ⅱ			○											
北ノ江開作 8号橋	鳩岡北ノ江東 2号線	不明	3.5	RC橋	嘉川	11.8	2024	Ⅱ	○					○								
北ノ江開作 3号橋	鳩岡北ノ江東 1号線	不明	3.6	RC橋	嘉川	11.3	2024	Ⅱ	○					○								
北ノ江開作 9号橋	鳩岡北ノ江東 2号線	不明	2.3	PC橋	嘉川	7.4	2024	Ⅱ	○					○								
北ノ江開作 4号橋	鳩岡北ノ江東 1号線	不明	2	PC橋	嘉川	7.6	2024	Ⅱ	○					○								
北ノ江開作 1 0号橋	鳩岡北ノ江東 2号線	不明	2.6	PC橋	嘉川	16.6	2024	Ⅱ	○					○								
北ノ江開作 5号橋	鳩岡北ノ江東 1号線	不明	2.4	PC橋	嘉川	15.3	2024	Ⅱ	○					○								
佐山西橋	原条東由良後線	不明	3.1	RC橋	佐山	9.1	2024	Ⅱ	○					○								
東南橋	新開作東島上線	不明	4	RC橋	名田島	4.6	2020	Ⅲ			○				○					断面修復		1
西山橋	仁光寺上田線	1994	16	PC橋	秋穂二島	7.7	2019	Ⅱ	○					○								
溝畑橋	今井須川前線	1992	13.8	PC橋	佐山	8.2	2024	Ⅱ	○					○								
中川橋	新開作東島上線	1965	29.8	RC橋	名田島	3.4	2024	Ⅱ	○					○								
仁光寺橋	10 その他	1967	10	その他	秋穂二島	11.1	2021	Ⅱ			○											
南今津橋	北ノ江西東今津線	不明	3.2	RC橋	嘉川	10.6	2020	Ⅰ		○												
上西山橋	大里仁光寺線	1994	6	RC橋	秋穂二島	6.2	2021	Ⅱ			○											
下今津橋	下中野寄江線	1990	33	PC橋	嘉川	5.2	2024	Ⅱ	○					○								
今江橋	東今津北ノ江東線	1999	28	PC橋	嘉川	6.2	2024	Ⅰ	○					○								
昭和西橋	新開作東島上線	不明	5	RC橋	名田島	5.1	2023	Ⅱ				○										
玄珍小橋	岡屋深溝東線	不明	3.5	PC橋	深溝	6	2020	Ⅰ		○												
玄珍橋	岡屋深溝東線	2000	24	PC橋	嘉川	6.2	2024	Ⅰ	○					○								
原条西橋	原条西線	1974	17	PC橋	嘉川	4.7	2024	Ⅰ	○					○								
原条跨線橋	干見折原条東 2号線	不明	25	PC橋	嘉川	7.1	2021	Ⅱ			○											
第 2 原条側道橋	原条東原条西線	1990	15	PC橋	嘉川	20.7	2024	Ⅰ	○					○								
第 1 原条側道橋	干見折原条東 2号線	1990	19	PC橋	嘉川	9.2	2024	Ⅰ	○					○								
上常盤橋（下り）	干見折原条東線	1991	24	PC橋	嘉川	6.2	2024	Ⅰ	○					○								
今津橋	下中野寄江線	1992	19	PC橋	嘉川	6.2	2024	Ⅱ	○					○								
上常盤橋（上り）	干見折原条東 2号線	1991	24	PC橋	嘉川	6.3	2024	Ⅰ	○					○								
原条橋	原条東由良後線	不明	14.9	PC橋	嘉川	4.7	2024	Ⅰ	○					○								
新栄橋	新開作東上田線	不明	47	PC橋	名田島	7.2	2019	Ⅱ	○					○								
上今津橋	上嘉川下高根線	不明	16	PC橋	嘉川	6.2	2024	Ⅱ	○					○								
平成橋	上田新開作東線	不明	45	PC橋	秋穂二島	2.5	2019	Ⅱ	○					○								
東西橋	新開作東新開作沖線	不明	13	RC橋	名田島	4.5	2020	Ⅱ		○												

施設名	路線名	架設年度	橋長(m)	種類	所在	幅員(m)	直近の点 検実施年	直近の判 定区分	点検実施計画年度						修繕計画年度						補修内容	概算補修金額 (百万円)	
									2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
江崎大橋	上嘉川下高根線	1992	13.1	PC橋	江崎	7.2	2020	Ⅱ		○													
上渡り1号線1号橋	上渡り1号線	不明	3.6	RC橋	嘉川	6.4	2023	Ⅰ					○										
小華橋	高見線	不明	6.2	RC橋	嘉川	5.8	2023	Ⅰ					○										
綾乃橋	高見相原線	不明	6.2	RC橋	嘉川	5.8	2023	Ⅰ					○										
下幸之江橋（下り）	千見折原条東線	1991	16	PC橋	嘉川	6.2	2024	Ⅰ	○					○									
下幸之江橋（上り）	千見折原条東2号線	1991	17	PC橋	嘉川	6.2	2024	Ⅰ	○					○									
幸之江橋	上高根上中野線	1915	10	RC橋	嘉川	4.2	2020	Ⅲ		○							○	○		断面修復等		30	
前原橋	上中野相原線	不明	2.4	RC橋	江崎	8.7	2020	Ⅰ		○													
石唐樋橋	東開作昭和西線	1987	12	PC橋	名田島	9.7	2020	Ⅰ		○													
参神橋	向山下称宜線	不明	45	RC橋	名田島	3.9	2019	Ⅱ	○					○									
新土手橋	上中野相原線	不明	3.5	RC橋	江崎	7	2020	Ⅱ		○													
愛奈橋	上中野相原線	不明	3.6	RC橋	江崎	8	2020	Ⅰ		○													
原跨線橋（下り）	千見折原条東線	不明	23	PC橋	嘉川	5.7	2020	Ⅰ		○													
小田尻橋	島下新開作西線	不明	5	RC橋	名田島	6.1	2020	Ⅰ		○													
原跨線橋（上り）	千見折原条東2号線	不明	23	PC橋	嘉川	5.6	2020	Ⅰ		○													
竿田橋	上高根2号線	2001	8	PC橋	江崎	10.3	2020	Ⅰ		○													
千見折小橋	千見折高見線	不明	2.4	RC橋	嘉川	7.1	2020	Ⅱ		○													
新開作西橋	新開作西新開作沖線	不明	2.8	RC橋	名田島	4.5	2023	Ⅱ					○										
薬師橋	向山下1号線	不明	46	RC橋	名田島	3.1	2019	Ⅱ	○					○									
十楽橋	上中野大原線	不明	2.5	RC橋	嘉川	5.2	2020	Ⅰ		○													
田尻橋	上中野相原線	不明	4.2	RC橋	嘉川	4.2	2020	Ⅱ		○													
岡橋	上嘉川下高根線	不明	3.7	RC橋	江崎	6.2	2020	Ⅱ		○													
岡2号橋	岡線	不明	4.4	RC橋	嘉川	5.6	2023	Ⅰ					○										
岡2号線1号橋	岡2号線	不明	2.1	PC橋	嘉川	21.7	2024	Ⅱ	○					○									
岡ノ下橋	上中野大原線	不明	3	RC橋	江崎	5.6	2020	Ⅰ		○													
前田橋	西開作下向山中線	不明	48	RC橋	名田島	3.1	2015	Ⅱ						○									
小田橋	島下新開作西線	不明	3.4	RC橋	名田島	6	2023	Ⅰ					○										
四丁目橋	西開作下向山中線	不明	6.8	RC橋	名田島	4.6	2023	Ⅰ					○										
蔵ノ前橋	西開作下向山中線	不明	6.8	RC橋	名田島	4.6	2023	Ⅱ					○										
道の上橋	道ノ上2号線	不明	3.5	RC橋	鑄銭司	5	2021	Ⅱ					○										
向山中3号線1号橋	向山中3号線	2019	2.2	RC橋	名田島	7.9	2024	Ⅰ	○					○									
道の上2号橋	道ノ上3号線	不明	3.9	RC橋	鑄銭司	3.9	2020	Ⅱ		○													
千見折本橋	千見折小郡2号線	2001	66.7	PC橋	嘉川	15	2024	Ⅱ	○					○									
二本松橋	向山中線	不明	45	RC橋	名田島	3.1	2019	Ⅱ	○					○									
新川橋	千見折小郡2号線	2001	31	PC橋	嘉川	15.5	2024	Ⅱ	○					○									
上嘉川橋	上嘉川下高根線	不明	2.8	RC橋	嘉川	9.6	2020	Ⅰ		○													
しのぶ橋	千見折小郡3号線	不明	4.1	RC橋	嘉川	12	2023	Ⅱ					○										
千見折橋	千見折線	1991	26	PC橋	嘉川	5.2	2024	Ⅰ	○					○									
新川橋	向山上西開作下線	不明	7	RC橋	名田島	4.2	2020	Ⅱ		○													
裁河内橋	大村道ノ上線	不明	4.4	RC橋	鑄銭司	6.1	2021	Ⅰ				○											
新千見折橋	千見折高見線	1995	20	PC橋	嘉川	5.2	2024	Ⅱ	○					○									
山郷橋	南向山下線	不明	9.2	RC橋	鑄銭司	2.8	2020	Ⅱ		○													
仮屋原橋	中市櫓古屋線	不明	7	RC橋	嘉川	3.4	2020	Ⅱ		○													
堂の前橋	宮ノ原福岡線	不明	6	RC橋	嘉川	5.1	2020	Ⅱ		○													
尺田橋	今宿西大村線	不明	6.2	RC橋	鑄銭司	4.3	2020	Ⅱ		○													
堂河内橋	今宿東四辻線	1957	8	混合橋	鑄銭司	14.9	2020	Ⅱ		○													

施設名	路線名	架設年度	橋長(m)	種類	所在	幅員(m)	直近の点 検実施年	直近の判 定区分	点検実施計画年度							修繕計画年度						補修内容	概算補修金額 (百万円)
									2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
干見折川橋（下り）	干見折原条東線	1992	19	PC橋	嘉川	6.2	2024	Ⅱ	○					○									
干見折川橋（上り）	干見折原条東2号線	1992	19	PC橋	嘉川	6.2	2024	Ⅱ	○					○									
大分橋	中市西本郷線	不明	6	RC橋	嘉川	4.3	2020	Ⅱ		○													
浩恵橋	向山上西開作下線	2003	7	RC橋	名田島	4.5	2020	Ⅱ		○													
沢田橋	今宿東四辻線	1957	5.5	RC橋	鑄銭司	10.7	2020	Ⅱ		○													
檜古屋橋	免地東本郷線	不明	8	RC橋	嘉川	4.4	2020	Ⅱ		○													
壁田橋	免地東本郷線	不明	8	PC橋	嘉川	14	2020	Ⅱ		○													
大蔵橋	今宿東黒山線	1987	18	PC橋	鑄銭司	5.2	2024	Ⅱ	○					○									
小田2号橋	向山上西開作下線	不明	5.8	RC橋	名田島	4.9	2023	Ⅰ					○										
小野尻橋	中田畑小野線	不明	2.9	RC橋	嘉川	2.9	2020	Ⅰ			○												
大内田1号橋	免地東本郷線	不明	2.4	PC橋	嘉川	7.9	2020	Ⅰ			○												
大内田2号橋	免地東本郷線	不明	2.6	PC橋	嘉川	14.5	2020	Ⅰ			○												
今宿橋	今宿東今宿西2号線	1987	17	PC橋	鑄銭司	6.1	2024	Ⅱ	○					○									
踏打橋	今宿東天神原線	不明	3.7	RC橋	鑄銭司	3	2020	Ⅰ			○												
潟上橋	潟上線	不明	10.6	鋼橋	陶	4.2	2022	Ⅱ				○											
新潟上橋	市潟上線	不明	10	RC橋	陶	6.7	2021	Ⅱ	不明		○					○					断面修復		1
竜王橋	今宿西和西線	不明	8.2	RC橋	鑄銭司	12.8	2020	Ⅱ		○													
一ツ橋	今宿東南線	2015	18.3	PC橋	鑄銭司	7.2	2023	Ⅰ					○										
唐樋橋	大村向山上線	1970	59	鋼橋	鑄銭司	6.6	2024	Ⅱ	○					○									
交通センター1号橋	総合交通センター2号線	不明	6	RC橋	小郡	5.5	2021	Ⅰ			○												
南橋	今宿東南線	1951	4	RC橋	鑄銭司	7.3	2020	Ⅱ		○											断面修復等		2
交通センター2号橋	総合交通センター2号線	不明	2.3	RC橋	小郡	5.5	2021	Ⅰ			○												
三丁目橋	東開作西開作上線	不明	7	RC橋	名田島	6.5	2020	Ⅱ		○													
高橋橋	四辻立石線	1934	21	RC橋	鑄銭司	8	2024	Ⅱ	○					○									
竜山橋	岡大道線	不明	3.3	RC橋	鑄銭司	4.9	2020	Ⅱ		○													
南切戸橋	岡大道線	不明	5.5	RC橋	鑄銭司	4.8	2020	Ⅱ		○													
四辻橋	今宿東四辻線	1959	25.6	RC橋	鑄銭司	8.8	2023	Ⅲ					○				○	○			断面修復等		75
向原2号橋	鷹ノ子線	不明	3.6	RC橋	鑄銭司	4.9	2020	Ⅱ		○													
河添橋	檜古屋線	不明	6	RC橋	嘉川	4.3	2020	Ⅰ		○													
天神原橋	天神原2号線	不明	4.9	RC橋	鑄銭司	3.4	2020	Ⅱ		○													
小郡道路5号橋	小郡道路4号線	不明	7	RC橋	小郡	6.3	2021	Ⅰ			○												
縄手橋	岡大道線	不明	6.2	RC橋	鑄銭司	5.2	2020	Ⅰ		○													
正鳴橋	檜古屋長谷線	2003	15.5	PC橋	嘉川	6.2	2023	Ⅰ					○										
新川橋（下り）	小郡道路4号線	不明	13	PC橋	小郡	6.5	2021	Ⅰ			○												
小郡道路6号橋	小郡道路5号線	不明	7	RC橋	小郡	5.9	2021	Ⅰ			○												
下郷第4涵渠1	小郡道路4号線	不明	14	RC橋	小郡	6.4	2023	Ⅱ					○										
中溝北橋	檜古屋2号線	2003	13	PC橋	嘉川	6.2	2020	Ⅰ		○													
新川橋（上り）	小郡道路5号線	不明	13	PC橋	小郡	6	2021	Ⅰ			○												
後中西橋	東開作西開作上線	不明	6	RC橋	名田島	4.5	2020	Ⅱ		○													
石佛橋	天神原和西線	不明	4.3	RC橋	鑄銭司	2.5	2020	Ⅲ		○						○	○				断面修復等		3
沖橋	沖島下線	不明	4	RC橋	名田島	4.4	2021	Ⅱ			○												
下郷第4涵渠2	小郡道路5号線	不明	14	RC橋	小郡	6.1	2023	Ⅱ					○										
綾木橋	四辻立石線	不明	10.4	PC橋	鑄銭司	6.2	2020	Ⅱ		○													
新開橋	柏崎免地線	不明	2	RC橋	小郡	3.6	2021	Ⅰ			○												
下郷第2涵渠2	小郡道路3号線	不明	6	RC橋	小郡	6	2021	Ⅰ			○												
下郷第1涵渠2	小郡道路3号線	不明	3	RC橋	小郡	7.9	2021	Ⅱ			○												

施設名	路線名	架設年度	橋長(m)	種類	所在	幅員(m)	直近の点 検実施年	直近の判 定区分	点検実施計画年度							修繕計画年度							補修内容	概算補修金額 (百万円)
									2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
小郡道路 3 号橋	小郡道路 2 号線	不明	3	RC橋	小郡	5.9	2021	I			○													
小郡道路 4 号橋	小郡道路 3 号線	不明	5	RC橋	小郡	7.7	2021	I			○													
下郷橋（側道）	小郡道路 3 号線	不明	14	PC橋	小郡	9	2023	II						○										
樺野川橋	島下小郡線	不明	98	PC橋	名田島	9	2019	II	○						○									
米光橋	郷下向山上線	不明	3	RC橋	陶	5.6	2021	II			○													
新川 1 号橋	新開三軒屋線	不明	20	PC橋	小郡	7.2	2021	I			○													
岡村橋	新開三軒屋線	不明	2.1	RC橋	小郡	5.6	2020	II			○													
新川橋	新開三軒屋線	不明	2.7	RC橋	小郡	5.5	2020	I			○													
小郡道路 2 号橋	小郡道路 1 号線	不明	3	RC橋	小郡	10.1	2021	II				○												
小郡道路 1 号橋	小郡道路 1 号線	不明	5	RC橋	小郡	8.2	2021	II			○													
鷹の子 2 号橋	鷹ノ子 2 号線	不明	6.3	RC橋	鑄銭司	4.8	2020	II			○													
河内橋	中市西本郷線	不明	5.7	RC橋	嘉川	4.2	2020	II			○													
柏崎跨線橋	柏崎新開線	不明	14	PC橋	小郡	6	2022	II					○											
勿田橋	四辻立石線	不明	7	PC橋	鑄銭司	14.3	2021	II			○													
高関 1 号橋	沖島下線	不明	2.5	RC橋	名田島	4.1	2022	I				○												
下鷹の子橋	鷹ノ子小森線	不明	7.8	RC橋	鑄銭司	4.8	2020	II			○													
古土手橋	島下島上線	不明	4.3	RC橋	名田島	5.4	2023	II						○										
山田口西橋	稽古屋長谷線	2003	8.7	PC橋	嘉川	6.2	2023	I					○											
上市橋	市湯上線	1972	19	PC橋	陶	6.5	2024	II	○						○									
鷹の子橋	鷹ノ子和西線	不明	3.7	RC橋	鑄銭司	3.9	2020	II			○													
駅南 1 3 号橋	駅南 3 6 号線	2003	3	PC橋	小郡	8.3	2021	I				○												
河端橋	鑄銭司岡線	1990	9.6	RC橋	鑄銭司	4.2	2020	II			○													
駅南 7 号橋	駅南 3 4 号線	不明	4	RC橋	小郡	12.4	2021	I				○												
駅南 6 号橋	駅南 3 1 号線	不明	4	RC橋	小郡	10.2	2021	I				○												
塩田橋	丸尾沖島下線	1969	3.6	RC橋	名田島	4.3	2020	I			○													
第一長妻川橋	島下西陶線	不明	5.6	PC橋	名田島	22.9	2022	II					○											
駅南 1 4 号橋	駅南 3 7 号線	2003	3	PC橋	小郡	9	2023	II					○											
第二長妻川橋	西陶島下線	不明	8.5	PC橋	名田島	9.9	2022	II				○												
瀬原橋	沖西陶線	不明	2.8	RC橋	陶	4	2021	II				○												
花園町1号線1号橋	花園町1号線	不明	3.5	RC橋	小郡	7	2023	II					○											
前田橋	立石中河原線	不明	5.4	RC橋	陶	3.1	2022	II				○												
花園町1号線4号橋	花園町1号線	不明	3.5	RC橋	小郡	10.2	2023	II					○											
西開作橋	西開作上西開作下線	不明	3.4	RC橋	名田島	2.3	2023	I					○											
平砂橋	駅南 3 1 号線	不明	15	PC橋	小郡	9.8	2021	I				○												
駅南 5 号橋	駅南 2 9 号線	不明	4	RC橋	小郡	12.4	2021	I				○												
新川側道橋(上り)	花園町1号線	不明	15.3	PC橋	小郡	7	2023	II						○										
新川側道橋(下り)	花園町1号線	不明	15.3	PC橋	小郡	7	2023	II						○										
小森橋	岡小森線	不明	7.4	RC橋	鑄銭司	3.7	2020	II			○													
駅南 4 号橋	駅南 2 8 号線	不明	4	RC橋	小郡	11	2021	I				○												
橋本橋	西陶市線	1981	22	PC橋	陶	5.8	2024	II	○						○									
花園町1号線2号橋	花園町1号線	不明	3	RC橋	小郡	7	2023	II						○										
駅南 3 号橋	駅南 2 7 号線	不明	4	RC橋	小郡	12.4	2021	I				○												
陽己橋	郷下 1 号線	不明	2	RC橋	陶	10.4	2021	II				○												
花園町1号線3号橋	花園町1号線	不明	3	RC橋	小郡	6	2023	II						○										
川西橋	柏崎駅南線	不明	7	RC橋	小郡	4.5	2021	II				○												
駅南 2 号橋	駅南 2 6 号線	不明	4	RC橋	小郡	12.4	2021	I				○												

施設名	路線名	架設年度	橋長(m)	種類	所在	幅員(m)	直近の点 検実施年	直近の判 定区分	点検実施計画年度						修繕計画年度						補修内容	概算補修金額 (百万円)
									2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
陶高架橋（下り）	郷下島下線	不明	195	鋼橋	陶	6.2	2020	Ⅱ		○												
駅南 8 号橋	船倉中間作線	不明	3	RC橋	小郡	17.2	2021	Ⅰ			○											
陶高架橋（上り）	郷下島下 2 号線	不明	167	鋼橋	陶	6.2	2020	Ⅰ		○												
院内橋	免地東本郷線	不明	11.4	RC橋	嘉川	6.2	2020	Ⅰ		○												
下小森橋	岡小森線	不明	2.5	RC橋	銚銭司	5.7	2020	Ⅱ		○												
中河原橋	中河原系根線	不明	6	RC橋	陶	12.2	2021	Ⅱ			○											
駅南 1 号橋	駅南 2 4 号線	不明	4	RC橋	小郡	11.2	2021	Ⅰ			○											
後西村橋	島下島上線	不明	3.6	RC橋	名田島	6.1	2023	Ⅱ					○									
山下橋	中市西本郷線	不明	7	RC橋	嘉川	3.5	2020	Ⅱ		○												
永谷跨線橋	長谷駅南線	不明	105	RC橋	小郡	3.7	2023	Ⅲ				○				○	○	○	○	塗装塗替、当板補修等		1400
和西 2 号橋	鷹ノ子小森線	不明	10.8	RC橋	銚銭司	4.8	2020	Ⅱ		○												
焼畑跨線橋	和西 1 号線	不明	35	PC橋	銚銭司	4.8	2021	Ⅱ			○											
新唐樋橋	中領長谷線	2020	18	PC橋	小郡	17.8	2021	Ⅰ			○											
島上橋	島下丸尾東線	不明	2.5	RC橋	名田島	5.1	2023	Ⅱ					○									
金池橋	金池線	1951	24	PC橋	小郡	4.5	2023	Ⅱ				○										
東畑橋	免地東本郷線	不明	4.1	RC橋	嘉川	6.1	2020	Ⅲ		○						○	○			下部工補修		8
荒郷橋	郷上糸根線	不明	5	RC橋	陶	5.4	2022	Ⅱ				○										
和西橋	今宿西和西線	不明	6.3	RC橋	銚銭司	3.5	2020	Ⅱ		○												
新井手橋	和西 2 号線	不明	4.1	RC橋	銚銭司	3.5	2020	Ⅱ		○												
長谷西橋	長谷西 2 号線	不明	5	RC橋	小郡	15.2	2021	Ⅰ			○											
古川橋	長谷明治西線	不明	14	RC橋	小郡	5.7	2023	Ⅱ					○									
新井手橋	岡小森線	不明	4.5	RC橋	銚銭司	5.9	2020	Ⅱ		○												
宮の前橋	郷上糸根線	不明	12.7	PC橋	陶	6.2	2022	Ⅱ				○										
西畑橋	中市西本郷線	不明	4	RC橋	嘉川	4.3	2020	Ⅰ		○												
東扇田橋	小森和西線	不明	9.3	鋼橋	銚銭司	4	2023	Ⅳ							○	○	○	○	○			130
友輪橋	郷上糸根線	不明	3	RC橋	陶	5	2021	Ⅱ			○											
上西畑橋	中市西本郷線	不明	8	RC橋	嘉川	4.8	2020	Ⅰ		○												
源吾 2 号橋	東本郷西本郷線	不明	4	RC橋	嘉川	6.9	2023	Ⅱ					○									
唐樋橋	津市柏崎線	不明	8	RC橋	小郡	5.5	2021	Ⅰ			○											
源吾橋	東本郷西本郷線	不明	5	RC橋	嘉川	5.8	2020	Ⅱ		○												
竹ノ下橋	矢足新山口駅線	2021	7.4	PC橋	小郡	23.5	2024	Ⅰ	○					○								
郷松橋	小森和西線	不明	9	その他	銚銭司	4	2021	Ⅲ			○											
郷松 2 号橋	小森 2 号線	不明	7.7	RC橋	銚銭司	4.8	2020	Ⅱ		○												
上小森橋	鷹ノ子小森線	不明	7.9	RC橋	銚銭司	4.8	2020	Ⅱ		○												
菰先橋	竹ノ下塩田線	不明	2.2	RC橋	小郡	6	2021	Ⅲ			○					○	○			断面修復		8
福田橋	古林町矢足線	不明	6.7	RC橋	小郡	3.9	2020	Ⅱ		○												
福田 2 号橋	古林町矢足線	不明	4	RC橋	小郡	4.1	2020	Ⅱ		○												
亀谷橋	東津大正町線	不明	2.1	RC橋	小郡	3.2	2020	Ⅱ		○										断面修復等		2
伸江橋	西陶線	不明	2	RC橋	陶	7.3	2021	Ⅱ			○											
野地橋	東津大正町線	不明	2.4	RC橋	小郡	3.8	2020	Ⅰ		○												
下山手橋	長谷福田線	不明	3	RC橋	小郡	6.3	2021	Ⅰ			○											
菰先上橋	竹ノ下塩田線	不明	3	RC橋	小郡	5.7	2021	Ⅰ			○											
大正上橋	東津大正町線	不明	2.3	RC橋	小郡	4.2	2020	Ⅱ		○												
平佐上橋	4 区 2 号線	不明	4	RC橋	小鯖	4	2020	Ⅱ		○												
下出葉橋	中市西本郷線	不明	2.6	RC橋	嘉川	2.9	2020	Ⅱ		○												
塩田下橋	昭和通り山手線	不明	5	RC橋	小郡	4	2021	Ⅰ			○											

[illegible]

施設名	路線名	架設年度	橋長(m)	種類	所在	幅員(m)	直近の点検実施年	直近の判定区分	点検実施計画年度						修繕計画年度						補修内容	概算補修金額 (百万円)
									2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
桂ヶ谷 4 号橋	桂ヶ谷線	不明	4.8	RC橋	小郡	3.6	2020	Ⅱ		○												
新町橋	新町上郷線	不明	7	RC橋	小郡	7.3	2021	Ⅰ			○											
宮ノ下橋	新町宮ノ下線	不明	3.6	RC橋	小郡	2.8	2020	Ⅱ		○										断面修復等		1
宮ノ原橋	小浜宮ノ原線	不明	7	PC橋	小郡	6.3	2021	Ⅰ			○											
桂ヶ谷 2 号橋	桂ヶ谷線	不明	3.8	RC橋	小郡	3.6	2020	Ⅱ		○												
桂ヶ谷橋	桂ヶ谷線	1976	19	PC橋	小郡	6.6	2021	Ⅱ			○											
畑上橋	鍛冶畑線	2003	8.3	RC橋	小郡	6	2020	Ⅰ		○												
寺河内橋	7 区 1 5 区線	不明	5	RC橋	小鯖	5.8	2020	Ⅱ		○												
門前 2 号橋	6 区 8 区線	不明	4.6	RC橋	小鯖	7.2	2020	Ⅰ		○												
上八方原橋	八方原中線	不明	2.8	RC橋	小郡	7.3	2021	Ⅰ			○											
下千坊橋	7 区 1 5 区線	不明	4.5	RC橋	小鯖	3.5	2020	Ⅱ		○												
鶴田橋	新町上郷線	不明	4	PC橋	小郡	6.3	2021	Ⅰ			○											
鶴田 2 号橋	新町上郷線	不明	4	石橋	小郡	5.3	2021	Ⅰ			○											
千坊橋	7 区 1 5 区線	不明	3.6	RC橋	小鯖	4	2020	Ⅱ		○												
丸山橋	仁保津釜ヶ淵線	不明	8	RC橋	小郡	5.6	2021	Ⅰ			○											
光ヶ丘橋	光が丘街路 1 6 号線	2002	33.6	PC橋	小郡	7	2022	Ⅰ				○										
中村橋	8 区 1 区線	不明	18	PC橋	小鯖	8.2	2024	Ⅱ	○					○								
千歳橋	岩屋線	不明	3.5	RC橋	小郡	2.7	2021	Ⅰ			○											
鍛冶畑下橋	仁保津釜ヶ淵線	2003	9	RC橋	小郡	7.5	2021	Ⅰ			○											
岩屋 2 号橋	岩屋線	不明	3.4	RC橋	小郡	4.7	2020	Ⅱ		○												
岩屋 1 号橋	岩屋線	不明	4	RC橋	小郡	8.2	2021	Ⅰ			○											
小出橋	吉野小出線	不明	8	RC橋	平川	4.8	2023	Ⅱ					○									
千坊上橋	7 区 1 5 区線	不明	3.5	RC橋	小鯖	10.5	2020	Ⅰ		○												
権現堂橋	中ノ岡権現堂線	1998	139	PC橋	小郡	11.8	2019	Ⅱ	○					○								
長迫橋	仁保津釜ヶ淵線	1976	13	PC橋	小郡	6.8	2023	Ⅱ					○									
仁保津橋	中ノ岡権現堂線	1991	15	RC橋	小郡	11.4	2024	Ⅱ	○					○								
明神橋	吉野 2 号線	不明	7.8	RC橋	平川	5.3	2023	Ⅱ					○									
仁保津東 2 号橋	新町上郷線	不明	8	RC橋	小郡	8.5	2021	Ⅰ			○											
仁保津東橋	仁保津 4 号線	不明	7	RC橋	小郡	12.2	2021	Ⅰ			○											
桜木大橋	1 3 区 1 区線	不明	21.6	RC橋	小鯖	6.2	2022	Ⅰ					○									
吉野小橋	吉野 2 号線	不明	6.7	RC橋	平川	5.2	2023	Ⅱ					○									
下八反田橋	9 区 8 区線	不明	2.3	RC橋	小鯖	6.5	2020	Ⅰ		○												
下小出橋	小出 2 号線	不明	6.9	RC橋	平川	4.8	2023	Ⅱ					○									
中畑橋	鍛冶中畑線	1976	13.4	PC橋	小郡	2.8	2020	Ⅱ		○												
茶屋川 1 号橋	上仁保津 2 号線	不明	9	PC橋	小郡	8.2	2021	Ⅰ			○											
上吉野橋	吉野小出線	不明	8.6	RC橋	平川	3.5	2023	Ⅱ					○									
茶屋川 2 号橋	大畑原村線	不明	5.4	RC橋	小郡	15	2020	Ⅱ		○												
山根橋	河内小出線	不明	4.5	RC橋	平川	10.1	2023	Ⅰ					○									
龍橋	河内小出線	不明	5.8	RC橋	平川	5.6	2023	Ⅱ					○									
岡田橋	堂紺吉野線	不明	9.9	PC橋	平川	4.7	2022	Ⅱ				○										
鍛冶畑橋	鍛冶畑線	1999	6	RC橋	小郡	7.2	2021	Ⅰ			○											
関屋橋	坂東小郡線	不明	16	RC橋	大歳	8.2	2023	Ⅱ					○									
殿橋	河内小出線	不明	4.6	RC橋	平川	5.6	2023	Ⅰ					○						断面修復等			1
多良郷橋	中ノ岡多良郷線	不明	13	RC橋	小郡	12.3	2024	Ⅱ	○					○								
左尾橋	岡小路河内線	不明	2.6	PC橋	平川	8.5	2023	Ⅰ					○									
正田橋	9 区 1 3 区線	不明	18	PC橋	小鯖	8.2	2024	Ⅱ	○					○								

施設名	路線名	架設年度	橋長(m)	種類	所在	幅員(m)	直近の点検実施年	直近の判定区分	点検実施計画年度						修繕計画年度						補修内容	概算補修金額 (百万円)		
									2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
せきや2号橋	朝田3号線	不明	11.7	PC橋	大歳	4.8	2022	Ⅱ					○											
馬橋	9区13区線	不明	21	PC橋	小鯖	6.4	2024	Ⅱ	○						○									
鍛冶畑上橋	鍛冶畑線	不明	4.5	RC橋	小郡	4.3	2020	Ⅱ		○														
馬橋	菅内3号線	1986	7	PC橋	大内	6.2	2020	Ⅰ		○														
中畑1号橋	鍛冶中畑線	不明	5.6	RC橋	小郡	3.9	2020	Ⅱ		○														
上左屋橋	河内小出2号線	不明	10.5	PC橋	平川	5.8	2022	Ⅰ					○											
柳井橋	岩屋平野線	不明	6.6	RC橋	平川	4.6	2023	Ⅱ						○										
下左屋橋	小出岡小路線	不明	10.5	PC橋	平川	5.8	2022	Ⅰ					○											
月光橋	9区2号線	不明	11.5	RC橋	小鯖	6.6	2020	Ⅱ		○														
紺屋橋	平野吉野線	不明	2.4	混合橋	平川	4.5	2023	Ⅲ						○		○					当板補修			1
中畑2号橋	鍛冶中畑線	不明	5.4	RC橋	小郡	3.6	2020	Ⅱ		○														
願社橋	中村西線	不明	2	RC橋	平川	5	2023	Ⅰ						○										
高富橋	15区線	不明	3	RC橋	小鯖	2.9	2020	Ⅱ		○														
屋敷橋	朝田流通センター線	不明	13.5	PC橋	大歳	5.8	2022	Ⅱ					○											
多良郷1号橋	中ノ岡多良郷線	不明	8	RC橋	小郡	5.7	2024	Ⅱ		○					○									
樋口橋	西京1号線	不明	10.2	RC橋	平川	9.8	2022	Ⅱ					○											
中畑3号橋	鍛冶中畑線	不明	5.4	RC橋	小郡	4	2020	Ⅱ		○														
下吉野橋	平野吉野線	不明	9.9	PC橋	平川	4.4	2022	Ⅱ					○											
丁の首橋	中村小出線	不明	6.7	RC橋	大歳	8	2023	Ⅱ						○										
大塚橋	神郷3号線	不明	4	RC橋	平川	3.5	2023	Ⅱ						○										
第六稔畑橋	15区2号線	不明	7	RC橋	小鯖	6.1	2020	Ⅱ		○														
石井手橋	12区9区線	不明	20	RC橋	小鯖	2.3	2024	Ⅱ	○						○									
郷多良橋	朝田馬庭2号線	1983	15	PC橋	大歳	3.8	2024	Ⅱ	○						○									
稔畑橋	15区2号線	2009	7	RC橋	小鯖	14	2020	Ⅱ		○														
上村橋	葎場・上村線	1999	27	PC橋	徳地	6	2021	Ⅰ				○												
坂本橋	16区1号線	不明	5	RC橋	小鯖	4.5	2020	Ⅱ		○														
上村・田戸線1号橋	上村・田戸線	不明	8.4	RC橋	徳地	4.6	2022	Ⅱ					○											
稲谷橋	岡大塚間線	不明	4.8	RC橋	平川	3.4	2023	Ⅰ						○										
中畑4号橋	鍛冶中畑線	不明	4.3	RC橋	小郡	3.6	2020	Ⅱ		○														
島地・平木線2号橋	島地・平木線	不明	5	RC橋	徳地	3.5	2019	Ⅱ	○						○									
天吹橋	菅内小野線	不明	8.5	RC橋	大内	3.9	2020	Ⅱ		○														
第一新宮橋	上村・田戸線	1973	66	鋼橋	徳地	3.6	2024	Ⅱ	○					○										
吉野橋	吉野1号線	1966	35	RC橋	平川	5	2024	Ⅱ	○						○									
上仁保津橋	上仁保津1号線	1985	48	PC橋	小郡	12	2019	Ⅱ	○						○									
岸の下橋	西小出線	1979	23.2	PC橋	平川	14.2	2024	Ⅱ	○						○									
阿弥陀橋	一貫野16区線	不明	8	RC橋	小鯖	12	2020	Ⅱ		○														
多良郷2号橋	中ノ岡多良郷線	不明	6	RC橋	小郡	8.6	2024	Ⅱ	○						○									
坂本橋	一貫野16区線	不明	4	RC橋	小鯖	6.2	2020	Ⅱ		○														
高田橋	田屋島岩富線	2008	143	PC橋	大歳	12	2024	Ⅱ	○						○									
小野7号線1号橋	小野7号線	不明	3.6	RC橋	大内	6	2024	Ⅱ	○						○									
竹重橋	16区2号線	不明	5	RC橋	小鯖	4	2020	Ⅱ		○														
高良田橋	西1号線	1971	23	鋼橋	平川	4.3	2024	Ⅲ	○						○				○	○	○	塗装塗替、支承防錆等		74
初の木・河合線2号橋	初の木・河合線	不明	3.4	RC橋	徳地	3.8	2022	Ⅱ					○											
四反田橋	神郷岡大塚線	不明	4.2	RC橋	平川	4.6	2023	Ⅰ						○										
新橋	朝田馬庭2号線	1985	15	PC橋	大歳	3.8	2024	Ⅱ	○						○									
下藤木・沼田峠線1号橋	下藤木・沼田峠線	不明	3	RC橋	徳地	4	2021	Ⅱ					○											

施設名	路線名	架設年度	橋長(m)	種類	所在	幅員(m)	直近の点 検実施年	直近の評 定区分	点検実施計画年度						修繕計画年度						補修内容	概算補修金額 (百万円)		
									2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
河内橋	和田河内線	不明	8	RC橋	大蔵	6.6	2023	Ⅱ						○										
泥橋	1 2 区管内 2 号線	不明	3	RC橋	小鯖	8.6	2020	Ⅱ		○														
三作橋	坂東小郡線	不明	8	RC橋	大蔵	9	2021	Ⅱ				○												
小路橋	中村小出線	不明	17	鋼橋	平川	7.6	2024	Ⅱ		○					○									
多良郷 3 号橋	中ノ岡多良郷線	不明	4	RC橋	小郡	2.5	2024	Ⅱ		○					○									
岩富橋	田屋島岩富線	不明	3.4	RC橋	大蔵	9	2023	Ⅰ						○										
下九田橋	岡小路線	1971	17	鋼橋	平川	4.6	2024	Ⅱ		○					○									
長池橋（上九田橋）側道橋	関住宅間線	1983	17	鋼橋	平川	3.1	2024	Ⅱ		○					○									
長池橋（上九田橋）	関住宅間線	1969	17	鋼橋	平川	9	2024	Ⅱ		○					○									
神岡橋	御堀平井線	2007	11.3	PC橋	平川	17	2022	Ⅱ					○											
郷塚橋	岡大塚馬木坂本線	不明	3.6	RC橋	平川	4	2022	Ⅱ					○											
志多里橋	小野高芝線	不明	8.6	RC橋	大内	4.5	2020	Ⅱ			○													
乙中橋	和田河内線	不明	5	RC橋	大蔵	2.7	2021	Ⅱ					○											
乙下橋	和田河内線	不明	5	RC橋	大蔵	3.6	2021	Ⅱ					○											
初の木・河合線1号橋	初の木・河合線	不明	4.7	RC橋	徳地	2.6	2022	Ⅱ					○											
田中橋	中村小出線	不明	2.6	RC橋	大蔵	9.8	2023	Ⅱ						○										
九田橋	御堀平井線	2007	14.3	PC橋	平川	24.8	2022	Ⅰ					○											
鴨原団地 2 号橋	鴨原団地 3 号線	不明	3	RC橋	大蔵	4.6	2023	Ⅱ						○										
郷上橋	神郷 2 号線	不明	2.7	RC橋	平川	4.2	2023	Ⅱ						○										
大塚沖2号線1号B橋	大塚沖2号線	不明	6.5	RC橋	平川	5	2023	Ⅰ						○										
岩富 3 号橋	岩富線	不明	3.4	RC橋	大蔵	6.4	2023	Ⅱ						○										
間橋	大塚沖間線	1969	16	鋼橋	平川	4.6	2024	Ⅲ		○					○		○	○			塗装塗替、支承防錆等			71
鴨原団地 1 号橋	鴨原団地 3 号線	不明	3.5	RC橋	大蔵	6.2	2023	Ⅱ						○										
鯖地橋	9 区 1 1 区線	不明	4	RC橋	小鯖	6.2	2020	Ⅱ			○													
大岩口橋	朝田馬庭線	1933	7	RC橋	大蔵	3	2024	Ⅱ		○					○									
小丸山橋	葎場・西村線	1953	56	RC橋	徳地	4.4	2024	Ⅱ		○					○									
岩富 2 号橋	岩富線	不明	3.8	RC橋	大蔵	4.4	2023	Ⅱ						○										
黒僧橋	台中野線	不明	10.6	RC橋	平川	3.6	2022	Ⅱ					○											
大蔵橋	勝井中矢原線	1935	52	RC橋	大蔵	5.4	2024	Ⅱ		○					○									
大塚橋歩道橋	岡大塚馬木坂本線	不明	10.9	混合橋	平川	2.3	2023	Ⅰ						○										
大塚橋	岡大塚馬木坂本線	不明	10.8	鋼橋	平川	5.9	2023	Ⅲ						○				○	○	○	○			73
森橋	朝田馬庭線	不明	6	RC橋	大蔵	3	2024	Ⅱ		○					○						護岸修繕			1
中大蔵橋	勝井中矢原線	不明	4.5	RC橋	大蔵	4.5	2023	Ⅱ						○										
岡本橋	小野 2 号線	不明	13.8	RC橋	大内	2.8	2023	Ⅲ						○				○	○	○		断面修復等		40
高畑橋	勝井下湯田線	不明	3	RC橋	大蔵	7.7	2021	Ⅱ					○											
小原橋	中村小出線	不明	2.3	RC橋	大蔵	40.5	2023	Ⅰ						○										
岩富 1 号橋	岩富線	不明	2.7	RC橋	大蔵	5.4	2023	Ⅱ						○										
森長西経納線1号橋	森長西経納線	不明	9.8	PC橋	徳地	2.8	2022	Ⅱ					○								断面修復等			2
供有橋	坂東 2 号線	不明	42	PC橋	大蔵	4.7	2024	Ⅱ		○					○									
樋ノ口線2号橋	樋ノ口線	不明	15	PC橋	徳地	5	2021	Ⅰ					○											
木道子橋	小野 1 号線	不明	14	RC橋	大内	2.7	2021	Ⅱ					○											
樋ノ口線1号橋	樋ノ口線	不明	3.2	RC橋	徳地	3.8	2022	Ⅱ					○											
樋ノ口・野尻線2号橋	樋ノ口・野尻線	不明	11	PC橋	徳地	8.2	2022	Ⅱ					○											
上藤木・後谷線1号橋	上藤木・後谷線	不明	3	RC橋	徳地	6.6	2023	Ⅱ							○									
檜木橋	坂東 1 号線	不明	2	RC橋	大蔵	6.4	2023	Ⅱ						○										
神郷橋	神郷 1 号線	不明	8.5	RC橋	平川	11	2023	Ⅱ						○										

施設名	路線名	架設年度	橋長(m)	種類	所在	幅員(m)	直近の点 検実施年	直近の評 定区分	点検実施計画年度							修繕計画年度						補修内容	概算補修金額 (百万円)
									2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
土井橋	土井・麻生線	不明	10	PC橋	徳地	3.3	2022	Ⅱ				○											
穂積 2 号橋	穂積町 1 号線	不明	2.1	RC橋	大歳	7.5	2023	Ⅰ					○										
中矢原橋	矢原町穂積町線	不明	2.4	RC橋	大歳	4.4	2023	Ⅱ					○										
片川橋	問田 5 号線	不明	7.9	RC橋	大内	9.5	2020	Ⅱ		○													
菰台橋	奥畑線	不明	9	PC橋	小郡	4	2020	Ⅱ		○													
塚田橋	中村小出線	不明	5	RC橋	大歳	10.2	2023	Ⅱ					○										
浅ノ久保橋	中園町台線	不明	3.9	RC橋	平川	4.9	2023	Ⅰ					○										
中村小橋	下千坊上千坊 2 号線	不明	4.8	RC橋	大内	4.5	2020	Ⅰ		○													
徳地藤木線1号橋	徳地藤木線	不明	13	PC橋	徳地	3.8	2022	Ⅲ				○					○	○	○		断面修復等	43	
片川橋	問田 2 号線	不明	5.6	RC橋	大内	4.1	2020	Ⅰ		○													
徳行・森永線1号橋	徳行・森永線	不明	4.3	RC橋	徳地	3.7	2022	Ⅰ				○											
下山田橋	姫山ひびき線	不明	4	RC橋	平川	11.3	2023	Ⅱ					○										
穂積 1 号橋	穂積町 1 号線	不明	3.2	RC橋	大歳	3.7	2023	Ⅱ					○										
九門橋	下千坊問田線	不明	4.1	RC橋	大内	4.5	2020	Ⅰ		○													
慶福橋	大久保・大町線	1990	46	PC橋	徳地	6	2022	Ⅱ				○											
上八幡橋	中矢原下東線	不明	2.3	RC橋	大歳	4.8	2023	Ⅲ		○					○					断面修復	0.7		
平ヶ谷橋	一貫野 1 6 区線	不明	4	RC橋	小鯖	3.6	2020	Ⅱ		○													
上山田橋	姫山ひびき線	不明	4.4	RC橋	平川	11	2023	Ⅰ					○										
湯田橋	中矢原下東線	不明	27	鋼橋	湯田	4.7	2024	Ⅱ	○						○								
細田橋	下藤木・沼田峠線	不明	10	PC橋	徳地	5	2021	Ⅱ				○											
長野 4 号線 1 号橋	長野 4 号線	不明	3.4	RC橋	大内	7.2	2020	Ⅱ		○													
永代橋	宮島町問田線	1988	68	鋼橋	大内	11	2024	Ⅱ	○						○								
勘坊橋	下千坊問田線	不明	5.1	RC橋	大内	5.1	2020	Ⅰ		○													
長野1号線1号橋	長野1号線	不明	3.3	RC橋	大内	4.4	2020	Ⅱ		○													
高芝橋	小野高芝線	不明	2.5	RC橋	大内	12.8	2020	Ⅰ		○													
横部橋	高芝 2 号線	不明	3.3	RC橋	大内	4.7	2020	Ⅱ		○													
熊野橋	問田姫山台線	1974	21	PC橋	大内	5.7	2024	Ⅱ	○						○								
徳行・上線1号橋	徳行・上線	不明	3.1	RC橋	徳地	4.8	2022	Ⅱ				○											
下馬渡橋	下東宝町線	不明	5	RC橋	吉敷	2.9	2021	Ⅱ				○											
上溝橋	上平井台線	不明	2.6	RC橋	平川	4.4	2023	Ⅰ					○										
鬼ヶ平橋	一貫野 1 6 区線	不明	5.4	RC橋	小鯖	3.8	2020	Ⅱ		○													
森河内橋	木崎佐畑 1 号線	不明	9.8	RC橋	吉敷	6.4	2022	Ⅰ				○											
殿河内高芝線1号橋	殿河内高芝線	不明	2.3	RC橋	大内	5.8	2022	Ⅱ				○											
菜洗橋	島地・下藤木線	1976	47	鋼橋	徳地	6.2	2024	Ⅱ	○						○								
法の木橋	一貫野 1 6 区線	不明	4	RC橋	小鯖	3	2020	Ⅱ		○													
へそくり橋	木崎佐畑 1 号線	不明	2	RC橋	吉敷	5	2023	Ⅱ					○										
地吉橋	一貫野 1 6 区線	不明	4	RC橋	小鯖	3	2020	Ⅱ		○													
下千坊橋	上千坊下千坊線	不明	3.2	RC橋	大内	3.2	2020	Ⅰ		○													
大橋団地 2 号橋	下東 2 号線	不明	6.1	RC橋	吉敷	3.6	2022	Ⅱ				○											
矢井西線1号橋	矢井西線	不明	9.1	PC橋	徳地	3.9	2022	Ⅱ				○											
舟川橋	一貫野 1 6 区線	不明	5	RC橋	小鯖	3.2	2020	Ⅱ		○													
西大津・田屋ヶ浴線1号橋	西大津・田屋ヶ浴線	不明	6	RC橋	徳地	3.8	2022	Ⅱ				○											
立石橋	上平井台線	不明	2.7	RC橋	平川	4.8	2023	Ⅱ					○										
氷上橋歩道橋	上矢田御堀線	2014	74.2	混合橋	大内	3.8	2023	Ⅰ					○										
氷上橋	上矢田御堀線	1948	73	鋼橋	大内	6.4	2024	Ⅱ	○						○								
仕出ノ木橋	石曽根・蔵場線	不明	6.6	RC橋	徳地	3.3	2022	Ⅱ				○											

施設名	路線名	架設年度	橋長(m)	種類	所在	幅員(m)	直近の点 検実施年	直近の判 定区分	点検実施計画年度						修繕計画年度						補修内容	概算補修金額 (百万円)	
									2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
下屋橋	上矢原上東2号線	1983	19	PC橋	吉敷	15	2024	Ⅱ	○					○									
姫山橋	下千坊問田線	不明	59	PC橋	大内	6.2	2024	Ⅱ	○					○									
下市橋	長野御堀2号線	不明	74	PC橋	大内	5.8	2024	Ⅲ	○					○						○	断面修復等	200	
氷上小橋	上矢田御堀線	不明	9.2	RC橋	大内	6.6	2020	Ⅱ		○													
田屋ヶ浴橋	西大津・田屋ヶ浴線	不明	8	RC橋	徳地	3.5	2022	Ⅱ				○											
広村橋	中園町台線	不明	4.2	RC橋	平川	5.1	2023	Ⅱ					○										
前田橋	上矢原上東2号線	不明	14.6	PC橋	湯田	12.8	2022	Ⅱ				○											
中田屋橋	下市町前町線	不明	4	RC橋	湯田	3.8	2021	Ⅱ			○												
葵二丁目橋	葵二丁目3号線	不明	3.3	RC橋	湯田	5.1	2022	Ⅰ				○											
善原橋	前町富田原町線	不明	3	RC橋	湯田	4	2021	Ⅱ			○												
上平井橋	上平井台線	不明	4.1	RC橋	平川	4.6	2023	Ⅱ					○										
大橋団地4号橋	大橋町1号線	不明	2	RC橋	吉敷	5.3	2022	Ⅱ					○										
葵二丁目1号橋	葵二丁目1号線	不明	3.2	RC橋	湯田	3.9	2022	Ⅱ					○										
向原橋	殿河内高芝線	不明	3.1	RC橋	大内	5.2	2022	Ⅰ				○											
平安橋	島地・石曽根線	1955	55	RC橋	徳地	6	2022	Ⅲ				○					○	○	○	○	断面修復等	145	
中村橋	木崎佐畑1号線	不明	2	RC橋	吉敷	4	2023	Ⅱ					○										
矢井中央橋	矢井中央線	2019	17.9	PC橋	徳地	4	2023	Ⅰ					○										
御堀東橋	氷上5号線	不明	2.9	RC橋	大内	4.9	2020	Ⅱ			○												
豊年橋	中園町台線	不明	117	混合橋	大蔵	6.8	2021	Ⅱ				○											
下東橋	下東1号線	不明	2.2	RC橋	吉敷	3.6	2022	Ⅱ					○										
下千坊2号橋	下千坊氷上線	不明	6.3	RC橋	大内	5.6	2020	Ⅰ			○												
下市小橋	長野御堀2号線	不明	3.1	RC橋	大内	5.5	2020	Ⅱ			○												
東泉寺橋	上矢田御堀線	不明	4	RC橋	大内	6	2020	Ⅱ			○												
秋葉小橋	前町富田原町線	不明	4	RC橋	湯田	3.6	2021	Ⅱ				○											
宮島町問田線1号橋	宮島町問田線	不明	3.1	RC橋	大内	7.6	2020	Ⅱ			○										断面修復等	2	
葵橋	葵二丁目下東線	不明	2.4	RC橋	湯田	5.3	2022	Ⅱ					○										
中西大津線1号橋	中西大津線	不明	2.6	RC橋	徳地	3.5	2023	Ⅱ					○										
吉敷大橋	下東中村線	1953	35	RC橋	吉敷	4.1	2024	Ⅱ	○					○									
安楽橋	一貫野16区線	不明	5	RC橋	仁保	3.3	2020	Ⅱ			○												
下津屋・いかだ線2号橋	下津屋・いかだ線	不明	2.5	RC橋	徳地	3.7	2023	Ⅱ					○										
上京面橋	葵二丁目下東線	不明	19	RC橋	湯田	4.5	2024	Ⅱ	○					○									
田屋橋	宮の馬場殿河内線	不明	2.7	RC橋	大内	5.1	2020	Ⅰ			○												
若宮橋	中村佐畑線	不明	8.6	RC橋	吉敷	7.2	2022	Ⅰ					○										
木船橋	中村佐畑線	不明	2.2	RC橋	吉敷	4.1	2022	Ⅰ					○										
真清橋	中園町台線	不明	6.1	RC橋	湯田	6.8	2022	Ⅱ					○										
下津屋・いかだ線1号橋	下津屋・いかだ線	不明	2.2	RC橋	徳地	9	2023	Ⅱ					○										
榎橋	葵二丁目線	不明	19	PC橋	湯田	15.8	2019	Ⅱ	○					○									
一ッ橋	上東湯田温泉五丁目線	不明	14.4	PC橋	吉敷	8.7	2024	Ⅱ	○					○									
中川橋	宮島町問田線	1974	82	PC橋	大内	9.5	2024	Ⅱ	○					○			○	○	○		断面修復、橋面防水工等	150	
千晴橋	湯田温泉六丁目9号線	不明	9.6	RC橋	湯田	3.8	2022	Ⅱ				○											
上井手ヶ原橋	上平井台線	不明	4	RC橋	平川	4.7	2023	Ⅱ						○									
宮の前橋	石曽根・中村線	1978	58	RC橋	徳地	6.2	2022	Ⅱ					○										
新前田橋	泉町平川線	不明	14	PC橋	湯田	12	2021	Ⅱ				○											
船津・新田線1号橋	船津・新田線	不明	5.7	RC橋	徳地	3.5	2022	Ⅰ					○										
滝河内1号橋	中村佐畑線	不明	6.3	RC橋	吉敷	4.7	2022	Ⅲ				○				○					断面修復	1	
滝河内2号橋	中村佐畑線	不明	7.3	RC橋	吉敷	5.1	2022	Ⅱ					○										

施設名	路線名	架設年度	橋長(m)	種類	所在	幅員(m)	直近の点検実施年	直近の判定区分	点検実施計画年度						修繕計画年度						補修内容	概算補修金額 (百万円)
									2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
大久保・石曽根線1号橋	大久保・石曽根線	不明	3.9	RC橋	徳地	2.9	2022	Ⅱ				○										
滝河内3号橋	中村佐畑線	不明	8	RC橋	吉敷	4.8	2022	Ⅱ				○										
下津屋橋	島地・下津屋線	不明	8.4	RC橋	徳地	4.8	2022	Ⅰ				○										
円光坊橋	氷上2号線	不明	3	RC橋	大内	5.3	2020	Ⅰ		○												
白井田橋	宮の前橋線	不明	50	PC橋	徳地	2.5	2022	Ⅲ				○										
三和町橋	三和町2号線	不明	3	RC橋	湯田	2.5	2021	Ⅱ			○											
滝橋	佐畑1号線	不明	5	RC橋	吉敷	4	2023	Ⅱ					○									
堀・片地線2号橋	堀・片地線	不明	3.1	RC橋	徳地	6.7	2023	Ⅱ					○									
南大橋	湯田温泉二丁目泉町線	不明	9	RC橋	湯田	7.5	2021	Ⅱ				○										
小高橋	赤田佐畑線	不明	6	RC橋	吉敷	5.7	2023	Ⅰ					○									
錦橋	東山二丁目岩富線	不明	18	鋼橋	白石	3.5	2024	Ⅱ	○						○							
上錦橋	東山二丁目岩富線	不明	4	RC橋	大殿	4	2021	Ⅱ				○										
稲葉団地1号橋	稲葉町7号線	不明	2.3	RC橋	吉敷	5	2022	Ⅱ					○									
稲葉団地2号橋	稲葉町8号線	不明	2.3	RC橋	吉敷	5.9	2022	Ⅱ					○									
三旭橋	東山通り下矢原2号線	1986	18	PC橋	白石	16	2024	Ⅱ		○					○							
東大橋	湯田温泉二丁目赤妻町線	不明	9	RC橋	湯田	5.1	2021	Ⅱ				○										
黒主橋	稲葉町線	不明	2.4	RC橋	吉敷	17.3	2022	Ⅱ					○									
上新川橋	中恋路上矢田線	不明	9	RC橋	大内	5.7	2020	Ⅱ			○											
遠内・和田線1号橋	遠内・和田線	不明	15	PC橋	徳地	4	2021	Ⅱ				○										
上河原橋	上東赤田線	不明	4.3	RC橋	吉敷	4.4	2022	Ⅱ					○									
深野4号線1号橋	深野4号線	不明	3	RC橋	仁保	9.2		未点検														
昭和橋	旭通り二丁目旭通り一丁目線	不明	18	鋼橋	白石	4.6	2024	Ⅲ	○					○	○	○	○		塗装塗替、断面修復等		49	
鰐石橋	宮島町白石二丁目線	不明	46	RC橋	白石	7.2	2024	Ⅱ	○						○							
菰台4号橋	奥畑線	不明	5	RC橋	小郡	4.2	2021	Ⅰ				○										
鰐石小橋	宮島町白石二丁目線	不明	3	RC橋	白石	5.6	2021	Ⅱ				○										
山水橋	中央二丁目湯田温泉四丁目線	1979	7.6	RC橋	白石	30.7	2023	Ⅱ					○						断面修復等		2	
西寺橋	佐畑2号線	不明	6	RC橋	吉敷	9	2022	Ⅰ					○									
宮部橋	元町1号線	不明	5	RC橋	湯田	5.8	2021	Ⅱ				○										
緑町橋	緑町2号線	不明	8.5	RC橋	湯田	7.3	2022	Ⅱ					○									
黄金橋	本町二丁目駅通り二丁目線	不明	10	PC橋	白石	7.1	2021	Ⅱ				○										
荒田橋	元町湯田温泉六丁目線	不明	8	RC橋	湯田	6.7	2021	Ⅱ				○										
上小僧子橋	元町湯田温泉六丁目線	不明	7	RC橋	湯田	9	2021	Ⅱ				○										
下羽畠橋	糸米一丁目線	不明	7	RC橋	白石	2.5	2021	Ⅱ				○										
遠内新橋	浅木・遠内線	不明	15	鋼橋	徳地	4.8	2024	Ⅱ	○						○							
楠木橋	楠木町1号線	不明	3	RC橋	湯田	3.2	2021	Ⅱ				○										
中ノ尾橋	奥畑線	不明	4	RC橋	小郡	3.8	2021	Ⅰ				○										
伊幌橋	赤妻町上東線	不明	3	RC橋	吉敷	4.5	2023	Ⅱ						○								
羽畠橋	糸米羽坂2号線	不明	7	RC橋	白石	6.5	2021	Ⅱ				○										
下河原橋	赤田3号線	不明	2.5	RC橋	吉敷	9.8	2022	Ⅰ					○									
新橋	宮島町白石二丁目線	不明	10	PC橋	白石	4.1	2021	Ⅱ				○										
楠木町橋	神田町上東線	不明	3	RC橋	吉敷	6.3	2021	Ⅱ				○										
螢見橋	上東赤田線	1991	23	PC橋	吉敷	6.2	2024	Ⅱ	○						○							
新田橋	二ノ宮・船津線	1969	118	鋼橋	徳地	5.2	2022	Ⅱ					○									
下向山橋	糸米一丁目線	不明	5	RC橋	白石	3	2021	Ⅱ				○										
根崎小橋	糸米一丁目旭通り一丁目線	不明	6	RC橋	白石	11.2	2021	Ⅱ				○										
神田町橋	神田町線	不明	2	RC橋	湯田	4.2	2021	Ⅰ				○										

施設名	路線名	架設年度	橋長(m)	種類	所在	幅員(m)	直近の点 検実施年	直近の判 定区分	点検実施計画年度							修繕計画年度							補修内容	概算補修金額 (百万円)
									2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
船津橋	二ノ宮・山根線	1987	21	PC橋	徳地	10.7	2024	Ⅱ	○					○										
阿部橋	道祖町旭通り一丁目線	不明	11	鋼橋	大殿	4.6	2021	Ⅱ			○													
新中田橋	浅木・遠内線	2003	18	PC橋	徳地	4.8	2024	Ⅰ	○					○										
二宮大橋	二ノ宮・山根線	1987	161	PC橋	徳地	10.8	2024	Ⅱ	○					○										
遠内上線1号橋	遠内上線	不明	5.3	RC橋	徳地	3.6	2023	Ⅱ					○											
河内上橋	二ノ宮・中開作線	不明	8	RC橋	徳地	3.8	2022	Ⅱ				○												
向山橋	糸米一丁目線	不明	6	RC橋	白石	3	2021	Ⅱ			○													
船津・古森線1号橋	船津・古森線	不明	3	RC橋	徳地	4.2	2023	Ⅱ					○											
朝倉西橋	錦町線	不明	8	RC橋	湯田	12.8	2021	Ⅱ			○													
糸米橋	糸米羽坂2号線	不明	4	RC橋	白石	5.1	2021	Ⅱ			○													
南白石橋	宮島町白石二丁目線	不明	7	RC橋	白石	7.5	2021	Ⅱ			○													
えびす橋	黄金町野田1号線	不明	16	RC橋	白石	11.1	2019	Ⅲ		○					○							断面修繕等	55	
深野橋	中恋路上矢田線	不明	56	PC橋	仁保	7.2	2024	Ⅱ	○						○									
沖田船津線2号橋	沖田船津線	不明	3.8	RC橋	徳地	3.5	2023	Ⅱ					○											
赤田橋	赤田3号線	不明	3	RC橋	吉敷	2.7	2023	Ⅱ					○											
古熊下橋	東山二丁目古熊二丁目線	1980	46	PC橋	大殿	6	2024	Ⅱ	○					○										
大野・臼谷線1号橋	大野・臼谷線	不明	3.1	RC橋	徳地	4.3	2022	Ⅰ				○												
山畑大野西線1号橋	山畑大野西線	不明	3.7	石橋	徳地	2.8	2023	Ⅱ					○											
新白石橋	白石一丁目線	2005	12	RC橋	白石	4.2	2021	Ⅱ			○													
新道橋	黄金町野田1号線	不明	2	RC橋	白石	14.3	2021	Ⅱ			○											断面修復等	1	
笠着橋	米屋町1号線	2012	12	PC橋	白石	8.2	2023	Ⅰ	○				○											
大野・臼谷線2号橋	大野・臼谷線	不明	4.7	RC橋	徳地	3.4	2022	Ⅱ				○												
朝倉団地1号線1号B橋	朝倉団地1号線	不明	2.8	RC橋	湯田	6.5	2022	Ⅱ				○												
大番橋	漆尾志手原線	不明	5	RC橋	徳地	5	2021	Ⅰ			○													
須路・中村線2号橋	須路・中村線	不明	3	RC橋	徳地	4	2021	Ⅰ			○													
御局橋	駅通り二丁目米屋町線	2009	13	PC橋	白石	5	2021	Ⅱ			○													
大野・臼谷線3号橋	大野・臼谷線	不明	4.2	RC橋	徳地	3	2022	Ⅱ				○												
白石第一橋	白石一丁目2号線	2008	9.5	RC橋	白石	5.2	2023	Ⅰ					○											
二ノ宮・奥開作線1号橋	二ノ宮・奥開作線	不明	12.5	RC橋	徳地	3.4	2022	Ⅱ				○												
深野小橋	丸山東園線	不明	6	RC橋	仁保	6.3	2024	Ⅱ	○					○										
今茶屋橋	赤田3号線	不明	9	RC橋	吉敷	3.4	2023	Ⅱ					○											
側道 開作線1号橋	側道 開作線	不明	10	PC橋	徳地	5.4	2023	Ⅱ					○											
谷尻橋	下林河内谷尻線	不明	4.9	鋼橋	徳地	3.4	2023	Ⅱ					○											
二ノ宮・奥開作線2号橋	二ノ宮・奥開作線	不明	5	RC橋	徳地	3.6	2022	Ⅱ				○												
大野・臼谷線4号橋	大野・臼谷線	不明	3.2	RC橋	徳地	3.2	2022	Ⅱ				○												
御茶屋橋	中市町中河原線	不明	13	RC橋	大殿	6.3	2021	Ⅱ			○													
大坪橋	赤田2号線	1987	21	PC橋	吉敷	5.2	2024	Ⅱ	○					○										
漆尾橋	漆尾・引谷線	1987	16	PC橋	徳地	6.2	2024	Ⅱ	○					○										
二ノ宮・奥開作線3号橋	二ノ宮・奥開作線	不明	2.8	RC橋	徳地	3	2022	Ⅰ				○												
沖田船津線1号橋	沖田船津線	不明	9.2	PC橋	徳地	5.2	2023	Ⅱ					○											
向原橋	下畑・向原線	1977	64	鋼橋	徳地	5.2	2024	Ⅱ	○					○										
亀山橋	下後河原線	1972	12.8	PC橋	大殿	4.3	2022	Ⅱ				○												
沖の原橋	漆尾志手原線	1971	129	鋼橋	徳地	4.2	2024	Ⅱ	○					○										
月見橋	一貫野線	不明	9	RC橋	仁保	4.4	2020	Ⅱ		○														
側道・開作・北野線1号橋	側道・開作・北野線	不明	11	PC橋	徳地	4.8	2023	Ⅱ					○											
鴻東橋	桜畠一丁目下後河原線	不明	14	RC橋	大殿	3.1	2021	Ⅱ			○													

施設名	路線名	架設年度	橋長(m)	種類	所在	幅員(m)	直近の点 検実施年	直近の評 定区分	点検実施計画年度						修繕計画年度						補修内容	概算補修金額 (百万円)	
									2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
宮の後橋	中尾東下中尾東上線	不明	12	RC橋	吉敷	3	2023	Ⅱ						○							断面修復等	1	
上白石橋	春日町2号線	不明	8	RC橋	白石	18.3	2024	Ⅱ	○						○	○						1	
漆尾線1号橋	漆尾線	不明	8	RC橋	徳地	4.6	2023	Ⅱ					○										
東山橋	古熊三丁目道祖町線	1980	46	PC橋	大殿	8.2	2024	Ⅱ	○						○								
琴水橋	下豎上下後河原線	不明	13.6	RC橋	大殿	5.5	2022	Ⅱ					○										
乱橋	赤田1号線	不明	8	RC橋	吉敷	4.2	2023	Ⅱ						○									
東山小橋	古熊三丁目道祖町線	不明	3.3	RC橋	大殿	5.3	2022	Ⅰ						○						断面修復等	1		
前橋	古熊三丁目道祖町線	不明	15	PC橋	大殿	4.8	2024	Ⅱ	○							○							
下恋路2号橋	下恋路2号線	不明	2.6	RC橋	宮野	8.8	2021	Ⅱ					○										
須路・中村線1号橋	須路・中村線	不明	4	RC橋	徳地	3	2021	Ⅰ					○										
五十鈴橋	春日町1号線	不明	5.2	石橋	白石	5	2022	Ⅱ						○									
春日橋	大手町野田線	不明	13	RC橋	大殿	3.7	2021	Ⅱ						○									
側道・開作・北野線2号橋	側道・開作・北野線	不明	11	PC橋	徳地	4.4	2023	Ⅱ							○								
流田・源代名線1号橋	流田・源代名線	不明	6	RC橋	徳地	12.5	2022	Ⅱ							○								
堀・片地線1号橋	堀・片地線	不明	4	RC橋	徳地	15	2019	Ⅱ	○							○							
八王子橋	東園5号線	不明	55	PC橋	仁保	7.2	2024	Ⅱ	○							○							
漆尾・引谷線1号橋	漆尾・引谷線	不明	5	RC橋	徳地	3.4	2021	Ⅱ						○									
大国橋	折本一丁目下恋路線	不明	14	PC橋	宮野	4.5	2021	Ⅱ						○									
清水橋	下恋路中恋路線	不明	18.9	PC橋	宮野	5.3	2022	Ⅱ							○								
側道・開作・北野線3号橋	側道・開作・北野線	不明	6.9	RC橋	徳地	11.4	2023	Ⅱ							○								
坂本深野8号橋	坂本深野線	不明	11	RC橋	仁保	4.6	2024	Ⅱ						○									
伊勢橋	石観音伊勢橋2号線	不明	12	RC橋	大殿	11	2021	Ⅱ							○								
筋違橋	桜畠一丁目下後河原線	不明	8	RC橋	大殿	7.6	2021	Ⅱ							○								
梅ノ木橋	古熊三丁目1号線	不明	2	RC橋	大殿	3	2021	Ⅱ							○								
薬師橋	中恋路線	不明	14	RC橋	宮野	2.6	2021	Ⅱ							○								
鳴谷・茂知木線1号橋	鳴谷・茂知木線	不明	7.4	鋼橋	徳地	8.1	2022	Ⅱ							○								
下河原橋	折本一丁目下恋路線	不明	2.2	混合橋	宮野	7.2	2021	Ⅱ							○								
一ッ橋	水の上町香山町線	不明	13.6	PC橋	大殿	3.8	2022	Ⅲ						○					○	○	ひび割れ注入	54	
下恋路橋	折本一丁目下恋路線	不明	41	鋼橋	宮野	6.6	2016	Ⅲ	○						○	○					上部工補修	70	
下恋路橋側道橋	折本一丁目下恋路線	2011	45	PC橋	宮野	3.8	2022	Ⅰ							○								
伏野下・東西線1号橋	伏野下・東西線	不明	2.9	RC橋	徳地	5.1	2023	Ⅱ							○								
東園橋	丸山東園線	不明	7	RC橋	仁保	5.9	2024	Ⅱ	○							○							
法泉寺1号橋	滝町2号線	不明	9.2	PC橋	大殿	4.8	2022	Ⅱ							○								
須崎橋	堀・片地線	1964	55	PC橋	徳地	3.7	2024	Ⅱ	○							○							
下江良橋	八幡馬場江良線	不明	3	RC橋	宮野	6.5	2021	Ⅱ							○								
柳橋	沖田須路線	1956	55	RC橋	徳地	3.6	2024	Ⅱ	○							○							
折本一丁目橋	折本二丁目折本一丁目線	不明	5	PC橋	宮野	3	2021	Ⅱ							○								
陰地第一橋	串・陰地線	1969	18	PC橋	徳地	3.4	2021	Ⅲ								○			○	○	○	断面修復等	113
香山橋	水の上町香山町線	不明	13.6	PC橋	大殿	3.8	2022	Ⅱ							○								
丸山橋	中尾東下中尾東上線	不明	3	RC橋	吉敷	3.6	2023	Ⅱ						○									
漆尾・引谷線2号橋	漆尾・引谷線	不明	5	RC橋	徳地	4.3	2023	Ⅱ							○								
堀・西川線1号橋	堀・西川線	不明	3	RC橋	徳地	5.4	2019	Ⅱ	○							○							
法泉寺2号橋	滝町2号線	不明	10.4	PC橋	大殿	5.3	2022	Ⅱ							○								
陰地橋	陰地・中串線	1961	15	RC橋	徳地	3.6	2024	Ⅱ	○							○							
元山橋	中恋路上矢田線	1991	23	PC橋	宮野	6.2	2021	Ⅰ							○								
中恋路橋	桜畠二丁目中恋路線	不明	43	PC橋	宮野	5.8	2021	Ⅱ							○								

施設名	路線名	架設年度	橋長(m)	種類	所在	幅員(m)	直近の点 検実施年	直近の判 定区分	点検実施計画年度						修繕計画年度						補修内容	概算補修金額 (百万円)
									2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
折本橋	桜島一丁目下後河原線	不明	3	RC橋	宮野	7.6	2021	I			○											
小高野橋	東園 6 号線	1987	65	PC橋	仁保	7.2	2024	II	○					○								
坂本深野 7 号橋	坂本深野線	不明	3	RC橋	仁保	4.2	2024	II		○												
護国橋	上金古曾初瀬線	不明	3.8	RC橋	宮野	12.1	2020	II		○												
旭・西川線1号橋	旭・西川線	不明	2.7	RC橋	徳地	3	2023	II					○									
側道 庄方・上佐線1号橋	側道 庄方・上佐線	不明	11.5	PC橋	徳地	5.2	2023	II					○									
中尾西橋	中尾西線	不明	5	RC橋	吉敷	5.2	2023	II					○									
庄方・才契線1号橋	庄方・才契線	不明	6.4	RC橋	徳地	5	2022	I				○										
丸山橋	中尾西中尾東上 2 号線	不明	6.9	RC橋	吉敷	6.2	2022	I				○										
上恋路橋	上恋路中恋路線	不明	18	PC橋	宮野	3	2021	II			○											
江良橋	八幡馬場江良線	不明	5	RC橋	宮野	6.1	2021	II			○											
中尾橋	中尾東下中尾東上線	不明	6	RC橋	吉敷	3.3	2023	II					○									
上田橋	田屋・上田線	不明	10	PC橋	徳地	3.4	2022	II				○										
桜島小橋	上桜島桜島一丁目線	不明	16	PC橋	宮野	5.2	2021	I			○											
西の浴橋	中尾西線	不明	4	RC橋	吉敷	5.2	2023	II					○									
俊竜寺橋	木町天花 2 号線	不明	10.5	RC橋	大殿	3.2	2020	II		○												
坂本深野 1 号橋	坂本深野線	不明	3	RC橋	仁保	5.9	2024	II		○												
栗林橋	中尾西中尾東上線	不明	10	RC橋	吉敷	3.3	2023	III					○		○							1
側道 連絡 4 号線 1 号橋	側道 連絡 4 号線	不明	4.6	RC橋	徳地	4.7	2023	II					○									
関・中央線1号橋	関・中央線	不明	4.3	RC橋	徳地	3.8	2023	II					○									
西桜島橋	桜島一丁目西桜島線	不明	16	PC橋	宮野	6.2	2021	I			○											
初瀬橋	平野 5 号線	不明	2.5	RC橋	宮野	15.7	2021	II			○										断面修復等	1
青木橋	桜島二丁目上恋路線	不明	43	PC橋	宮野	6.2	2021	II			○											
坂本深野 6 号橋	坂本深野線	不明	4	RC橋	仁保	5	2024	II		○												
平野橋	平野 5 号線	不明	2.3	RC橋	宮野	12.1	2021	II			○											
殿河内橋	桜島一丁目西桜島線	不明	4.3	RC橋	宮野	4.7	2021	II			○											
上恋路線 1 号橋	上恋路線	不明	2.4	RC橋	宮野	7.4		未点検														
丸山 3 号橋	下郷丸山 5 号線	不明	4	RC橋	仁保	5.7	2020	II		○												
熊坂 2 号橋	熊坂 2 号線	不明	3.3	RC橋	宮野	4.3	2021	II		○					○						ひび割れ注入	1.2
上角・中角線1号橋	上角・中角線	不明	6.8	RC橋	徳地	3.3	2023	II					○									
下土井橋	上桜島桜島三丁目線	不明	7	RC橋	宮野	4.1	2021	II			○											
坂本深野 5 号橋	坂本深野線	不明	5	RC橋	仁保	5	2024	II		○												
一渡瀬橋	下郷丸山 6 号線	不明	79	PC橋	仁保	7.2	2024	II	○					○								
丸山橋	下郷丸山 1 号線	不明	8	RC橋	仁保	5.9	2024	II	○					○								
丸山 2 号橋	下郷丸山 5 号線	不明	5	PC橋	仁保	8.1	2020	II		○												
上角・保堂線1号橋	上角・保堂線	不明	10	RC橋	徳地	6.6	2022	II				○										
常栄寺橋	平野線	不明	2	RC橋	宮野	8.1	2020	II		○												
桜島 1 号橋	桜島三丁目 1 号線	不明	13	RC橋	宮野	17.4	2021	II			○											
徳間草橋	安養地・高瀬線	1984	17	PC橋	徳地	7.7	2022	III				○							○	ひび割れ注入		44
丸山 1 号橋	丸山東園線	不明	5	RC橋	仁保	14.4	2024	II	○					○								
落合橋	住吉熊坂線	不明	5.6	RC橋	宮野	5	2020	II		○												
向河内橋	上串・上角線	1954	14.6	PC橋	徳地	6	2023	II					○									
漆尾・引谷線3号橋	漆尾・引谷線	不明	6.2	RC橋	徳地	5.8	2023	II					○									
桜島 2 号橋	桜島四丁目西桜島線	不明	3.7	RC橋	宮野	4.8	2019	II	○					○								
才谷線1号橋	才谷線	不明	3	RC橋	徳地	4.1	2023	II					○									
中田橋	熊坂線	不明	3	RC橋	宮野	5.3	2019	II	○					○								

施設名	路線名	架設年度	橋長(m)	種類	所在	幅員(m)	直近の点 検実施年	直近の判 定区分	点検実施計画年度						修繕計画年度						補修内容	概算補修金額 (百万円)
									2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
森2号橋	大山路北恋路線	不明	3	混合橋	宮野	3	2021	Ⅱ			○											
滑谷橋	小古祖・元折線	不明	10	PC橋	徳地	5.8	2019	Ⅱ	○					○								
坂本深野3号橋	坂本深野線	不明		RC橋	仁保	4.8		Ⅱ		○												
足谷・山ノ奥線1号橋	足谷・山ノ奥線	不明	4.5	RC橋	徳地	3	2022	Ⅱ				○										
鯖・向ヶ迫線1号橋	鯖・向ヶ迫線	不明	7.5	鋼橋	徳地	4.4	2023	Ⅱ					○									
松柄橋	松柄線	不明	4	RC橋	仁保	4.8	2024	Ⅱ	○					○								
上小古祖東線2号橋	上小古祖東線	不明	5.5	RC橋	徳地	3	2022	Ⅱ				○										
畑橋	住吉1号線	不明	3.6	RC橋	宮野	4	2020	Ⅱ		○												
森1号橋	大山路北恋路線	不明	4	混合橋	宮野	5.4	2021	Ⅱ			○											
上小古祖東線1号橋	上小古祖東線	不明	5.2	RC橋	徳地	3.2	2022	Ⅱ				○										
台田上橋	中尾西線	不明	8	RC橋	吉敷	4.3	2023	Ⅱ					○									
竹ノ丸中橋	土井野上線	1990	22	PC橋	仁保	7.2	2024	Ⅱ	○					○								
大江橋	石丸2号線	不明	7	RC橋	宮野	3	2021	Ⅱ			○											
御所野線1号橋	御所野線	不明	10.3	PC橋	徳地	6.2	2022	Ⅱ				○										
井領橋	原河内2号線	不明	21	RC橋	仁保	6	2024	Ⅱ	○					○								
湯屋橋	原河内4号線	不明	5	RC橋	仁保	5.6	2020	Ⅱ		○												
井開田東坂本線1号橋	井開田東坂本線	不明	4.4	RC橋	仁保	4.1	2022	Ⅰ				○										
うつか橋	堀・小古祖線	不明	16	RC橋	徳地	5.5	2024	Ⅱ	○					○								
御所野橋	小古祖・元折線	1991	18	PC橋	徳地	5	2024	Ⅱ	○					○								
北野橋	小古祖・元折線	1992	12	PC橋	徳地	6.5	2019	Ⅱ	○					○								
雲明橋	小古祖・元折線	不明	9	RC橋	徳地	5.2	2019	Ⅱ	○					○								
竹の丸上橋	高野東線	不明	22	PC橋	仁保	5	2024	Ⅱ	○					○								
旧蔵橋	石丸線	不明	10	RC橋	宮野	3.1	2021	Ⅱ			○									断面修復等		1
新蔵橋	石丸線	不明	27	PC橋	宮野	4.1	2021	Ⅱ			○											
大蔵橋	天花畑4号線	不明	9.5	PC橋	大殿	4.3	2022	Ⅰ				○										
ニッ堂2号橋	天花畑3号線	不明	5	RC橋	大殿	3.2	2021	Ⅱ			○											
才契中線1号橋	才契中線	不明	6.5	RC橋	徳地	3	2023	Ⅱ					○									
目眠橋	天花畑2号線	不明	7	RC橋	大殿	3.2	2021	Ⅱ			○											
上中野橋	河原電花線	不明	3	RC橋	宮野	5.2	2021	Ⅱ			○											
泉竜花線1号橋	泉竜花線	不明	4.6	RC橋	宮野	9.8	2022	Ⅰ				○										
ニッ堂3号橋	天花畑3号線	不明	5	RC橋	大殿	3.3	2021	Ⅱ			○											
深谷橋	深谷・巢垣線	不明	10.4	PC橋	徳地	3.4	2022	Ⅱ				○										
柿ノ木橋	戸祢・瀬戸原線	1992	19	PC橋	徳地	6.8	2021	Ⅱ			○											
ニッ堂1号橋	天花畑3号線	不明	8.7	RC橋	大殿	3.3	2022	Ⅱ		○					○					断面修復等		1
下河内・原線1号橋	下河内・原線	不明	9	RC橋	徳地	3.3	2022	Ⅱ				○										
才契上線1号橋	才契上線	不明	5.7	RC橋	徳地	5.1	2023	Ⅱ					○									
安養地・帆柱線1号橋	安養地・帆柱線	不明	4.3	RC橋	徳地	4.5	2022	Ⅱ				○										
観音橋	天花畑2号線	1984	9	PC橋	大殿	5	2021	Ⅱ			○											
漆尾・引谷線4号橋	漆尾・引谷線	不明	7.4	RC橋	徳地	4.6	2023	Ⅱ					○									
榎谷橋	戸祢・瀬戸原線	不明	7.8	RC橋	徳地	3.2	2022	Ⅱ				○										
井開田橋	井開田西1号線	不明	25	PC橋	仁保	6.3	2024	Ⅱ	○					○								
橋詰橋	漆尾・引谷線	1997	10.9	PC橋	徳地	9.7	2023	Ⅱ					○									
安養地・帆柱線2号橋	安養地・帆柱線	不明	4.8	RC橋	徳地	4.4	2022	Ⅱ				○										
七房橋	七房3号線	不明	5	RC橋	宮野	4	2019	Ⅱ	○					○						断面修復等		1
引明橋	深谷線	1990	5	RC橋	徳地	5.2	2023	Ⅱ					○									
御所野・鯖線1号橋	御所野・鯖線	不明	11	鋼橋	徳地	6.4	2022	Ⅱ				○										

施設名	路線名	架設年度	橋長(m)	種類	所在	幅員(m)	直近の点 検実施年	直近の判 定区分	点検実施計画年度						修繕計画年度						補修内容	概算補修金額 (百万円)
									2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
安養地・帆柱線3号橋	安養地・帆柱線	不明	5.4	RC橋	徳地	4.6	2022	Ⅱ				○										
下川添・落合線1号橋	下川添・落合線	不明	7.7	RC橋	徳地	2.3	2022	Ⅱ				○										
廣瀬橋	小古祖・横野線	2003	74.1	PC橋	徳地	9.2	2023	Ⅱ					○									
仁保市橋	仁保市線	不明	15	PC橋	仁保	5.2	2024	Ⅱ	○					○								
兄弟橋	土井両浴線	1987	9	PC橋	仁保	3.3	2024	Ⅱ	○					○								
上八坂・才契線2号橋	上八坂・才契線	不明	5.5	RC橋	徳地	3.6	2022	Ⅱ				○										
上八坂・才契線1号橋	上八坂・才契線	不明	5.3	RC橋	徳地	3.3	2022	Ⅱ				○										
浅地 3 号橋	両浴 1 号線	不明	3	RC橋	仁保	6	2024	Ⅱ	○					○								
上石川橋	両浴 1 号線	不明	3	RC橋	仁保	6	2024	Ⅱ	○					○								
西・狸尾線1号橋	西・狸尾線	不明	6.7	RC橋	徳地	2.5	2022	Ⅱ				○										
教林寺橋	土井両浴線	1994	12	PC橋	仁保	4	2024	Ⅱ	○					○								
横野・公会堂線1号橋	横野・公会堂線	不明	3	RC橋	徳地	6	2022	Ⅰ				○										
土田橋	引谷小学校線	不明	16	PC橋	徳地	5	2022	Ⅰ				○										
皇徳寺橋	高野西高畠線	不明	26	鋼橋	仁保	3.1	2024	Ⅱ	○					○								
橋橋	泉竜花線	不明	33	PC橋	宮野	5.2	2021	Ⅱ				○										
養着橋	両浴 1 号線	不明	3	RC橋	仁保	4.6	2024	Ⅱ	○					○								
上黒岩橋	七房 1 号線	不明	5	RC橋	宮野	7.6	2021	Ⅱ				○										
塩川 1 号橋	北河内 3 号線	不明	2	RC橋	仁保	3.9	2024	Ⅱ			○											
瀧橋	天花畑 1 号線	不明	8	RC橋	大畧	1.5	2021	Ⅱ				○										
両浴橋	両浴 5 号線	不明	9	RC橋	仁保	3.1	2020	Ⅱ			○											
恋頭橋	両浴 5 号線	不明	9	RC橋	仁保	3.6	2020	Ⅱ			○											
下中畑橋	下中畑・大峠線	1955	19	RC橋	徳地	5.2	2022	Ⅰ					○									
下田橋	北河内高畠線	不明	26	鋼橋	仁保	5.6	2024	Ⅱ	○					○								
土田の下橋	北河内高畠線	不明	3	RC橋	仁保	4.5	2024	Ⅱ			○											
楮原橋	両浴 1 号線	不明	10	PC橋	仁保	5.4	2024	Ⅱ	○					○								
柳田・戸祢線1号橋	柳田・戸祢線	不明	6.1	RC橋	徳地	4.6	2022	Ⅰ				○										
大峠橋	大峠・石ヶ原線	不明	15	PC橋	徳地	3.7	2021	Ⅲ				○					○		○	断面修復等		93
黒石下橋	北河内 3 号線	不明	4	RC橋	仁保	3.8	2024	Ⅱ			○											
野稻橋	土井両浴線	不明	7	RC橋	仁保	3.5	2024	Ⅱ	○					○								
浅地 1 号橋	両浴 1 号線	不明	6	RC橋	仁保	3.5	2024	Ⅱ	○					○								
川口上線1号橋	川口上線	不明	11.4	鋼橋	徳地	3	2022	Ⅱ				○										
奥川口橋	川口・刈干線	不明	3.3	RC橋	徳地	4.9	2023	Ⅱ					○									
小河内中橋	北河内 5 号線	不明	8	RC橋	仁保	5	2020	Ⅰ			○											
北河内 6 号線 1 号橋	北河内 6 号線	不明	24.6	混合橋	仁保	3.1	2022	Ⅱ					○									
上勘橋	岩杖線	不明	6.2	RC橋	宮野	3.4	2020	Ⅱ			○											
黒石橋	北河内 2 号線	不明	25	PC橋	仁保	4.8	2024	Ⅱ	○					○								
二反田橋	土井両浴線	不明	7	RC橋	仁保	3.9	2024	Ⅱ	○					○	○							1
三谷川橋	乙女・上八坂線	1954	35	RC橋	徳地	6.3	2023	Ⅲ					○				○	○	○	○	断面修復等	114
梶木橋	岩杖線	不明	8.4	RC橋	宮野	4.2	2020	Ⅱ			○											
家成線1号橋	家成線	不明	15	PC橋	徳地	2.5	2021	Ⅱ				○										
巢垣橋	円清・奈良原線	1964	19	RC橋	徳地	3.4	2021	Ⅱ				○										
新巢垣橋	深谷・巢垣線	1978	21	PC橋	徳地	4.8	2024	Ⅱ														
円清・奈良原線1号橋	円清・奈良原線	不明	3.5	RC橋	徳地	5.4	2022	Ⅰ				○										
荷背橋	岩杖線	不明	3	RC橋	宮野	3	2020	Ⅱ			○											
北谷橋	北谷線	不明	12.5	PC橋	徳地	5.2	2023	Ⅰ					○									
真名子橋	上八坂・才契線	1975	84	鋼橋	徳地	5.8	2021	Ⅱ				○										

施設名	路線名	架設年度	橋長(m)	種類	所在	幅員(m)	直近の点 検実施年	直近の評 定区分	点検実施計画年度						修繕計画年度						補修内容	概算補修金額 (百万円)		
									2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
神原橋	日平・神原線	1965	23	PC橋	徳地	2.7	2021	Ⅱ				○												
小河内橋	北河内1号線	不明	7	RC橋	仁保	8.3	2024	Ⅱ	○						○									
円清・奈良原線2号橋	円清・奈良原線	不明	6.6	RC橋	徳地	4.8	2022	Ⅱ					○											
国木線1号橋	国木線	不明	9.5	RC橋	徳地	3.2	2023	Ⅱ						○								断面修復等		1
船谷橋	神原・下船谷線	1962	16	RC橋	徳地	3.9	2021	Ⅱ				○												
三谷橋	円清・奈良原線	不明	16	鋼橋	徳地	4.8	2021	Ⅱ				○												
国木橋	北谷・山ノ上線	不明	6.6	RC橋	徳地	3.3	2022	Ⅱ					○											
縄手橋	岩杖線	不明	6	RC橋	宮野	3	2021	Ⅱ				○												
森の下橋	岩杖線	不明	7	PC橋	宮野	4	2021	Ⅱ				○												
名古脇小橋	一ノ瀬2号線	不明	10	PC橋	仁保	3.7	2020	Ⅱ			○											橋面防水工		1
深瀬東線1号橋	深瀬東線	不明	10.5	鋼橋	徳地	3.4	2023	Ⅱ						○										
中谷橋	木地屋・中谷線	1964	20	RC橋	徳地	2.2	2021	Ⅱ				○												
北谷・山ノ上線1号橋	北谷・山ノ上線	不明	9.8	PC橋	徳地	3.6	2022	Ⅱ					○											
城山橋	一ノ瀬2号線	1989	23	鋼橋	仁保	4.2	2024	Ⅱ	○						○									
白水橋	一ノ瀬線	不明	5	RC橋	仁保	4	2024	Ⅱ			○													
法雲院橋	一ノ瀬線	1990	22	鋼橋	仁保	4.7	2024	Ⅱ	○						○									
高瀬橋	下庄・丸山線	1982	63	PC橋	徳地	6.2	2024	Ⅱ	○						○									
宮河内橋	川口・屋敷線	不明	12	鋼橋	徳地	5.6	2019	Ⅱ	○						○									
田代第四号橋	田代線	不明	4.6	RC橋	阿東	3	2022	Ⅰ					○											
金坪橋	金坪線	不明	6	RC橋	仁保	5.7	2020	Ⅰ			○													
田代第三号橋	田代線	不明	2	RC橋	阿東	4.5	2022	Ⅰ					○											
前原・志手ノ木線4号橋	前原・志手ノ木線	不明	12.2	PC橋	徳地	3.9	2023	Ⅱ						○										
下奥谷線1号橋	下奥谷線	不明	2.1	RC橋	徳地	2.9	2023	Ⅱ						○										
前原・志手ノ木線1号橋	前原・志手ノ木線	不明	3.8	RC橋	徳地	4	2022	Ⅰ					○											
原橋	船路大月線	1998	17	PC橋	徳地	6.2	2024	Ⅱ	○						○									
大畠2号線1号橋	大畠2号線	不明	8	PC橋	仁保	4.8	2020	Ⅱ			○													
田代第二号橋	田代線	不明	6.1	RC橋	阿東	4.2	2023	Ⅱ						○								断面修復等		2
岩倉下橋	上郷大畠線	不明	9	RC橋	仁保	3.4	2024	Ⅱ	○						○									
船路大月線1号橋	船路大月線	不明	5	RC橋	徳地	4.4	2019	Ⅰ	○						○									
大峠橋	大峠線	1970	4.1	RC橋	阿東	3.7	2022	Ⅰ					○											
岩倉上橋	上郷大畠線	不明	9	RC橋	仁保	3.4	2024	Ⅱ	○						○									
船路大月線7号橋	船路大月線	不明	3	RC橋	徳地	3.3	2019	Ⅱ	○						○									
板見堂橋	板見堂線	不明	5.8	RC橋	阿東	3	2022	Ⅰ					○											
田代第一号橋	田代線	不明	3	RC橋	阿東	3.5	2021	Ⅱ				○												
椿橋	板見堂線	不明	9.5	RC橋	阿東	3	2022	Ⅰ					○											
船路大月線6号橋	船路大月線	不明	5	RC橋	徳地	6	2019	Ⅱ	○						○									
前原・志手ノ木線2号橋	前原・志手ノ木線	不明	4.5	RC橋	徳地	3.2	2022	Ⅱ					○											
奥河内線1号橋	奥河内線	不明	11.6	鋼橋	徳地	2.7	2022	Ⅱ					○											
岩倉橋	上郷大畠線	不明	6	RC橋	仁保	2.4	2024	Ⅱ	○						○									
文珠橋	大峠線	1958	3.5	RC橋	阿東	3	2022	Ⅰ					○											
文珠上橋	篠目文珠線	1979	4	RC橋	阿東	4.1	2021	Ⅱ				○												
間方橋	御馬・間方線	1959	57	PC橋	徳地	2.7	2021	Ⅲ				○							○	○	断面修復等		115	
上奥河内線1号橋	上奥河内線	不明	13.3	PC橋	徳地	4.2	2023	Ⅱ						○										
文珠下橋	篠目文珠線	不明	4	RC橋	阿東	4.5	2021	Ⅱ				○												
船路大月線5号橋	船路大月線	不明	6	RC橋	徳地	3.5	2019	Ⅱ	○						○									
桃木線1号橋	桃木線	不明	7.8	RC橋	徳地	3.3	2022	Ⅱ					○											

施設名	路線名	架設年度	橋長(m)	種類	所在	幅員(m)	直近の点 検実施年	直近の評 定区分	点検実施計画年度						修繕計画年度						補修内容	概算補修金額 (百万円)	
									2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
船路大月線2号橋	船路大月線	不明	13	RC橋	徳地	4.4	2019	Ⅱ	○					○									
船路大月線3号橋	船路大月線	不明	11	RC橋	徳地	3.6	2019	Ⅱ	○					○									
船路大月線4号橋(彌六橋)	船路大月線	不明	8	RC橋	徳地	3	2019	Ⅱ	○					○									
屋敷・長者ヶ原線1号橋	屋敷・長者ヶ原線	不明	4	RC橋	徳敷	4.6	2023	Ⅱ					○								断面修復等	1.5	
乱橋	篠目文珠線	1938	20	RC橋	阿東	5.5	2024	Ⅱ	○					○									
久保橋	川口・屋敷線	1988	43	PC橋	徳地	10.1	2024	Ⅱ	○					○									
屋敷・長者ヶ原線2号橋	屋敷・長者ヶ原線	不明	5.4	RC橋	徳地	3.8	2023	Ⅱ						○									
第二大江河内橋	大江河内線	不明	10.2	RC橋	阿東	3	2022	Ⅰ					○										
下谷口橋	見付線	不明	8.8	RC橋	阿東	3.5	2022	Ⅰ					○										
林橋	見付線	不明	10.1	RC橋	阿東	3	2022	Ⅰ					○										
梶畑線3号橋	梶畑線	不明	3	RC橋	徳地	3.6	2023	Ⅱ						○									
白口橋	見付線	不明	4.2	RC橋	阿東	3.3	2022	Ⅰ					○										
古釜橋	見付線	不明	3	RC橋	阿東	3.5	2022	Ⅰ					○										
前原・志手ノ木線3号橋	前原・志手ノ木線	不明	8.9	RC橋	徳地	4.1	2022	Ⅱ					○										
第一大江河内橋	大江河内線	不明	10.3	RC橋	阿東	4	2022	Ⅱ					○										
滝の下橋	見付線	不明	4	RC橋	阿東	4	2022	Ⅰ					○										
出合橋	御馬・ゆづりは線	1938	41	RC橋	徳地	5.9	2022	Ⅲ					○				○	○	○	○	断面修復等	123	
見付橋	見付線	1964	13	鋼橋	阿東	3.6	2021	Ⅱ					○										
中郷(向山)橋	篠目文珠線	不明	2	RC橋	阿東	3.4	2022	Ⅱ					○										
見附東橋	見付東線	不明	12	PC橋	阿東	4.2	2024	Ⅰ	○					○									
梶畑線2号橋	梶畑線	不明	4.7	RC橋	徳地	3.7	2023	Ⅱ					○								断面修復等	0.5	
志手ノ木線1号橋	志手ノ木線	不明	2.7	RC橋	徳地	3.9	2022	Ⅱ					○										
馬渡瀬橋	小河内線	不明	8.4	RC橋	阿東	3.2	2022	Ⅱ					○										
桃木・梶畑線1号橋	桃木・梶畑線	不明	8.9	RC橋	徳地	4.4	2022	Ⅱ					○										
第三細野橋	細野線	不明	3	RC橋	阿東	3.1	2022	Ⅰ					○										
梶畑線1号橋	梶畑線	不明	5	RC橋	徳地	3.4	2023	Ⅲ					○		○						断面修復等	1	
白井谷橋	御馬・ゆづりは線	1988	19	PC橋	徳地	7.7	2022	Ⅱ					○										
海禅寺橋	上中郷線	不明	10.3	RC橋	阿東	4	2022	Ⅰ					○										
白瀬橋	大林線	不明	12	RC橋	阿東	1.3	2024	Ⅱ	○					○									
第二細野橋	細野線	不明	2.4	RC橋	阿東	3.5	2022	Ⅰ					○										
中郷橋	中郷中線	1989	22	PC橋	阿東	3.1	2024	Ⅰ			○												
柴崎橋	中郷細野線	1965	5.9	RC橋	阿東	6.7	2022	Ⅰ					○										
小林橋	細野小林線	1974	19	RC橋	阿東	3.6	2024	Ⅱ	○					○									
九鬼橋	桃木・梶畑線	1959	15	RC橋	徳地	4	2021	Ⅱ				○											
吉原橋	中郷細野線	1950	5	RC橋	阿東	4.6	2022	Ⅰ					○										
高明橋	釣山梶畑線	不明	13.9	PC橋	徳地	4	2022	Ⅱ					○										
第一細野橋	細野線	不明	2.7	RC橋	阿東	4.3	2022	Ⅱ					○										
第二北谷橋	御馬・ゆづりは線	1953	14.8	PC橋	徳地	6.2	2023	Ⅱ						○									
細野橋	篠目文珠線	1950	15	RC橋	阿東	5.6	2024	Ⅱ	○					○									
第3北谷橋	北谷・白井線	不明	13	PC橋	徳地	5.2	2022	Ⅱ					○										
釣山梶畑線10号橋	釣山梶畑線	不明	2.1	RC橋	徳地	3.6	2022	Ⅱ					○										
第4北谷橋	北谷・白井線	不明	6	RC橋	徳地	5.2	2022	Ⅱ					○										
下出合・釣山線1号橋	下出合・釣山線	不明	4.9	RC橋	徳地	3.6	2022	Ⅱ					○								断面修復等	2	
河井橋	篠目文珠線	不明	3	RC橋	阿東	4.8	2021	Ⅱ					○										
釣山梶畑線5号橋	釣山梶畑線	不明	5.4	RC橋	徳地	3.9	2022	Ⅱ					○										
釣山梶畑線4号橋	釣山梶畑線	不明	9.4	RC橋	徳地	3.9	2023	Ⅱ						○									

施設名	路線名	架設年度	橋長(m)	種類	所在	幅員(m)	直近の点 検実施年	直近の判 定区分	点検実施計画年度						修繕計画年度						補修内容	概算補修金額 (百万円)
									2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
釣山梶畑線9号橋	釣山梶畑線	不明	5.1	RC橋	徳地	3.8	2022	Ⅱ				○										
第二隠藪橋	釣山梶畑線	1959	22.2	RC橋	徳地	4.5	2023	Ⅱ					○									
北谷・白井線1号橋	北谷・白井線	不明	15	RC橋	徳地	4.6	2024	Ⅱ	○					○								
釣山梶畑線8号橋	釣山梶畑線	不明	8.1	RC橋	徳地	3.9	2023	Ⅱ					○									
橋本橋	橋本細野線	1972	23	鋼橋	阿東	3.1	2024	Ⅱ	○					○								
釣山梶畑線6号橋	釣山梶畑線	不明	2.6	RC橋	徳地	3.9	2022	Ⅰ				○										
隠藪橋	隠藪・滑線	1955	17.5	RC橋	徳地	3.9	2023	Ⅱ					○									
釣山梶畑線7号橋	釣山梶畑線	不明	2.4	RC橋	徳地	3.8	2022	Ⅱ				○										
釣山梶畑線2号橋	釣山梶畑線	不明	3	RC橋	徳地	3.8	2022	Ⅱ				○										
釣山梶畑線3号橋	釣山梶畑線	不明	3	RC橋	徳地	3.8	2022	Ⅱ				○										
北谷・白井線2号橋	北谷・白井線	不明	9	鋼橋	徳地	4.7	2021	Ⅱ			○											
下滑橋	隠藪・滑線	1955	19.8	RC橋	徳地	4	2023	Ⅱ					○									
日暮川橋	釣山梶畑線	1955	20.2	RC橋	徳地	3.9	2023	Ⅱ					○									
嫁叶橋	岡草嫁叶線	1972	27	RC橋	阿東	3.5	2024	Ⅱ	○					○								
下出合・釣山線2号橋	下出合・釣山線	不明	4.8	RC橋	徳地	5.4	2022	Ⅱ				○										
下今明橋	釣山梶畑線	1967	11.1	RC橋	徳地	3.9	2023	Ⅱ					○									
隠藪・滑線1号橋	隠藪・滑線	不明	3.2	RC橋	徳地	4	2022	Ⅱ				○										
隠藪・滑線2号橋	隠藪・滑線	不明	7.7	RC橋	徳地	4.2	2023	Ⅱ					○									
畠中橋	岡草嫁叶線	不明	7	RC橋	阿東	4	2021	Ⅱ			○											
隠藪・滑線3号橋	隠藪・滑線	不明	14.4	鋼橋	徳地	4.2	2023	Ⅱ					○									
岡草橋	岡草嫁叶線	1972	37	PC橋	阿東	6.3	2024	Ⅱ	○					○								
釣山梶畑線1号橋	釣山梶畑線	不明	3.7	RC橋	徳地	4.8	2022	Ⅱ				○										
中村橋	岡草嫁叶線	不明	9.5	RC橋	阿東	4.2	2023	Ⅰ					○									
養徳原下祖父線1号橋	養徳原下祖父線	不明	5.2	RC橋	徳地	3.7	2023	Ⅱ					○									
釣山橋	釣山梶畑線	1951	26.3	RC橋	徳地	4.4	2023	Ⅱ					○									
祖父第2橋	釣山梶畑線	2007	28	PC橋	徳地	6	2021	Ⅰ			○											
祖父第一橋	釣山梶畑線	1977	32	PC橋	徳地	5	2021	Ⅰ			○											
釣山祖父線1号橋	釣山祖父線	不明	7	RC橋	徳地	3.3	2022	Ⅱ				○										
祖父橋	笹ヶ滝・祖父線	1987	28.1	PC橋	徳地	4.6	2023	Ⅱ					○									
祖父・野夫線1号橋	祖父・野夫線	不明	6.8	RC橋	徳地	3	2022	Ⅰ				○										
祖父・野夫線2号橋	祖父・野夫線	不明	3.4	RC橋	徳地	2.7	2023	Ⅱ					○									
笹ヶ滝橋	笹ヶ滝・祖父線	2004	26	鋼橋	徳地	2.5	2021	Ⅰ			○											
堂ヶ谷橋	御堂原千頭線	不明	6	RC橋	阿東	3.2	2021	Ⅱ			○											
日の迫橋	御堂原千頭線	不明	6	RC橋	阿東	3.5	2021	Ⅱ			○											
千頭橋	千頭大野線	1956	52	RC橋	阿東	3.7	2024	Ⅱ	○					○								
母屋橋	千頭大野線	不明	3	RC橋	阿東	2.9	2021	Ⅱ			○											
大谷橋	千頭大野線	不明	7	RC橋	阿東	3.8	2021	Ⅱ			○											
柳ヶ浴橋	築地西線	不明	5	RC橋	阿東	2	2021	Ⅱ			○											
芝添橋	築地線	不明	6	RC橋	阿東	4	2021	Ⅱ			○											
渡川橋	渡川停車場線	1974	61	鋼橋	阿東	3.7	2024	Ⅱ	○					○			○	○				
渡川小橋	渡川停車場線	不明	2	RC橋	阿東	6.5	2021	Ⅱ			○											
小野・高巢線2号橋	小野・高巢線	不明	3.9	RC橋	徳地	7.5	2022	Ⅱ				○										
下柚木線1号橋	下柚木線	不明	4.2	RC橋	徳地	3	2022	Ⅰ				○										
小野・高巢線1号橋	小野・高巢線	不明	5	RC橋	徳地	4.5	2022	Ⅱ				○										
第一清丸橋	清丸線	2001	7	PC橋	阿東	4.8	2021	Ⅱ			○											
榎谷橋	榎谷杉原線	1974	61	鋼橋	阿東	3.7	2024	Ⅱ	○					○								

施設名	路線名	架設年度	橋長(m)	種類	所在	幅員(m)	直近の点 検実施年	直近の判 定区分	点検実施計画年度						修繕計画年度						補修内容	概算補修金額 (百万円)	
									2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
榎谷小橋	榎谷線	不明	6	RC橋	阿東	3.2	2021	Ⅱ			○												
第二清丸橋	清丸線	不明	10	PC橋	阿東	3.1	2021	Ⅱ			○												
柚木大橋	柚木・刀迫線	1981	35	鋼橋	徳地	6.7	2024	Ⅱ	○					○									
栃谷橋	栃谷線	不明	4	RC橋	阿東	3.2	2021	Ⅱ			○												
杉ノ原橋	開作西側線	不明	7	RC橋	阿東	3	2022	Ⅰ					○										
今明橋	小野・高巢線	1959	28	RC橋	徳地	2.9	2021	Ⅱ			○												
開作橋	開作横断線	1953	25	PC橋	阿東	3.8	2024	Ⅱ			○												
上杉原橋	杉原三谷線	1974	53	鋼橋	阿東	2.7	2024	Ⅱ			○												
古屋敷橋	古屋敷線	不明	4	RC橋	阿東	7.2	2021	Ⅱ			○												
柚木・刀迫線1号橋	柚木・刀迫線	不明	4	RC橋	徳地	4.3	2019	Ⅱ	○					○									
刀迫線1号橋	刀迫線	不明	4.7	RC橋	徳地	3.2	2023	Ⅱ					○										
風呂橋	刀迫・大内谷線	不明	19	PC橋	徳地	7.8	2021	Ⅰ			○												
中野橋	中野・河内線	1989	16	PC橋	徳地	6.2	2022	Ⅱ				○											
上三谷橋	上三谷線	1964	17	RC橋	阿東	3.2	2024	Ⅱ	○					○									
第二市井原橋	第2市井原線	1974	17	PC橋	阿東	3.2	2024	Ⅱ	○					○									
中野線1号橋	中野線	不明	4	RC橋	徳地	3.4	2023	Ⅱ					○										
中野線2号橋	中野線	不明	4.3	RC橋	徳地	2.6	2023	Ⅱ					○										
下鷹ノ巣橋	たかのす阿代河内線	1974	53	鋼橋	阿東	3.6	2024	Ⅱ	○					○									
鷹の巣橋	たかのす牛人屋線	1972	53	鋼橋	阿東	3.7	2024	Ⅱ	○					○									
長尾橋	長尾線	1990	41	PC橋	阿東	4.6	2024	Ⅱ			○												
大内谷・大藤線1号橋	大内谷・大藤線	不明	2.9	RC橋	徳地	4.9	2022	Ⅱ				○											
第二八幡原橋	山田追分線	不明	7	RC橋	阿東	4.8	2021	Ⅱ			○												
八幡原橋	八幡原線	不明	9	RC橋	阿東	4.8	2021	Ⅰ			○												
山田原橋	山田追分線	不明	5	RC橋	阿東	5.8	2021	Ⅱ			○												
杉尾橋	天子中線	不明	4.5	RC橋	阿東	2.8	2022	Ⅰ				○											
鷹子橋	若小幡線	1972	6	RC橋	阿東	7.8	2021	Ⅱ			○												
若林橋	八幡原我河内線	1973	20	PC橋	阿東	3.7	2024	Ⅱ	○					○									
第三大藤橋	大内谷・大藤線	不明	8.5	RC橋	徳地	4.6	2022	Ⅱ				○								断面修復		2	
河内・川上線1号橋	河内・川上線	不明	7	RC橋	徳地	5.7	2022	Ⅱ				○											
岩永橋	長尾寺河内線	1967	37	鋼橋	阿東	3.6	2024	Ⅱ			○												
荒瀬橋	杉原荒瀬線	不明	13	RC橋	阿東	4.7	2021	Ⅱ			○												
栃崎橋	栃崎線	不明	5.5	RC橋	阿東	3	2022	Ⅰ				○											
村木橋	栃崎線	不明	2.5	RC橋	阿東	3	2022	Ⅰ				○											
第三懸橋	名草懸線	不明	4	RC橋	阿東	3.3	2021	Ⅱ			○												
名草橋	市井原線	1967	59	RC橋	阿東	5.2	2024	Ⅲ	○					○			○	○	○	○	断面修復等		103
山田小橋	山田追分線	不明	2	RC橋	阿東	4.2	2021	Ⅰ			○												
山田橋	封秀線	1965	54.2	鋼橋	阿東	6.9	2024	Ⅱ	○					○									
山田橋側道橋	封秀線	2007	58	鋼橋	阿東	2.5	2024	Ⅰ	○					○									
第二懸橋	名草懸線	不明	2	RC橋	阿東	2.9	2021	Ⅰ			○												
愛宕橋	河内・川上線	1984	22	PC橋	徳地	6.2	2022	Ⅱ				○											
川向橋	芋尻暮床線	不明	2.8	RC橋	阿東	3	2022	Ⅰ				○											
第一懸橋	名草懸線	不明	2	RC橋	阿東	2.5	2021	Ⅰ			○												
暮床橋	芋尻暮床線	1967	37	鋼橋	阿東	3.6	2024	Ⅱ			○												
暮床奥橋	芋尻暮床線	不明	3	RC橋	阿東	3	2022	Ⅰ				○											
第四大藤橋	大内谷・大藤線	不明	6.5	RC橋	徳地	5	2022	Ⅱ				○											
中間丈橋	井出口沖田線	1966	59	RC橋	阿東	3.8	2024	Ⅱ	○					○									

[illegible]

施設名	路線名	架設年度	橋長(m)	種類	所在	幅員(m)	直近の点検実施年	直近の判定区分	点検実施計画年度						修繕計画年度						補修内容	概算補修金額 (百万円)
									2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
野道橋	下市野道線	不明	4	RC橋	阿東	3.4	2021	Ⅱ			○											
町線1号橋	町線	不明	3.1	RC橋	阿東	12.3	2022	Ⅰ				○										
栃原橋	開作秋鹿線	不明	4.1	RC橋	阿東	4.4	2023	Ⅱ					○									
銅橋	阿東むつみ線	不明	7.9	PC橋	阿東	4.1	2022	Ⅰ				○										
西目谷橋	西目谷線	1972	16	RC橋	阿東	4	2024	Ⅱ	○						○							
下谷橋	東側線	1952	18	RC橋	阿東	5.9	2024	Ⅱ	○						○							
西村橋	長沢開作線	不明	10	RC橋	阿東	3.7	2021	Ⅱ				○										
姥金橋	姥金線	1966	31	PC橋	阿東	3.6	2024	Ⅱ			○											
東畑橋	東畑線	不明	6	RC橋	阿東	3.3	2021	Ⅰ				○										
法田寺前橋	法田寺墓地線	不明	3	RC橋	阿東	4.6	2023	Ⅰ						○								
長沢開作線1号橋	長沢開作線	不明	5	RC橋	阿東	3.2	2021	Ⅰ				○										
新白井谷橋	白井谷須の原線	1993	10.6	PC橋	阿東	5	2022	Ⅱ					○									
荒瀬川橋	徳佐六市線	不明	13	PC橋	阿東	4.3	2020	Ⅱ			○											
成谷橋	成谷線	不明	4.9	RC橋	阿東	3.4	2023	Ⅱ												断面修復等		2
第1親月橋	東側線	1952	13	鋼橋	阿東	6.1	2020	Ⅱ			○											
朝早橋	下市坂田線	2017	61	PC橋	阿東	6.8	2024	Ⅰ	○						○							
第2親月橋	徳佐六市線	不明	14.3	RC橋	阿東	9.6	2023	Ⅲ						○						○	ひび割れ注入、断面修復等	64
新台明橋	下市坂田線	不明	4	RC橋	阿東	4.6	2021	Ⅱ				○										
掛沖第二橋	掛沖線	不明	11	RC橋	阿東	2.6	2021	Ⅱ				○										
嘉年川橋	西側線	1992	40	PC橋	阿東	6.2	2024	Ⅱ	○						○							
御所川内橋	御所河内墓地線	不明	5	RC橋	阿東	3.3	2021	Ⅱ				○										
大久保橋	下市坂田線	1988	43	PC橋	阿東	6.2	2024	Ⅱ	○						○							
成仏橋	東側線	1973	13.3	PC橋	阿東	5.8	2023	Ⅲ						○					○	○	ひび割れ注入	64
下小原橋	小原線	2017	34.3	混合橋	阿東	5.2	2023	Ⅰ						○								
久保橋	久保線	不明	4.1	RC橋	阿東	2.7	2023	Ⅱ						○								
小南第2橋	上市小南線	不明	2.2	RC橋	阿東	6	2023	Ⅱ						○								
正地橋	正地線	1967	28.6	鋼橋	阿東	3.6	2023	Ⅰ						○						再塗装、コンクリート巻き立て		
上小原橋	小原線	1986	24	RC橋	阿東	3.4	2021	Ⅰ				○										
藤目谷橋	藤目谷線	不明	5.8	RC橋	阿東	3.5	2022	Ⅰ					○									
大山橋	久保線	1954	50	RC橋	阿東	3.4	2024	Ⅱ			○											
念仏橋	真土線	1967	25	RC橋	阿東	4.4	2024	Ⅱ	○						○							
下向橋	鍛冶ヶ原線	2017	50.9	PC橋	阿東	5.2	2023	Ⅰ						○								
第2正地橋	藤目谷線	不明	6.9	RC橋	阿東	6	2022	Ⅱ					○									
昭和橋	駅通上宇津根線	1982	36	PC橋	阿東	6.2	2024	Ⅱ	○						○							
昭和橋（側道橋）	駅通上宇津根線	1967	23	PC橋	阿東	4.1	2024	Ⅱ	○						○							
森川内橋	徳佐中央線	1977	6	PC橋	阿東	7.7	2021	Ⅱ				○										
赤松東橋	赤松東線	不明	5.2	RC橋	阿東	3.9	2023	Ⅱ						○								
坂手橋	東側線	1961	21	RC橋	阿東	5.3	2024	Ⅱ	○						○							
平丸第2橋	西側線	不明	4.5	RC橋	阿東	6.3	2023	Ⅱ						○								
電宮橋	小南東線	不明	7	RC橋	阿東	3.1	2021	Ⅱ				○										
平丸第1橋	西側線	不明	3.4	RC橋	阿東	6	2023	Ⅱ						○								
小南橋	上市小南線	不明	7	RC橋	阿東	3.8	2021	Ⅱ				○										
赤松橋	赤松線	不明	7	RC橋	阿東	3.6	2022	Ⅱ					○									
野地橋	大山線	1998	38	PC橋	阿東	3.5	2024	Ⅱ			○											
大山橋	阿東むつみ線	1928	45.1	RC橋	阿東	5	2024	Ⅱ						○								
第2野地橋	赤松野地線	不明	3.2	RC橋	阿東	3	2023	Ⅰ						○								

施設名	路線名	架設年度	橋長(m)	種類	所在	幅員(m)	直近の点 検実施年	直近の評 定区分	点検実施計画年度						修繕計画年度						補修内容	概算補修金額 (百万円)	
									2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
南河内橋	南河内線	2016	45.8	PC橋	阿東	4.2	2021	I			○												
貞行橋	西側線	不明	5.3	RC橋	阿東	5.5	2020	II		○													
貞行橋	貞行小南線	不明	23	RC橋	阿東	2.4	2024	II	○					○									
稲成第一橋	稲成線	不明	4	RC橋	阿東	3	2022	I				○											
稲成第2橋	稲成線	不明	5	RC橋	阿東	2.8	2023	II					○										
九十郎橋	徳佐中央線	1976	12	PC橋	阿東	7.7	2021	II			○												
日ノ向橋	神角日向線	1967	21	RC橋	阿東	3.5	2024	I	○					○									
桶敷橋	桶敷線	1971	24	PC橋	阿東	3.2	2024	II	○					○									
上日ノ向橋	神角日向線	2016	28.4	PC橋	阿東	5.2	2024	I	○					○									
水戸第2橋	西側線	不明	2.5	RC橋	阿東	6.1	2023	II				○											
矢柱橋	矢柱線	不明	9.6	RC橋	阿東	3	2022	II				○											
水戸第1橋	西側線	不明	3.2	RC橋	阿東	6	2023	II					○										
小迫橋	神角日向線	2000	16	RC橋	阿東	17.3	2024	I	○					○									
岩崎橋	下半久南線	不明	6	RC橋	阿東	4.7	2021	II			○												
天神橋	沖田線	1985	31	PC橋	阿東	8.2	2024	II	○					○									
武者田橋	武者田線	不明	7	RC橋	阿東	3.8	2020	I		○													
横屋橋	田野中線	不明	6.3	RC橋	阿東	3	2022	II				○											
亀山橋	東側線	不明	13	RC橋	阿東	4.9	2020	II		○													
下半久橋	下半久線	不明	7.1	RC橋	阿東	4.1	2020	II		○													
上半久橋	下半久線	不明	8.3	RC橋	阿東	3.5	2020	II		○													
棚田橋	田野中線	1990	21	PC橋	阿東	5	2024	I		○													
古屋橋	上半久東線	不明	10	RC橋	阿東	4.1	2021	II			○												
第二亀山橋	亀山末国線	不明	9.6	RC橋	阿東	3.4	2020	II		○													
片山線1号橋	片山線	不明	3.7	RC橋	阿東	11.8	2020	II		○													
上半久線1号橋	上半久線	不明	2	RC橋	阿東	3.8	2020	II		○													
山河内前橋	山用線	不明	7	RC橋	阿東	5.7	2020	II		○													
山用橋	山用線	2016	28.4	PC橋	阿東	5.2	2024	I	○					○									
弥ヶ谷橋	徳佐中央線	1979	19	PC橋	阿東	7.8	2024	II	○					○									
水戸橋	西側線	不明	3.8	RC橋	阿東	5.8	2020	II		○													
水戸橋	水戸東線	1987	7	RC橋	阿東	7.1	2021	II			○												
大坪橋	弥ヶ谷線	2005	19	PC橋	阿東	6.2	2024	I	○					○									
三原橋	新田沖線	1981	11	RC橋	阿東	4.8	2020	II		○													
畠田橋	上畑田線	1982	8	PC橋	阿東	7.3	2021	II			○												
寺の前橋	神角中線	不明	6	RC橋	阿東	4	2021	II			○												
新寺の前橋	神角日向線	不明	8	RC橋	阿東	13	2021	II			○												
神角西橋	神角線	不明	4	RC橋	阿東	3	2020	II		○													
三原橋	西側線	不明	4	RC橋	阿東	5.6	2020	II		○													
野坂橋	東側線	不明	4.3	RC橋	阿東	4.5	2020	II		○													
中村橋	迫田線	不明	5.3	RC橋	阿東	6.5	2020	II		○													
第一寺ヶ迫橋	寺ヶ迫線	不明	2	RC橋	阿東	7.4	2020	II		○													
花ヶ迫橋	吉部野山田線	不明	3	RC橋	阿東	3	2020	I		○													
第2寺ヶ迫橋	寺ヶ迫線	不明	2	RC橋	阿東	7.3	2020	II		○													
山田橋	吉部野山田線	2016	32.2	PC橋	阿東	5.2	2024	I	○					○									
谷尻橋	油免線	1978	10	PC橋	阿東	5.6	2020	II		○													
刈畠橋	油免線	不明	3	RC橋	阿東	4.6	2020	II		○													
長山橋	飛田線	不明	4.4	RC橋	阿東	3.9	2020	II		○													

[illegible]
