

改正の概要

山口市土木系工事における「週休２日工事」の実施要領（No. 93-1）

1 主な改正内容

- ・完全週休２日工事の新設

新たな完全週休２日工事の取組に対する補正係数として「完全週休２日」を新設し、「月単位」の補正係数を改定し、「通期」の補正係数は廃止する。

※森林整備保全事業等については、「通期」の補正係数は廃止せず、「完全週休２日」の補正係数も追加していないため、完全週休２日の達成が確認された場合でも契約変更は行わない。

※港湾工事は、「港湾工事における週休２日工事の補正方法等の取扱いについて」による。

2 適用期日

令和７年１２月１日以降に入札公告、指名通知又は見積依頼をする工事に適用する。

山口市土木系工事における「週休２日工事」の実施要領（No.93-1）

新旧対照表	
新：令和７年１２月１日～	旧：令和７年４月２４日～同年１１月３０日
<p>２ 用語の定義</p> <p>２－１ 週休２日工事（現場閉所型）</p> <p><u>（１）</u>「週休２日工事（現場閉所型）・月単位」とは、対象期間内で____連続する全ての４週間（２８日）において、４週８休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。</p> <p><u>（２）</u>「週休２日工事（現場閉所型）・完全週休２日」とは、対象期間内で連続する全ての週において、現場閉所を土日に指定し、１週間に２日以上現場閉所を行ったと認められる状態をいう。ただし、受注者の責によらず土日に施工を行わざるを得ない場合は、土日に代わる現場閉所日を指定するものとする。</p> <p><u>（３）</u>「週休２日工事（現場閉所型）・通期」とは、対象期間において、４週８休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。</p> <p><u>（４）</u>「対象期間」とは、現場作業着手日から現場作業完了日までの期間をいう。なお、年末年始休暇６日間、夏季休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該</p>	<p>２ 用語の定義</p> <p>２－１ 週休２日工事（現場閉所型）</p> <p><u>（２）</u>「週休２日工事（現場閉所型）・月単位」とは、対象期間内でさらに連続する全ての４週間（２８日）において、４週８休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。</p> <p><u>（追加）</u></p> <p><u>（１）</u>「週休２日工事（現場閉所型）・通期」とは、対象期間において、４週８休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。</p> <p><u>（３）</u>「対象期間」とは、現場作業着手日から現場作業完了日までの期間をいう。なお、年末年始____６日間、夏季休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該</p>

新旧対照表	
新：令和7年12月1日～	旧：令和7年4月24日～同年11月30日
<p>当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は含まない。</p> <p><u>(5)</u> 「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。</p> <p><u>(6)</u> 「4週8休以上」とは、現場閉所日数の割合（以下、「現場閉所率」という。）が、28.5%（8日／28日）の水準以上に達する状態をいう。なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。</p> <p>2－2 週休2日工事（交替制）</p> <p><u>(1)</u> 「週休2日工事（交替制）・月単位」とは、対象期間内で <u>連続する全ての4週間（28日）において、技術者及び技能労働者が交替しながら4週8休以上の休日を確保する取組をいう。</u></p> <p><u>(2)</u> 「週休2日工事（交替制）・完全週休2日」とは、対象期間 <u>内で連続する全ての週において、技術者及び技能労働者が交替しながら1週間に2日間以上の休日を確保する取組をいう。</u></p>	<p>当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は含まない。</p> <p><u>(4)</u> 「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。</p> <p><u>(5)</u> 「4週8休以上」とは、現場閉所日数の割合（以下、「現場閉所率」という。）が、28.5%（8日／28日）の水準以上に達する状態をいう。なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。</p> <p>2－2 週休2日工事（交替制）</p> <p><u>(2)</u> 「週休2日工事（交替制）・月単位」とは、対象期間内で <u>さらに</u>連続する全ての4週間（28日）において、技術者及び技能労働者が交替しながら4週8休以上の休日を確保する取組をいう。</p> <p><u>(追加)</u></p>

新旧対照表	
新：令和7年12月1日～	旧：令和7年4月24日～同年11月30日
<p>(3)「週休2日工事（交替制）・通期」とは、対象期間において、技術者及び技能労働者が交替しながら4週8休以上の休日を確保する取組をいう。</p> <p>(4)「対象期間」とは、現場作業着手日から現場作業完了日までの期間をいう。なお、年末年始<u>休暇</u>6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は含まない。</p> <p>また、下請企業については施工体制台帳上の工期^{※1}を基本とする。</p> <p>※1 施工体制台帳上の工期のうち実働期間が分散している場合には、受発注者協議で対象期間を設定するものとする。</p> <p>(5)「4週8休以上」とは、現場に従事した技術者及び技能労働者の平均休日日数の割合（以下、「休日率」という。）が、28.5%（8日／28日）の水準以上に達する状態をいう。なお、降雨、降雪等による予定外の休日についても、休日日数に含めるものとする。</p>	<p>(1)「週休2日工事（交替制）・通期」とは、対象期間において、技術者及び技能労働者が交替しながら4週8休以上の休日を確保する取組をいう。</p> <p>(3)「対象期間」とは、現場作業着手日から現場作業完了日までの期間をいう。なお、年末年始____6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は含まない。</p> <p>また、下請企業については施工体制台帳上の工期^{※1}を基本とする。</p> <p>※1 施工体制台帳上の工期のうち実働期間が分散している場合には、受発注者協議で対象期間を設定するものとする。</p> <p>(4)「4週8休以上」とは、現場に従事した技術者及び技能労働者の平均休日日数の割合（以下、「休日率」という。）が、28.5%（8日／28日）の水準以上に達する状態をいう。なお、降雨、降雪等による予定外の休日についても、休日日数に含めるものとする。</p>

新旧対照表	
新：令和7年12月1日～	旧：令和7年4月24日～同年11月30日
<p><u>(削除)</u></p> <p><u>(削除)</u></p> <p>(省略)</p> <p>4 発注方式</p> <p>(1) _____発注者指定型<u>の</u>「週休2日工事 (現場閉所型)・月単位」 _____ _____として発注する。</p> <p><u>また、</u>現場閉所が馴染まない工事 _____は、発注者指定 型<u>の</u>「週休2日工事(交替制)・月単位」 _____ _____として発注する _____。</p> <p><現場閉所が馴染まない工事の例></p> <p>・緊急性が高い工事 _____等で休日(土日、祝日、年</p>	<p><u>2-3 発注者指定型</u></p> <p><u>(1)「発注者指定型」とは、発注者が、発注時から、受注者に対 して週休2日(4週8休以上)に取り組むことを指定する方式 をいう。</u></p> <p><u>2-4 受注者希望型</u></p> <p><u>(1)「受注者希望型」とは、受注者が、工事着手前に、発注者に 対して週休2日(4週8休以上)に取り組む旨を協議したうえ で取り組む方式をいう。</u></p> <p>(省略)</p> <p>4 発注方式</p> <p>(1) <u>対象工事については、原則、</u>発注者指定型__「週休2日工事 (現場閉所型) _____」 <u>又は受注者希望型「週休2日工事 (現場閉所型)」</u>として発注する。</p> <p><u>ただし、</u>現場閉所が馴染まない工事<u>においては、</u>発注者指定 型__「週休2日工事(交替制) _____」 <u>又は受注者希望型 「週休2日工事(交替制)」</u>として発注する <u>こともできる。</u></p> <p><現場閉所が馴染まない工事の例></p> <p>・緊急性が高い工事 <u>や通年維持工事</u>等で休日(土日、祝日、年</p>

新旧対照表	
新：令和7年12月1日～	旧：令和7年4月24日～同年11月30日
<p>末年始休暇、夏季休暇）に作業が必要な工事</p> <ul style="list-style-type: none"> ・連続施工せざるを得ない工事 ・社会的要請により早期完成が望まれる工事 <p>（省略）</p> <p><u>（３）週休２日工事（現場閉所型・交替制）のいずれも困難な工事は、例外的に週休２日工事の対象としないことができる。</u></p> <p><u>＜週休２日工事の対象外の例＞</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>災害復旧工事のうち、応急復旧工事（緊急随契を行うような工事）</u> <p>５ 発注方法</p> <p>（１）発注者は、週休２日工事の発注にあたって、入札公告に発注方式（_____「週休２日工事（現場閉所型）・月単位」、_____「週休２日工事（交替制）・月単位」_____のいずれか）を記載する。また、施工条件書に週休２日工事の適用について明示する。</p> <p>（省略）</p>	<p>末年始休暇、夏季休暇）に作業が必要な工事</p> <ul style="list-style-type: none"> ・連続施工せざるを得ない工事 ・社会的要請により早期完成が望まれる工事 <p>（省略）</p> <p><u>（追加）</u></p> <p>５ 発注方法</p> <p>（１）発注者は、週休２日工事の発注にあたって、入札公告に発注方式（<u>発注者指定型</u>「週休２日工事（現場閉所型）_____」、<u>受注者希望型「週休２日工事（現場閉所型）」</u>、<u>発注者指定型「週休２日工事（交替制）_____」</u>、<u>受注者希望型「週休２日工事（交替制）」</u>のいずれか）を、_____施工条件書に週休２日工事の適用について明示する。</p> <p>（省略）</p>

新旧対照表	
新：令和7年12月1日～	旧：令和7年4月24日～同年11月30日
<p>6 実施方法</p> <p>(1) _____受注者は、契約後速やかに、発注者と、週休2日工事の内容として、月単位もしくは完全週休2日のどちらを実施するか協議するとともに、「工期設定支援システム（山口県版試行）」を活用する等しながら、必要工期について受発注者間で確認を行う。なお、受注者は、発注者が示した工期を延伸したい場合には、計画工程表を発注者へ提出すること。</p> <p><u>(削除)</u></p> <p>(2) _____発注者は、(1) _____により工期の延伸が必要と認められる場合は、速やかに工期延伸に係る契約変更を行うものとする。</p>	<p>6 実施方法</p> <p>(1) 発注者指定型</p> <p>受注者は、契約後速やかに、発注者と、週休2日工事の内容として、通期もしくは月単位のどちらを実施するか協議するとともに、「工期設定支援システム（山口県版試行）」を活用する等しながら、必要工期について受発注者間で確認を行う。なお、受注者は、発注者が示した工期を延伸したい場合には、計画工程表を発注者へ提出すること。</p> <p>(2) 受注者希望型</p> <p><u>受注者は、契約後速やかに、発注者と施工条件の確認協議（打合せ）を行い、「週休2日」の実施希望の有無について書面で協議し、受注者が実施を希望する場合には、週休2日工事の内容として、通期もしくは月単位のどちらかを実施するか協議するとともに、「工期設定支援システム（山口県版試行）」を活用する等しながら、施工計画書提出までに必要工期について受発注者間で確認を行う。なお、受注者は、発注者が示した工期を延伸したい場合には、計画工程表を発注者へ提出すること。</u></p> <p>(3) 共通事項</p> <p>発注者は、(1) (2)により工期の延伸が必要と認められる場合は、速やかに工期延伸に係る契約変更を行うものとする。</p>

新旧対照表	
新：令和7年12月1日～	旧：令和7年4月24日～同年11月30日
<p>(3) 受注者は、契約後の発注者との協議により決定した「週休2日工事」の実施内容を確実に履行するものとする。 また、週休2日工事（現場閉所型）・完全週休2日において、受注者の責によらず、悪天候の影響により、やむを得ず平日に現場閉所し、土日に施工が必要な場合、土日に代わる現場閉所日を同一の週で指定し、1週間に2日間以上の現場閉所を行うものとする。</p> <p>(4) 着手後に履行できないことが判明した場合には、速やかに発注者と協議すること。 なお、工事着手後に、工程の変更理由が以下の1)～5)に示すような受注者の責によらない理由により、工期の延伸が必要となった場合は、適切に工期の変更を行う。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 受発注者間で協議した工事工程の条件に変更が生じた場合 2) 著しい悪天候により作業不稼働日が多く発生した場合 3) 工事中止や工事一部中止により全体工程に影響が生じた場合 4) 資機材や労働需要のひっ迫により、全体工程に影響が生じた場合 5) その他特別な事情により全体工程に影響が生じた場合 	<p>また、受注者は、契約後の発注者との協議により決定した「週休2日工事」の実施内容を確実に履行するものとする。</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <p>ただし、着手後に履行できないことが判明した場合には、速やかに発注者と協議すること。</p> <p>なお、工事着手後に、工程の変更理由が以下の1)～5)に示すような受注者の責によらない理由により、工期の延伸が必要となった場合は、適切に工期の変更を行う。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 受発注者間で協議した工事工程の条件に変更が生じた場合 2) 著しい悪天候により作業不稼働日が多く発生した場合 3) 工事中止や工事一部中止により全体工程に影響が生じた場合 4) 資機材や労働需要のひっ迫により、全体工程に影響が生じた場合 5) その他特別な事情により全体工程に影響が生じた場合

新旧対照表	
新：令和7年12月1日～	旧：令和7年4月24日～同年11月30日
<p>7 週休2日の確認方法</p> <p>(1) 週休2日工事（現場閉所型）</p> <p><u>（削除）</u></p> <p>____受注者は、工事完了後、現場閉所の状況を確認できる実 施工程表（別紙2参照）を監督員に提出する。ただし、同等の 内容が確認できる資料であれば指定様式以外でも良い。期間 は、現場作業着手日から現場作業完了日までとする。</p> <p>なお、<u>発注者は、書類の作成負担等を考慮し、実施状況に疑 義がある場合に限り、受注者に出面表等の根拠資料の提示を求 めることができる。</u></p> <p>(2) 週休2日工事（交替制）</p> <p>____受注者は、工事完了後、技術者や技能労働者の勤務状況 が確認できる実施工程表（別紙2参照）を監督員に提出する。 ただし、同等の内容が確認できる資料であれば指定様式以外で も良い。期間は、技術者及び技能労働者が従事した期間とす る。</p> <p>なお、<u>発注者は、書類の作成負担等を考慮し、実施状況に疑</u></p>	<p>7 週休2日の確認方法</p> <p>(1) 週休2日工事（現場閉所型）</p> <p><u>1) 災害時等の緊急対応及び品質管理・安全管理等のため、 現場閉所を計画していた日（休工日）に現場作業を行う場 合は、原則、当該週において休工日を振替できるものとす る。</u></p> <p><u>2) 受注者は、工事完了後、現場閉所の状況を確認できる実 施工程表（別紙2参照）を監督員に提出する。ただし、同 等の内容が確認できる資料であれば指定様式以外でも良 い。期間は、現場作業着手日から現場作業完了日までとす る。</u></p> <p>なお、<u>出面表等の根拠資料は提出不要であるが、監督 員や検査職員が請求した場合は、これを提示すること。</u></p> <p>(2) 週休2日工事（交替制）</p> <p><u>1) 受注者は、工事完了後、技術者や技能労働者の勤務状況 が確認できる実施工程表（別紙2参照）を監督員に提出す る。ただし、同等の内容が確認できる資料であれば指定様 式以外でも良い。期間は、技術者及び技能労働者が従事し た期間とする。</u></p> <p>なお、<u>出面表等の根拠資料は提出不要であるが、監督</u></p>

新旧対照表	
新：令和7年12月1日～	旧：令和7年4月24日～同年11月30日
<p><u>義がある場合に限り、受注者に出面表等の根拠資料の提示を求めることができる。</u></p> <p>8 経費の補正方法</p> <p>(1) _____「週休2日工事（現場閉所型）」</p> <p>発注時は、<u>月単位</u>の補正係数を各経費に乗じたうえで予定価格を設定するものとする。</p> <p>受注者が<u>完全週休2日</u>を実施するとした場合において、これの達成が確認された場合に、<u>完全週休2日</u>の補正係数を各経費に乗じたうえで契約変更を行う。</p> <p>なお、<u>月単位</u>の4週8休に満たないものは補正しないこととし、補正分を減額する契約変更を行う。</p> <p>(2) _____「週休2日工事（交替制）」</p> <p>発注時は、<u>月単位</u>の補正係数を各経費に乗じたうえで予定価格を設定するものとする。</p> <p>受注者が<u>完全週休2日</u>を実施するとした場合において、これの達成が確認された場合に、<u>完全週休2日</u>の補正係数を各経費に乗じたうえで契約変更を行う。</p> <p>なお、<u>月単位</u>の4週8休に満たないものは補正しないこととし、補正分を減額する契約変更を行う。</p> <p><u>(削除)</u></p>	<p><u>員や検査職員が請求した場合は、これを提示すること。</u></p> <p>8 経費の補正方法</p> <p>(1) <u>発注者指定型</u>「週休2日工事（現場閉所型）」</p> <p>発注時は、<u>通期</u>の補正係数を各経費に乗じたうえで予定価格を設定するものとする。</p> <p>受注者が<u>月単位</u>_____を実施するとした場合において、これの達成が確認された場合に、<u>月単位</u>_____の補正係数を各経費に乗じたうえで契約変更を行う。</p> <p>なお、_____4週8休に満たないものは補正しないこととし、補正分を減額する契約変更を行う。</p> <p>(2) <u>発注者指定型</u>「週休2日工事（交替制）」</p> <p>発注時は、<u>通期</u>の補正係数を各経費に乗じたうえで予定価格を設定するものとする。</p> <p>受注者が<u>月単位</u>_____を実施するとした場合において、これの達成が確認された場合に、<u>月単位</u>_____の補正係数を各経費に乗じたうえで契約変更を行う。</p> <p>なお、_____4週8休に満たないものは補正しないこととし、補正分を減額する契約変更を行う。</p> <p><u>(3) 受注者希望型「週休2日工事（現場閉所型）」</u></p>

新旧対照表	
新：令和7年12月1日～	旧：令和7年4月24日～同年11月30日
<p><u>(削除)</u></p>	<p><u>発注時は、週休2日の取組に係る経費の補正を行わずに予定価格を設定するものとする。</u></p> <p><u>受注者が週休2日工事（通期又は月単位）を実施するとした場合において、この達成が確認された場合に、通期又は月単位の補正係数を各経費に乗じたうえで契約変更を行う。</u></p> <p><u>なお、4週8休に満たないものは補正しないこととし、工事着手前に週休2日に係る協議が整わなかったものについては、補正の対象としない。</u></p> <p><u>(4) 受注者希望型「週休2日工事（交替制）」</u></p> <p><u>発注時は、週休2日の取組に係る経費の補正を行わずに予定価格を設定するものとする。</u></p> <p><u>受注者が週休2日工事（通期又は月単位）を実施するとした場合において、この達成が確認された場合に、通期又は月単位の補正係数を各経費に乗じたうえで契約変更を行う。</u></p> <p><u>なお、4週8休に満たないものは補正しないこととし、工事着手前に週休2日に係る協議が整わなかったものについては、補正の対象としない。</u></p>
<p><u>(3) 共通事項</u></p> <p>補正係数は別紙のとおり。</p>	<p><u>(5) 共通事項</u></p> <p>補正係数は別紙のとおり。</p>

新旧対照表	
新：令和7年12月1日～	旧：令和7年4月24日～同年11月30日
<p>9 工事成績評価</p> <p>(1) 週休2日工事（現場閉所型）</p> <p>1) 受注者が月単位を実施し_____、この達成が確認された場合に、工事成績評価の審査項目別運用表において加点対象とする。また、完全週休2日を実施するとした場合において、この達成が確認された場合に、工事成績評価の審査項目別運用表において加点する。</p> <p>2) 明らかに受注者側に週休2日に取り組む姿勢が見られず、週休2日を達成できなかった場合については、内容に応じて点数を減ずる措置を行うものとする。</p> <p>(省略)</p>	<p>9 工事成績評価</p> <p>(1) 週休2日工事（現場閉所型）</p> <p>_____受注者が月単位を実施するとした場合において、この達成が確認された場合に、工事成績評価の審査項目別運用表において加点_____する。_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>(省略)</p>

新旧対照表	
新：令和7年12月1日～	旧：令和7年4月24日～同年11月30日
<p>附 則</p> <p>この要領は、令和6年4月1日から施行する。</p> <p>附 則</p> <p>この要領は、令和6年7月1日から施行する。</p> <p>附 則</p> <p>(施行期日)</p> <p>1 この要領は、令和7年4月24日から施行する。</p> <p>(経過措置)</p> <p>2 この要領の施行の日の前日までに、入札公告又は指名通知を行った入札については、なお従前の例による。</p> <p><u>附 則</u></p> <p><u>(施行期日)</u></p> <p><u>1 この要領は、令和7年12月1日から施行する。</u></p> <p><u>(経過措置)</u></p> <p><u>2 この要領の施行の日の前日までに、入札公告又は指名通知を行った入札については、なお従前の例による。</u></p>	<p>附 則</p> <p>この要領は、令和6年4月1日から施行する。</p> <p>附 則</p> <p>この要領は、令和6年7月1日から施行する。</p> <p>附 則</p> <p>(施行期日)</p> <p>1 この要領は、令和7年4月24日から施行する。</p> <p>(経過措置)</p> <p>2 この要領の施行の日の前日までに、入札公告又は指名通知を行った入札については、なお従前の例による。</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>

新旧対照表	
新：令和7年12月1日～	旧：令和7年4月24日～同年11月30日
<p style="text-align: right;">別紙</p> <p>【土木工事】、【機械設備工事】</p> <p>＜補正係数（週休2日工事（現場閉所型））＞</p> <p>現場の閉所状況に応じて、それぞれの経費に以下の補正係数を乗じる。</p> <p>なお、市場単価方式・土木工事標準単価については、別表1～3に示す補正係数を乗じるものとする。</p> <p>〔月単位〕</p> <ul style="list-style-type: none"> ・労務費 1.02 ・共通仮設費率 1.01 ・現場管理費率 1.02 <p>〔完全週休2日〕</p> <ul style="list-style-type: none"> ・労務費 1.02 ・共通仮設費率 1.02 ・現場管理費率 1.03 <p>ただし、土地改良事業等については、現場の閉所状況に応じて、それぞれの経費に以下の補正係数を乗じる。</p> <p>なお、市場単価方式・土木工事標準単価については、別表4～6に示す補正係数を乗じるものとする。</p> <p>〔月単位〕</p>	<p>【土木工事】、【機械設備工事】</p> <p>＜補正係数（週休2日工事（現場閉所型）・通期）＞</p> <p>それぞれの経費に以下の補正係数を乗じる。</p> <p>なお、市場単価方式・土木工事標準単価については、別表に示す補正係数を乗じるものとする。</p> <p>1）4週8休以上（現場閉所率28.5％（8日／28日）以上）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・労務費 1.02 ・機械経費（賃料） 1.02 ・共通仮設費率 1.02 ・現場管理費率 1.03 <p>ただし、土地改良事業等については、上記1）の補正係数を以下の補正係数に読み替える。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・労務費 1.02 ・機械経費（賃料） 1.02 ・共通仮設費率 1.02 ・現場管理費率 1.03 <p>また、森林整備保全事業等については、上記1）の補正係数を</p>

新旧対照表	
新：令和7年12月1日～	旧：令和7年4月24日～同年11月30日
<ul style="list-style-type: none"> ・労務費 1.02 ・共通仮設費率 1.04 ・現場管理費率 1.05 <p>[完全週休2日]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・労務費 1.02 ・共通仮設費率 1.05 ・現場管理費率 1.06 <p>また、森林整備保全事業等については、現場の閉所状況に応じて、それぞれの経費に以下の補正係数を乗じる。</p> <p>なお、市場単価方式・土木工事標準単価については、別表7～8に示す補正係数を乗じるものとする。</p> <p>[通期]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・労務費 1.02 ・機械経費(賃料) 1.02 ・共通仮設費率 1.02 ・現場管理費率 1.03 <p>[月単位]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・労務費 1.04 ・機械経費(賃料) 1.02 ・共通仮設費率 1.03 ・現場管理費率 1.05 	<p>以下の補正係数に読み替える。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・労務費 1.02 ・機械経費(賃料) 1.02 ・共通仮設費率 1.02 ・現場管理費率 1.03 <p>＜補正係数（週休2日工事（現場閉所型）・月単位）＞ それぞれの経費に以下の補正係数を乗じる。</p> <p>なお、市場単価方式・土木工事標準単価については、別表に示す補正係数を乗じるものとする。</p> <p>1) 4週8休以上（現場閉所率28.5%（8日／28日）以上）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・労務費 1.04 ・機械経費(賃料) 1.02 ・共通仮設費率 1.03 ・現場管理費率 1.05 <p>ただし、土地改良事業等については、上記1)の補正係数を以下の補正係数に読み替える。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・労務費 1.04 ・機械経費(賃料) 1.02 ・共通仮設費率 1.03

新旧対照表	
新：令和7年12月1日～	旧：令和7年4月24日～同年11月30日
<p>＜補正係数（週休2日工事（交替制）＞</p> <p>技術者及び技能労働者の休日率に応じて、それぞれの経費に以下の補正係数を乗じる。</p> <p>なお、市場単価方式・土木工事標準単価については、別表1～3に示す補正係数に乗じるものとする。</p> <p>【月単位】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・労務費 1.02 ・現場管理費率 1.02 <p>【完全週休2日】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・労務費 1.02 ・現場管理費率 1.03 <p>ただし、土地改良事業等については、技術者及び技能労働者の</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・現場管理費率 1.05 <p>また、森林整備保全事業等については、上記1）の補正係数を以下の補正係数に読み替える。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・労務費 1.04 ・機械経費（賃料） 1.02 ・共通仮設費率 1.03 ・現場管理費率 1.05 <p>＜補正係数（週休2日工事（交替制）・通期）＞</p> <p>技術者及び技能労働者の休日率に応じて、それぞれの経費に補正係数に乗じる。</p> <p>なお、市場単価方式・土木工事標準単価については、別表に示す補正係数に乗じるものとする。</p> <p>1）4週8休以上（休日率28.5％（8日／28日）以上）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・労務費 1.02 ・現場管理費率 1.01 <p>ただし、土地改良事業等については、上記1）の補正係数を以下の補正係数に読み替える。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・労務費 1.02

新旧対照表	
新：令和7年12月1日～	旧：令和7年4月24日～同年11月30日
<p>休日率に応じて、それぞれの経費に以下の補正係数を乗じる。</p> <p>なお、市場単価方式・土木工事標準単価については、別表4～6に示す補正係数を乗じるものとする。</p> <p>【月単位】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・労務費 1.02 ・現場管理費率 1.02 <p>【完全週休2日】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・労務費 1.02 ・現場管理費率 1.03 <p>また、森林整備保全事業等については、技術者及び技能労働者の休日率に応じて、それぞれの経費に以下の補正係数を乗じる。</p> <p>なお、市場単価方式・土木工事標準単価については、別表7～8に示す補正係数を乗じるものとする。</p> <p>【通期】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・労務費 1.02 ・現場管理費率 1.01 <p>【月単位】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・労務費 1.04 ・現場管理費率 1.03 	<ul style="list-style-type: none"> ・現場管理費率 1.01 <p>また、森林整備保全事業等については、上記1)の補正係数を以下の補正係数に読み替える。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・労務費 1.02 ・現場管理費率 1.01 <p>＜補正係数（週休2日工事（交替制）・月単位）＞</p> <p>技術者及び技能労働者の休日率に応じて、それぞれの経費に補正係数を乗じる。</p> <p>なお、市場単価方式・土木工事標準単価については、別表に示す補正係数を乗じるものとする。</p> <p>1) 4週8休以上（休日率28.5%（8日／28日）以上）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・労務費 1.04 ・現場管理費率 1.03 <p>ただし、土地改良事業等については、上記1)の補正係数を以下の補正係数に読み替える。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・労務費 1.04 ・現場管理費率 1.03

新旧対照表	
新：令和7年12月1日～	旧：令和7年4月24日～同年11月30日
<p>【港湾工事】</p> <p>別紙「港湾工事における「週休2日工事」の補正方法等の取扱いについて」による。</p> <p>（注1）適用する積算基準により補正する経費対象が異なる場合 ○積算基準が異なる複数工種区分を有する工事については、主たる工種の間接工事費率を適用する。</p>	<p>また、森林整備保全事業等については、上記1）の補正係数を以下の補正係数に読み替える。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・労務費 1.04 ・現場管理費率 1.03 <p>【港湾工事】</p> <p>別紙「港湾工事における「週休2日工事」の補正方法等の取扱いについて」による。</p> <p>（注1）適用する積算基準により補正する経費対象が異なる場合 ○積算基準が異なる複数工種区分を有する工事については、主たる工種の間接工事費率を適用する。</p>

新旧対照表

新：令和7年12月1日～

旧：令和7年4月24日～同年11月30日

別表1

市場単価方式による週休2日の取得に要する費用の計上に関する補正係数

名称	区分	補正係数			
		現場閉所		交替制	
		月単位	完全週休 2日	月単位	完全週休 2日
鉄筋工		1.02	1.02	1.02	1.02
ガス圧接工		1.01	1.01	1.01	1.01
インターロッキングブロック工	設置	1.01	1.01	1.01	1.01
	撤去	1.02	1.02	1.02	1.02
防護柵設置工（ガードレール）	設置	1.00	1.00	1.00	1.00
	撤去	1.02	1.02	1.02	1.02
防護柵設置工（ガードパイプ）	設置	1.00	1.00	1.00	1.00
	撤去	1.02	1.02	1.02	1.02
防護柵設置工（横断・転落防止柵）	設置	1.02	1.02	1.02	1.02
	撤去	1.02	1.02	1.02	1.02
防護柵設置工（落石防護柵）		1.01	1.01	1.01	1.01
防護柵設置工（落石防止網）		1.01	1.01	1.01	1.01
道路標識設置工	設置	1.00	1.00	1.00	1.00
	撤去・移設	1.01	1.01	1.01	1.01
道路付属物設置工	設置	1.01	1.01	1.01	1.01
	撤去	1.02	1.02	1.02	1.02
法面工		1.01	1.01	1.01	1.01
吹付砕工		1.01	1.01	1.01	1.01
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		1.01	1.01	1.01	1.01
道路植栽工	植樹	1.02	1.02	1.02	1.02
	剪定	1.02	1.02	1.02	1.02
公園植栽工		1.01	1.01	1.01	1.01
橋梁用伸縮接手装置設置工		1.02	1.02	1.02	1.02
橋梁用埋設型伸縮接手装置設置工		1.01	1.01	1.01	1.01
橋面防水工		1.00	1.00	1.00	1.00
薄層カラー舗装工		1.00	1.00	1.00	1.00
グルーピング工		1.01	1.01	1.01	1.01
軟弱地盤処理工		1.01	1.01	1.01	1.01
コンクリート表面処理工（ウォータージェット工）		1.02	1.02	1.02	1.02

別表

市場単価方式による週休2日の取得に要する費用の計上に関する補正係数

名称	区分	補正係数			
		現場閉所		交替制	
		通期	月単位	通期	月単位
鉄筋工		1.02	1.04	1.02	1.04
ガス圧接工		1.02	1.03	1.02	1.03
インターロッキングブロック工	設置	1.01	1.01	1.01	1.01
	撤去	1.02	1.04	1.02	1.04
防護柵設置工（ガードレール）	設置	1.00	1.01	1.00	1.01
	撤去	1.02	1.04	1.02	1.04
防護柵設置工（ガードパイプ）	設置	1.00	1.01	1.00	1.01
	撤去	1.02	1.04	1.02	1.04
防護柵設置工（横断・転落防止柵）	設置	1.02	1.04	1.02	1.04
	撤去	1.02	1.04	1.02	1.04
防護柵設置工（落石防護柵）		1.01	1.01	1.01	1.01
防護柵設置工（落石防止網）		1.01	1.02	1.01	1.02
道路標識設置工	設置	1.00	1.01	1.00	1.00
	撤去・移設	1.02	1.03	1.01	1.03
道路付属物設置工	設置	1.01	1.01	1.01	1.01
	撤去	1.02	1.04	1.02	1.04
法面工		1.01	1.02	1.01	1.02
吹付砕工		1.01	1.03	1.01	1.03
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		1.02	1.03	1.01	1.03
道路植栽工	植樹	1.02	1.04	1.02	1.04
	剪定	1.02	1.04	1.02	1.04
公園植栽工		1.02	1.04	1.02	1.04
橋梁用伸縮接手装置設置工		1.01	1.02	1.01	1.02
橋梁用埋設型伸縮接手装置設置工		1.02	1.04	1.02	1.04
橋面防水工		1.01	1.01	1.01	1.01
薄層カラー舗装工		1.00	1.01	1.00	1.01
グルーピング工		1.00	1.01	1.00	1.01
軟弱地盤処理工		1.01	1.02	1.01	1.02
コンクリート表面処理工（ウォータージェット工）		1.01	1.01	1.01	1.01

新旧対照表

新：令和7年12月1日～

旧：令和7年4月24日～同年11月30日

別表2

土木工事標準単価による週休2日の取得に要する費用の計上に関する補正係数

名称	区分	補正係数			
		現場閉所		交替制	
		月単位	完全週休 2日	月単位	完全週休 2日
区画線工		1.02	1.02	1.02	1.02
高視認性区画線工		1.02	1.02	1.02	1.02
橋梁塗装工		1.01	1.01	1.01	1.01
構造物とりこわし工	機械	1.01	1.01	1.01	1.01
	人力	1.02	1.02	1.02	1.02
コンクリートブロック積工		1.02	1.02	1.02	1.02
排水構造物工		1.02	1.02	1.02	1.02
鋼製排水溝設置工		1.02	1.02	1.02	1.02
表層被覆工 (コンクリート保護塗装)	固定足場	1.01	1.01	1.01	1.01
	高所作業車	1.01	1.01	1.01	1.01
表面含浸工	固定足場	1.02	1.02	1.02	1.02
	高所作業車	1.02	1.02	1.02	1.02
連続繊維シート補強工	固定足場	1.02	1.02	1.02	1.02
	高所作業車	1.02	1.02	1.02	1.02
剥落防止工 (アラミドメッシュ)	固定足場	1.02	1.02	1.02	1.02
	高所作業車	1.02	1.02	1.02	1.02
漏水対策材設置工	固定足場	1.02	1.02	1.02	1.02
	高所作業車	1.02	1.02	1.02	1.02
防草シート設置工		1.01	1.01	1.01	1.01
紫外線硬化型 FRP シート設置工 (ポリエステル樹脂)	固定足場	1.01	1.01	1.01	1.01
	高所作業車	1.01	1.01	1.01	1.01
塗膜除去工		1.02	1.02	1.02	1.02
バキュームプラスト工		1.01	1.01	1.01	1.01
道路反射鏡設置工	設置	1.00	1.00	1.00	1.00
	撤去	1.02	1.02	1.02	1.02
仮設防護柵設置工 (仮設ガードレール)		1.02	1.02	1.02	1.02
機械式継手工		1.02	1.02	1.02	1.02
抵抗板付鋼製杭基礎工		1.01	1.01	1.01	1.01
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工		1.01	1.01	1.01	1.01
FRP 製格子状パネル設置工		1.00	1.00	1.00	1.00
侵食防止用植生マット工 (養生マット工)		1.02	1.02	1.02	1.02
支承金属溶射工		1.02	1.02	1.02	1.02
耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管) 設置工		1.02	1.02	1.02	1.02

土木工事標準単価による週休2日の取得に要する費用の計上に関する補正係数

名称	区分	補正係数			
		現場閉所		交替制	
		通期	月単位	通期	月単位
区画線工		1.02	1.04	1.02	1.04
高視認性区画線工		1.02	1.04	1.02	1.04
橋梁塗装工		1.01	1.03	1.01	1.03
構造物とりこわし工	機械	1.02	1.03	1.01	1.03
	人力	1.02	1.04	1.02	1.04
コンクリートブロック積工		1.02	1.04	1.02	1.03
排水構造物工		1.02	1.04	1.02	1.03
鋼製排水溝設置工		1.02	1.04	1.02	1.04
表層被覆工 (コンクリート保護塗装)	固定足場	1.01	1.02	1.01	1.02
	高所作業車	1.01	1.02	1.01	1.02
表面含浸工	固定足場	1.02	1.04	1.02	1.04
	高所作業車	1.02	1.04	1.02	1.03
連続繊維シート補強工	固定足場	1.02	1.04	1.02	1.04
	高所作業車	1.02	1.04	1.02	1.03
剥落防止工 (アラミドメッシュ)	固定足場	1.02	1.04	1.02	1.04
漏水対策材設置工	固定足場	1.02	1.04	1.02	1.04
	高所作業車	1.02	1.04	1.02	1.03
防草シート設置工		1.01	1.03	1.01	1.03
紫外線硬化型 FRP シート設置工 (ポリエステル樹脂)	固定足場	1.01	1.02	1.01	1.02
	高所作業車	1.01	1.01	1.01	1.01
塗膜除去工		1.02	1.04	1.02	1.04
バキュームプラスト工		1.01	1.01	1.00	1.01
道路反射鏡設置工	設置	1.00	1.01	1.00	1.01
	撤去	1.02	1.04	1.02	1.04
仮設防護柵設置工 (仮設ガードレール)		1.02	1.04	1.02	1.04
機械式継手工		1.02	1.04	1.02	1.04
抵抗板付鋼製杭基礎工		1.02	1.03	1.01	1.02
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工		1.01	1.01	1.01	1.01
FRP 製格子状パネル設置工		1.00	1.00	1.00	1.00
侵食防止用植生マット工 (養生マット工)		1.02	1.04	1.02	1.04
支承金属溶射工		1.02	1.04	1.02	1.04
耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管) 設置工		1.02	1.03	1.02	1.03

新旧対照表						
新：令和7年12月1日～				旧：令和7年4月24日～同年11月30日		
フレア溶接工		1.02	1.02	1.02	1.02	
H型ボラード設置工		1.01	1.01	1.01	1.01	
橋梁用水切り材設置工	固定足場	1.02	1.02	1.02	1.02	
	作業車	1.02	1.02	1.02	1.02	

新旧対照表

新：令和 7 年 1 2 月 1 日～

旧：令和 7 年 4 月 2 4 日～同年 1 1 月 3 0 日

別表 3

市場単価方式による週休 2 日の取得に要する費用の計上に関する補正係数（下水道工事）

名称	規格・仕様	補正係数			
		現場閉所		交替制	
		月単位	完全週休 2 日	月単位	完全週休 2 日
硬質塩化ビニル管設置工		1. 01	1. 01	1. 01	1. 01
リップ付硬質塩化ビニル管設置工		1. 01	1. 01	1. 01	1. 01
砂基礎工	人力施工	1. 02	1. 02	1. 02	1. 02
砂基礎工	機械施工	1. 02	1. 02	1. 02	1. 02
碎石基礎工	人力施工	1. 02	1. 02	1. 02	1. 02
碎石基礎工	機械施工	1. 02	1. 02	1. 02	1. 02
組立マンホール設置工		1. 01	1. 01	1. 01	1. 01
小型マンホール工		1. 00	1. 00	1. 00	1. 00
取付管およびます設置工	ます設置工	1. 00	1. 00	1. 00	1. 00
取付管およびます設置工	取付管布設及び 支管取付工	1. 01	1. 01	1. 01	1. 01

市場単価方式による週休 2 日の取得に要する費用の計上に関する補正係数（下水道工事）

名 称	規格・仕様	補正係数			
		現場閉所		交替制	
		通期	月単位	通期	月単位
硬質塩化ビニル管設置工		1. 01	1. 02	1. 01	1. 02
リップ付硬質塩化ビニル管設置工		1. 01	1. 02	1. 01	1. 02
砂基礎工	人力施工	1. 02	1. 04	1. 02	1. 04
砂基礎工	機械施工	1. 02	1. 04	1. 02	1. 04
碎石基礎工	人力施工	1. 02	1. 04	1. 02	1. 04
碎石基礎工	機械施工	1. 02	1. 04	1. 02	1. 04
組立マンホール設置工		1. 02	1. 03	1. 01	1. 03
小型マンホール工		1. 00	1. 01	1. 00	1. 01
取付管およびます設置工	ます設置工	1. 00	1. 01	1. 00	1. 01
取付管およびます設置工	取付管布設 及び 支管取付工	1. 01	1. 02	1. 01	1. 02

新旧対照表

新：令和7年12月1日～

旧：令和7年4月24日～同年11月30日

別表4

市場単価方式による週休2日の取得に要する費用の計上に関する補正係数（土地改良事業等）

名称	区分	補正係数			
		現場閉所		交替制	
		月単位	完全週休2日	月単位	完全週休2日
鉄筋工		1.02	1.02	1.02	1.02
ガス圧接工		1.01	1.01	1.01	1.01
インターロッキングブロック工	設置	1.01	1.01	1.01	1.01
	撤去	1.02	1.02	1.02	1.02
防護柵設置工（ガードレール）	設置	1.00	1.00	1.00	1.00
	撤去	1.02	1.02	1.02	1.02
防護柵設置工（ガードパイプ）	設置	1.00	1.00	1.00	1.00
	撤去	1.02	1.02	1.02	1.02
防護柵設置工（横断・転落防止柵）	設置	1.02	1.02	1.02	1.02
	撤去	1.02	1.02	1.02	1.02
防護柵設置工（落石防護柵）		1.01	1.01	1.01	1.01
防護柵設置工（落石防止網）		1.01	1.01	1.01	1.01
道路標識設置工	設置	1.00	1.00	1.00	1.00
	撤去・移設	1.01	1.01	1.01	1.01
道路付属物設置工	設置	1.01	1.01	1.01	1.01
	撤去	1.02	1.02	1.02	1.02
法面工		1.01	1.01	1.01	1.01
吹付砕工		1.01	1.01	1.01	1.01
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		1.01	1.01	1.01	1.01
道路植栽工	植樹	1.02	1.02	1.02	1.02
	剪定	1.02	1.02	1.02	1.02
公園植栽工		1.01	1.01	1.01	1.01
橋梁用伸縮接手装置設置工		1.02	1.02	1.02	1.02
橋梁用埋設型伸縮接手装置設置工		1.01	1.01	1.01	1.01
橋面防水工		1.00	1.00	1.00	1.00
薄層カラー舗装工		1.00	1.00	1.00	1.00
グルーピング工		1.01	1.01	1.01	1.01
軟弱地盤処理工		1.01	1.01	1.01	1.01
コンクリート表面処理工（ウォータージェット工）		1.02	1.02	1.02	1.02

市場単価方式による週休2日の取得に要する費用の計上に関する補正係数（土地改良事業等）

名称	区分	補正係数			
		現場閉所		交替制	
		通期	月単位	通期	月単位
鉄筋工		1.02	1.04	1.02	1.04
ガス圧接工		1.02	1.03	1.02	1.03
インターロッキングブロック工	設置	1.01	1.01	1.01	1.01
	撤去	1.02	1.04	1.02	1.04
防護柵設置工（ガードレール）	設置	1.00	1.01	1.00	1.01
	撤去	1.02	1.04	1.02	1.04
防護柵設置工（ガードパイプ）	設置	1.00	1.01	1.00	1.01
	撤去	1.02	1.04	1.02	1.04
防護柵設置工（横断・転落防止柵）	設置	1.02	1.04	1.02	1.04
	撤去	1.02	1.04	1.02	1.04
防護柵設置工（落石防護柵）		1.01	1.01	1.01	1.01
防護柵設置工（落石防止網）		1.01	1.02	1.01	1.02
道路標識設置工	設置	1.00	1.01	1.00	1.00
	撤去・移設	1.02	1.03	1.01	1.03
道路付属物設置工	設置	1.01	1.01	1.01	1.01
	撤去	1.02	1.04	1.02	1.04
法面工		1.01	1.02	1.01	1.02
吹付砕工		1.01	1.03	1.01	1.03
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		1.02	1.03	1.01	1.03
道路植栽工	植樹	1.02	1.04	1.02	1.04
	剪定	1.02	1.04	1.02	1.04
公園植栽工		1.02	1.04	1.02	1.04
橋梁用伸縮接手装置設置工		1.01	1.02	1.01	1.02
橋梁用埋設型伸縮接手装置設置工		1.02	1.04	1.02	1.04
橋面防水工		1.01	1.01	1.01	1.01
薄層カラー舗装工		1.00	1.01	1.00	1.01
グルーピング工		1.00	1.01	1.00	1.01
軟弱地盤処理工		1.01	1.02	1.01	1.02
コンクリート表面処理工（ウォータージェット工）		1.01	1.01	1.01	1.01

新旧対照表

新：令和7年12月1日～

旧：令和7年4月24日～同年11月30日

別表5

土木工事標準単価による週休2日の取得に要する費用の計上に関する補正係数（土地改良事業等）

名称	区分	補正係数			
		現場閉所		交替制	
		月単位	完全週休 2日	月単位	完全週休 2日
区画線工		1.02	1.02	1.02	1.02
高視認性区画線工		1.02	1.02	1.02	1.02
橋梁塗装工		1.01	1.01	1.01	1.01
構造物とりこわし工	機械	1.01	1.01	1.01	1.01
	人力	1.02	1.02	1.02	1.02
コンクリートブロック積工		1.02	1.02	1.02	1.02
排水構造物工		1.02	1.02	1.02	1.02
鋼製排水溝設置工		1.02	1.02	1.02	1.02
表層被覆工 （コンクリート保護塗装）	固定足場	1.01	1.01	1.01	1.01
	高所作業車	1.01	1.01	1.01	1.01
表面含浸工	固定足場	1.02	1.02	1.02	1.02
	高所作業車	1.02	1.02	1.02	1.02
連続繊維シート補強工	固定足場	1.02	1.02	1.02	1.02
	高所作業車	1.02	1.02	1.02	1.02
剥落防止工 （アラミドメッシュ）	固定足場	1.02	1.02	1.02	1.02
	高所作業車	1.02	1.02	1.02	1.02
漏水対策材設置工	固定足場	1.02	1.02	1.02	1.02
	高所作業車	1.02	1.02	1.02	1.02
防草シート設置工		1.01	1.01	1.01	1.01
紫外線硬化型FRPシート設置工 （ポリエステル樹脂）	固定足場	1.01	1.01	1.01	1.01
	高所作業車	1.01	1.01	1.01	1.01
塗膜除去工		1.02	1.02	1.02	1.02
バキュームブラスト工		1.01	1.01	1.01	1.01
道路反射鏡設置工	設置	1.00	1.00	1.00	1.00
	撤去	1.02	1.02	1.02	1.02
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）		1.02	1.02	1.02	1.02
機械式継手工		1.02	1.02	1.02	1.02
抵抗板付鋼製杭基礎工		1.01	1.01	1.01	1.01
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工		1.01	1.01	1.01	1.01
FRP製格子状パネル設置工		1.00	1.00	1.00	1.00
侵食防止用植生マット工（養生マット工）		1.02	1.02	1.02	1.02
支承金属溶射工		1.02	1.02	1.02	1.02
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工		1.02	1.02	1.02	1.02

土木工事標準単価による週休2日の取得に要する費用の計上に関する補正係数（土地改良事業等）

名称	区分	補正係数			
		現場閉所		交替制	
		通期	月単位	通期	月単位
区画線工		1.02	1.04	1.02	1.04
高視認性区画線工		1.02	1.04	1.02	1.04
橋梁塗装工		1.01	1.03	1.01	1.03
構造物とりこわし工	機械	1.02	1.03	1.01	1.03
	人力	1.02	1.04	1.02	1.04
コンクリートブロック積工		1.02	1.04	1.02	1.03
排水構造物工		1.02	1.04	1.02	1.03
鋼製排水溝設置工		1.02	1.04	1.02	1.04
表層被覆工 （コンクリート保護塗装）	固定足場	1.01	1.02	1.01	1.02
	高所作業車	1.01	1.02	1.01	1.02
表面含浸工	固定足場	1.02	1.04	1.02	1.04
	高所作業車	1.02	1.04	1.02	1.03
連続繊維シート補強工	固定足場	1.02	1.04	1.02	1.04
	高所作業車	1.02	1.04	1.02	1.03
剥落防止工 （アラミドメッシュ）	固定足場	1.02	1.04	1.02	1.04
	高所作業車	1.02	1.04	1.02	1.03
漏水対策材設置工	固定足場	1.02	1.04	1.02	1.04
	高所作業車	1.02	1.04	1.02	1.03
防草シート設置工		1.01	1.03	1.01	1.03
紫外線硬化型FRPシート設置工 （ポリエステル樹脂）	固定足場	1.01	1.02	1.01	1.02
	高所作業車	1.01	1.01	1.01	1.01
塗膜除去工		1.02	1.04	1.02	1.04
バキュームブラスト工		1.01	1.01	1.00	1.01
道路反射鏡設置工	設置	1.00	1.01	1.00	1.01
	撤去	1.02	1.04	1.02	1.04
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）		1.02	1.04	1.02	1.04
機械式継手工		1.02	1.04	1.02	1.04
抵抗板付鋼製杭基礎工		1.02	1.03	1.01	1.02
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工		1.01	1.01	1.01	1.01
FRP製格子状パネル設置工		1.00	1.00	1.00	1.00
侵食防止用植生マット工（養生マット工）		1.02	1.04	1.02	1.04
支承金属溶射工		1.02	1.04	1.02	1.04
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工		1.02	1.03	1.02	1.03

新旧対照表						
新：令和7年12月1日～				旧：令和7年4月24日～同年11月30日		
フレア溶接工		1.02	1.02	1.02	1.02	
H型ボラード設置工		1.01	1.01	1.01	1.01	
橋梁用水切り材設置工	固定足場	1.02	1.02	1.02	1.02	
	作業車	1.02	1.02	1.02	1.02	

新旧対照表

新：令和 7 年 1 2 月 1 日～

旧：令和 7 年 4 月 2 4 日～同年 1 1 月 3 0 日

別表 6

市場単価方式による週休 2 日の取得に要する費用の計上に関する補正係数
(土地改良事業等・下水道工事)

名称	規格・仕様	補正係数			
		現場閉所		交替制	
		月単位	完全週休 2 日	月単位	完全週休 2 日
硬質塩化ビニル管設置工		1. 01	1.01	1. 01	1.01
リップ付硬質塩化ビニル管設置工		1. 01	1.01	1. 01	1.01
砂基礎工	人力施工	1. 02	1.02	1. 02	1.02
砂基礎工	機械施工	1. 02	1.02	1. 02	1.02
碎石基礎工	人力施工	1. 02	1.02	1. 02	1.02
碎石基礎工	機械施工	1. 02	1.02	1. 02	1.02
組立マンホール設置工		1.01	1.01	1.01	1.01
小型マンホール工		1. 00	1.00	1. 00	1.00
取付管およびます設置工	ます設置工	1. 00	1.00	1. 00	1.00
取付管およびます設置工	取付管布設及び 支管取付工	1. 01	1.01	1. 01	1.01

市場単価方式による週休 2 日の取得に要する費用の計上に関する補正係数
(土地改良事業等・下水道工事)

名 称	規格・仕様	補正係数			
		現場閉所		交替制	
		通期	月単位	通期	月単位
硬質塩化ビニル管設置工		1. 01	1. 02	1. 01	1. 02
リップ付硬質塩化ビニル管設置工		1. 01	1. 02	1. 01	1. 02
砂基礎工	人力施工	1. 02	1. 04	1. 02	1. 04
砂基礎工	機械施工	1. 02	1. 04	1. 02	1. 04
碎石基礎工	人力施工	1. 02	1. 04	1. 02	1. 04
碎石基礎工	機械施工	1. 02	1. 04	1. 02	1. 04
組立マンホール設置工		1. 02	1. 03	1. 01	1. 03
小型マンホール工		1. 00	1. 01	1. 00	1. 01
取付管およびます設置工	ます設置工	1. 00	1. 01	1. 00	1. 01
取付管およびます設置工	取付管布設 及び 支管取付工	1. 01	1. 02	1. 01	1. 02

新旧対照表

新：令和7年12月1日～

旧：令和7年4月24日～同年11月30日

別表7

市場単価方式による週休2日の取得に要する費用の計上に関する補正係数（森林保全整備事業等）

名称	区分	補正係数			
		現場閉所		交替制	
		通期	月単位	通期	月単位
鉄筋工		1.02	1.04	1.02	1.04
ガス圧接工		1.02	1.03	1.02	1.03
インターロッキングブロック工	設置	1.01	1.01	1.01	1.01
	撤去	1.02	1.04	1.02	1.04
防護柵設置工（ガードレール）	設置	1.00	1.01	1.00	1.01
	撤去	1.02	1.04	1.02	1.04
防護柵設置工（ガードパイプ）	設置	1.00	1.01	1.00	1.01
	撤去	1.02	1.04	1.02	1.04
防護柵設置工（横断・転落防止柵）	設置	1.02	1.04	1.02	1.04
	撤去	1.02	1.04	1.02	1.04
防護柵設置工（落石防護柵）		1.01	1.01	1.01	1.01
防護柵設置工（落石防止網）		1.01	1.02	1.01	1.02
道路標識設置工	設置	1.00	1.01	1.00	1.00
	撤去・移設	1.02	1.03	1.01	1.03
道路付属物設置工	設置	1.01	1.01	1.01	1.01
	撤去	1.02	1.04	1.02	1.04
法面工		1.01	1.02	1.01	1.02
吹付砕工		1.01	1.03	1.01	1.03
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		1.02	1.03	1.01	1.03
道路植栽工	植樹	1.02	1.04	1.02	1.04
	剪定	1.02	1.04	1.02	1.04
公園植栽工		1.02	1.04	1.02	1.04
橋梁用伸縮接手装置設置工		1.01	1.02	1.01	1.02
橋梁用埋設型伸縮接手装置設置工		1.02	1.04	1.02	1.04
橋面防水工		1.01	1.01	1.01	1.01
薄層カラー舗装工		1.00	1.01	1.00	1.01
グルーピング工		1.00	1.01	1.00	1.01
軟弱地盤処理工		1.01	1.02	1.01	1.02
コンクリート表面処理工（ウォータージェット工）		1.01	1.01	1.01	1.01

市場単価方式による週休2日の取得に要する費用の計上に関する補正係数（森林保全整備事業等）

名称	区分	補正係数			
		現場閉所		交替制	
		通期	月単位	通期	月単位
鉄筋工		1.02	1.04	1.02	1.04
ガス圧接工		1.02	1.03	1.02	1.03
インターロッキングブロック工	設置	1.01	1.01	1.01	1.01
	撤去	1.02	1.04	1.02	1.04
防護柵設置工（ガードレール）	設置	1.00	1.01	1.00	1.01
	撤去	1.02	1.04	1.02	1.04
防護柵設置工（ガードパイプ）	設置	1.00	1.01	1.00	1.01
	撤去	1.02	1.04	1.02	1.04
防護柵設置工（横断・転落防止柵）	設置	1.02	1.04	1.02	1.04
	撤去	1.02	1.04	1.02	1.04
防護柵設置工（落石防護柵）		1.01	1.01	1.01	1.01
防護柵設置工（落石防止網）		1.01	1.02	1.01	1.02
道路標識設置工	設置	1.00	1.01	1.00	1.00
	撤去・移設	1.02	1.03	1.01	1.03
道路付属物設置工	設置	1.01	1.01	1.01	1.01
	撤去	1.02	1.04	1.02	1.04
法面工		1.01	1.02	1.01	1.02
吹付砕工		1.01	1.03	1.01	1.03
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		1.02	1.03	1.01	1.03
道路植栽工	植樹	1.02	1.04	1.02	1.04
	剪定	1.02	1.04	1.02	1.04
公園植栽工		1.02	1.04	1.02	1.04
橋梁用伸縮接手装置設置工		1.01	1.02	1.01	1.02
橋梁用埋設型伸縮接手装置設置工		1.02	1.04	1.02	1.04
橋面防水工		1.01	1.01	1.01	1.01
薄層カラー舗装工		1.00	1.01	1.00	1.01
グルーピング工		1.00	1.01	1.00	1.01
軟弱地盤処理工		1.01	1.02	1.01	1.02
コンクリート表面処理工（ウォータージェット工）		1.01	1.01	1.01	1.01

新旧対照表

新：令和 7 年 1 2 月 1 日～

旧：令和 7 年 4 月 2 4 日～同年 1 1 月 3 0 日

別表 8

土木工事標準単価による週休 2 日の取得に要する費用の計上に関する補正係数（森林整備保全事業等）

名称	区分	補正係数			
		現場閉所		交替制	
		通期	月単位	通期	月単位
区画線工		1.02	1.04	1.02	1.04
構造物とりこわし工	機械	1.02	1.03	1.01	1.03
	人力	1.02	1.04	1.02	1.04
コンクリートブロック積工		1.02	1.04	1.02	1.03
排水構造物工		1.02	1.04	1.02	1.03
橋梁塗装工		1.01	1.03	1.01	1.03
塗膜除去工		1.02	1.04	1.02	1.04
道路反射鏡設置工	設置	1.00	1.01	1.00	1.01
	撤去	1.02	1.04	1.02	1.04
侵食防止用植生マット工（養生マット工）		1.02	1.04	1.02	1.04

土木工事標準単価による週休 2 日の取得に要する費用の計上に関する補正係数（森林整備保全事業等）

名称	区分	補正係数			
		現場閉所		交替制	
		通期	月単位	通期	月単位
区画線工		1.02	1.04	1.02	1.04
構造物とりこわし工	機械	1.02	1.03	1.01	1.03
	人力	1.02	1.04	1.02	1.04
コンクリートブロック積工		1.02	1.04	1.02	1.03
排水構造物工		1.02	1.04	1.02	1.03

新旧対照表	
新：令和7年12月1日～	旧：令和7年4月24日～同年11月30日
<p style="text-align: right;">別紙</p> <p>港湾工事における「週休2日工事」の補正方法等の取扱いについて</p> <p>港湾工事については、以下に示すとおり、取り扱うものとする。</p> <p>1 対象期間（別表－1 参照）</p> <p>（1）起算日は、現場作業着手日以降の最初の土曜日又は月曜日とする。</p> <p>（2）現場閉所の確認は、起算日から完成通知書提出日2週間前の時点で単位期間が確保できる期間を対象とする。</p> <p>（3）工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は対象外とする。</p> <p>2 用語の定義</p> <p>（1）単位期間（別表－1 参照）</p> <p>土曜日を起算日とし、4週目の金曜日までの連続する4週間（28日）、又は、月曜日を起算日とし、4週目の日曜日までの連続する4週間（28日）をいう。</p> <p>（2）4週8休以上（別表－2 参照）</p> <p>各単位期間において、8日以上現場閉所があることをい</p>	<p style="text-align: right;">別紙</p> <p>港湾工事における「週休2日工事」の補正方法等の取扱いについて</p> <p>港湾工事については、以下に示すとおり、対象期間中の全ての単位期間で4週8休以上が確保できた場合において、各経費を補正するものとする。</p> <p>1 対象期間（別表－1 参照）</p> <p>（1）起算日は、現場作業着手日以降の最初の土曜日とする。</p> <p>（2）現場閉所の確認は、起算日から完成通知書提出日2週間前の時点で単位期間が確保できる期間を対象とする。</p> <p>（3）工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は対象外とする。</p> <p>2 用語の定義</p> <p>（1）単位期間（別表－1 参照）</p> <p>土曜日を起算日とし、4週目の金曜日までの連続する4週間（28日）をいう。</p> <p>（2）4週8休以上（別表－2 参照）</p> <p>各単位期間において、8日以上現場閉所があることをい</p>

新旧対照表	
新：令和7年12月1日～	旧：令和7年4月24日～同年11月30日
<p>う。</p> <p>なお、期間内に祝日、夏期休暇（土日を除く3日間）、年末年始休暇（土日を含む6日間）が含まれる場合は、これらの日数を加えた日数の現場閉所があること。</p> <p>3 補正方法等</p> <p>山口県設計標準歩掛表（港湾編）を適用する工事の労務単価等については、次の方法により補正するものとする。</p> <p>（1）労務単価</p> <p>積算において使用している職種の労務単価に補正係数</p> <p>1. 02を乗じる。（小数第1位四捨五入）</p> <p>（2）共通仮設費率、現場管理費率</p> <p>それぞれの経費に、次の補正係数を乗じる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・共通仮設費率 1. 02 ・現場管理費率 1. 03 <p>（3）市場単価</p> <p>次の算式による。なお、4週8休以上を確保できた場合における工種毎の補正係数については次表によること。</p> <div> 補正後市場単価＝標準市場単価×週休2日補正×施工規模等補正 </div>	<p>う。</p> <p>なお、期間内に祝日、夏期休暇（土日を除く3日間）、年末年始休暇（土日を含む6日間）が含まれる場合は、これらの日数を加えた日数の現場閉所があること。</p> <p>3 補正方法等</p> <p>山口県設計標準歩掛表（港湾編）を適用する工事の労務単価等については、次の方法により補正するものとする。</p> <p>（1）労務単価</p> <p>積算において使用している職種の労務単価に補正係数</p> <p>1. 04を乗じる。（小数第1位四捨五入）</p> <p>（2）機械経費（賃料）、共通仮設費率、現場管理費率</p> <p>それぞれの経費に、次の補正係数を乗じる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・機械経費（賃料） 1. 02 ・共通仮設費率 1. 02 ・現場管理費率 1. 03 <p>（3）市場単価</p> <p>次の算式による。なお、4週8休以上を確保できた場合における工種毎の補正係数については次表によること。</p> <div> 補正後市場単価＝標準市場単価×週休2日補正×施工規模等補正 </div>

新旧対照表

新：令和7年12月1日～

旧：令和7年4月24日～同年11月30日

※端数処理については、週休2日補正、施工規模等補正の順に、各補正毎に小数第1位以下切捨てとする。

※端数処理については、週休2日補正、施工規模等補正の順に、各補正毎に小数第1位以下切捨てとする。

※港湾工事以外の市場単価、標準単価は補正の対象外とする。

表－市場単価の補正係数（港湾工事）

工種	補正係数	工種	補正係数
1 底面工	1.01	17 車止撤去	1.02
2 マット工（アスファルトマット設置・ゴム系マット設置）	1.00	18 電気防食取付	1.02
3 支保工	1.02	19 防砂目地板取付工（陸上施工）	1.02
4 足場工	1.01	20 防砂目地板取付工（水中施工）	1.02
5 鉄筋工	1.02	21 吸出し防止工（陸上施工・海上施工）	1.02
6 吊鉄筋工	1.02	22 港湾構造物塗装工（係船柱・車止・緑金物）	1.01
7 型枠工	1.02	23 ペトロラタム被覆	1.02
8 コンクリート打設工（ポンプ車打設）	1.02	24 現場鋼材溶接工・切断工（陸上施工・海上施工）	1.02
コンクリート打設工（ポンプ車打設以外）	1.02	25 現場鋼材溶接・切断工（水中施工）	1.02
9 止水板工	1.02	26 かき落とし工	1.02
10 上蓋工	1.02	27 汚濁防止膜設置・撤去・移設	1.01
11 伸縮目地工	1.01	28 汚濁防止膜枠設置・撤去	1.01
12 係船柱取付	1.02	29 灯浮標設置・撤去	1.01
13 防舷材取付	1.02	30 汚濁防止膜保守管理（海上目視点検作業船あり・水中目視点検汚濁防止膜保守管理（海上目視点検作業船なし）	1.00
14 車止・緑金物取付	1.02	異形ブロック製作 型枠工	1.02
15 係船柱撤去	1.02	異形ブロック製作 コンクリート打設工	1.02
16 防舷材撤去	1.02	異形ブロック製作 給熱養生	1.01

表－市場単価の補正係数（港湾工事）


工種	補正係数	工種	補正係数
1 底面工	1.03	17 車止撤去	1.04
2 マット工（アスファルトマット設置・ゴム系マット設置）	1.00	18 電気防食取付	1.04
3 支保工	1.04	19 防砂目地板取付工（陸上施工）	1.04
4 足場工	1.02	20 防砂目地板取付工（水中施工）	1.03
5 鉄筋工	1.04	21 吸出し防止工（陸上施工・海上施工）	1.03
6 吊鉄筋工	1.04	22 港湾構造物塗装工（係船柱・車止・緑金物）	1.03
7 型枠工	1.03	23 ペトロラタム被覆	1.04
8 コンクリート打設工（ポンプ車打設）	1.04	24 現場鋼材溶接工・切断工（陸上施工・海上施工）	1.04
コンクリート打設工（ポンプ車打設以外）	1.04	25 現場鋼材溶接・切断工（水中施工）	1.04
9 止水板工	1.04	26 かき落とし工	1.04
10 上蓋工	1.04	27 汚濁防止膜設置・撤去・移設	1.03
11 伸縮目地工	1.02	28 汚濁防止膜枠設置・撤去	1.02
12 係船柱取付	1.04	29 灯浮標設置・撤去	1.03
13 防舷材取付	1.04	30 汚濁防止膜保守管理（海上目視点検作業船あり・水中目視点検汚濁防止膜保守管理（海上目視点検作業船なし）	1.01
14 車止・緑金物取付	1.04	異形ブロック製作 型枠工	1.04
15 係船柱撤去	1.04	異形ブロック製作 コンクリート打設工	1.04
16 防舷材撤去	1.04	異形ブロック製作 給熱養生	1.03

【別紙1】

週休2日工事(現場閉所型)の発注から工事完成までの実施フロー

週休2日工事(交替制)の場合は、※1※2のとおり読み替えること。

- ※1 「現場閉所型」を「交替制」
- ※2 「現場閉所」を「技術者や技能労働者の勤務」

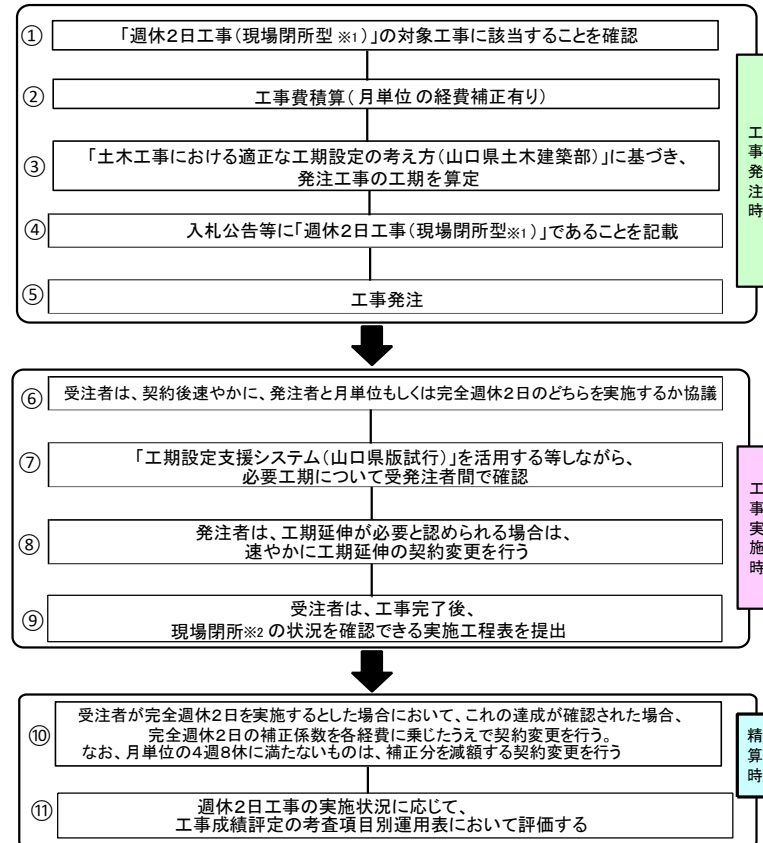


【別紙1-1】

発注者指定型「週休2日工事(現場閉所型)」の発注から工事完成までの実施フロー

【土木系工事】

週休2日工事(交替制)の場合は、※1※2のとおり読み替えること。

- ※1 「現場閉所型」を「交替制」
- ※2 「現場閉所」を「技術者や技能労働者の勤務」

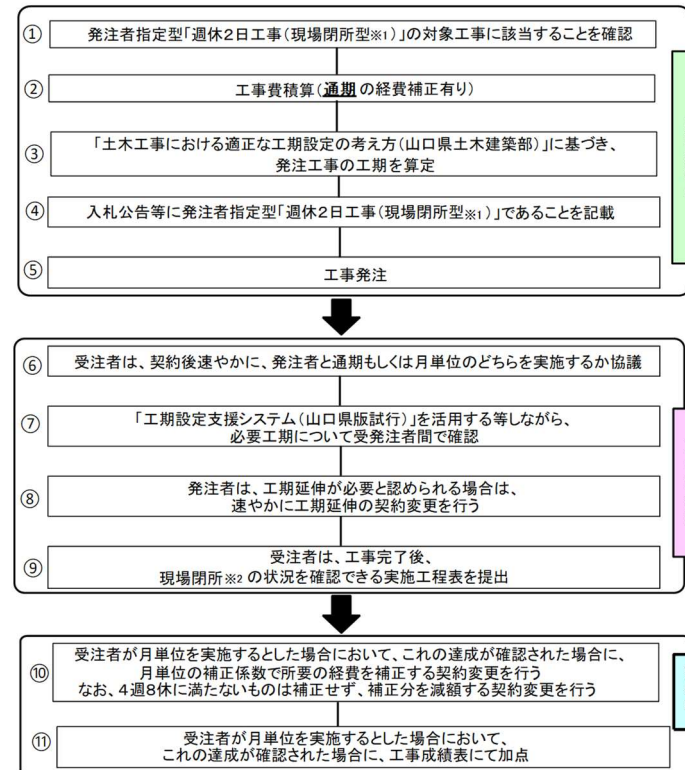

新旧対照表

新：令和7年12月1日～

旧：令和7年4月24日～同年11月30日

【別紙1-2】


受注者希望型「週休2日工事（現場閉所型）」の発注から工事完成までの実施フロー

【土木系工事】

週休2日工事（交替制）の場合は、※1※2のとおり読み替えること。

※1 「現場閉所型」を「交替制」

※2 「現場閉所」を「技術者や技能労働者の勤務」

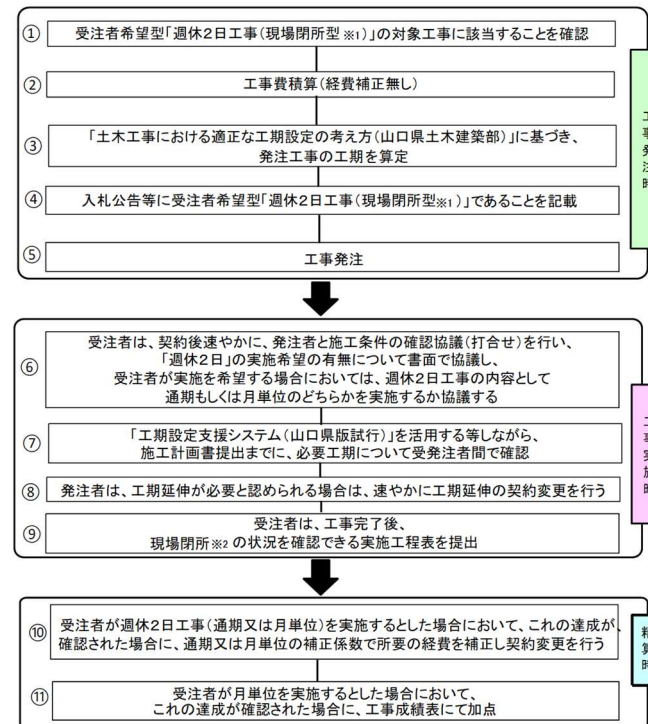

新旧对照表

新：令和7年12月1日～

旧：令和7年4月24日～同年11月30日

[illegible]

別紙2

計画・実施工程表

現場作業着手日： 2024/7/1 、 現場作業完了日： 2024/11/8

作業区分・項目		大工関係		電気関係		設備関係		その他		計画		実績	
作業区分・項目		大工関係		電気関係		設備関係		その他		計画		実績	
作業区分・項目		大工関係		電気関係		設備関係		その他		計画		実績	
作業区分・項目		大工関係		電気関係		設備関係		その他		計画		実績	
作業区分・項目		大工関係		電気関係		設備関係		その他		計画		実績	
作業区分・項目		大工関係		電気関係		設備関係		その他		計画		実績	
作業区分・項目		大工関係		電気関係		設備関係		その他		計画		実績	
作業区分・項目		大工関係		電気関係		設備関係		その他		計画		実績	
作業区分・項目		大工関係		電気関係		設備関係		その他		計画		実績	
作業区分・項目		大工関係		電気関係		設備関係		その他		計画		実績	
作業区分・項目		大工関係		電気関係		設備関係		その他		計画		実績	
作業区分・項目		大工関係		電気関係		設備関係		その他		計画		実績	
作業区分・項目		大工関係		電気関係		設備関係		その他		計画		実績	
作業区分・項目		大工関係		電気関係		設備関係		その他		計画		実績	
作業区分・項目		大工関係		電気関係		設備関係		その他		計画		実績	
作業区分・項目		大工関係		電気関係		設備関係		その他		計画		実績	
作業区分・項目		大工関係		電気関係		設備関係		その他		計画		実績	
作業区分・項目		大工関係		電気関係		設備関係		その他		計画		実績	
作業区分・項目		大工関係		電気関係		設備関係		その他		計画		実績	
作業区分・項目		大工関係		電気関係		設備関係		その他		計画		実績	
作業区分・項目		大工関係		電気関係		設備関係		その他		計画		実績	
作業区分・項目		大工関係		電気関係		設備関係		その他		計画		実績	
作業区分・項目		大工関係		電気関係		設備関係		その他		計画		実績	
作業区分・項目		大工関係		電気関係		設備関係		その他		計画		実績	
作業区分・項目		大工関係		電気関係		設備関係		その他		計画		実績	
作業区分・項目		大工関係		電気関係		設備関係		その他		計画		実績	
作業区分・項目		大工関係		電気関係		設備関係		その他		計画		実績	
作業区分・項目		大工関係		電気関係		設備関係		その他		計画		実績	
作業区分・項目		大工関係		電気関係		設備関係		その他		計画		実績	
作業区分・項目		大工関係		電気関係		設備関係		その他		計画		実績	
作業区分・項目		大工関係		電気関係		設備関係		その他		計画		実績	
作業区分・項目		大工関係		電気関係		設備関係		その他		計画		実績	
作業区分・項目		大工関係		電気関係		設備関係		その他		計画		実績	
作業区分・項目		大工関係		電気関係		設備関係		その他		計画		実績	
作業区分・項目		大工関係		電気関係		設備関係		その他		計画		実績	
作業区分・項目		大工関係		電気関係		設備関係		その他		計画		実績	
作業区分・項目		大工関係		電気関係		設備関係		その他		計画		実績	
作業区分・項目		大工関係		電気関係		設備関係		その他		計画		実績	
作業区分・項目		大工関係		電気関係		設備関係		その他		計画		実績	
作業区分・項目		大工関係		電気関係		設備関係		その他		計画		実績	
作業区分・項目		大工関係		電気関係		設備関係		その他		計画		実績	
作業区分・項目		大工関係		電気関係		設備関係		その他		計画		実績	
作業区分・項目		大工関係		電気関係		設備関係		その他		計画		実績	
作業区分・項目		大工関係		電気関係		設備関係		その他		計画		実績	
作業区分・項目		大工関係		電気関係		設備関係		その他		計画		実績	
作業区分・項目		大工関係		電気関係		設備関係		その他		計画		実績	
作業区分・項目		大工関係		電気関係		設備関係		その他		計画		実績	
作業区分・項目		大工関係		電気関係		設備関係		その他		計画		実績	
作業区分・項目		大工関係		電気関係		設備関係		その他		計画		実績	
作業区分・項目		大工関係		電気関係		設備関係		その他		計画		実績	
作業区分・項目		大工関係		電気関係		設備関係		その他		計画		実績	
作業区分・項目		大工関係		電気関係		設備関係		その他		計画		実績	
作業区分・項目		大工関係		電気関係		設備関係		その他		計画		実績	
作業区分・項目		大工関係		電気関係		設備関係		その他		計画		実績	
作業区分・項目		大工関係		電気関係		設備関係		その他		計画		実績	
作業区分・項目		大工関係		電気関係		設備関係		その他		計画		実績	
作業区分・項目		大工関係		電気関係		設備関係		その他		計画		実績	
作業区分・項目		大工関係		電気関係		設備関係		その他		計画		実績	
作業区分・項目		大工関係		電気関係		設備関係		その他		計画		実績	
作業区分・項目		大工関係		電気関係		設備関係		その他		計画		実績	
作業区分・項目		大工関係		電気関係		設備関係		その他		計画		実績	
作業区分・項目		大工関係		電気関係		設備関係		その他		計画		実績	
作業区分・項目		大工関係		電気関係		設備関係		その他		計画		実績	
作業区分・項目		大工関係		電気関係		設備関係		その他		計画		実績	
作業区分・項目		大工関係		電気関係		設備関係		その他		計画		実績	
作業区分・項目		大工関係		電気関係		設備関係		その他		計画		実績	
作業													

市場単価及び土木工事標準単価の取扱いについて

【令和7年11月30日まで】

○諸経費体系が土木工事、機械設備工事の場合

種別	補正の対象
土木工事市場単価	○
下水道工事市場単価	○
港湾工事市場単価	×
土木工事標準単価	○

○諸経費体系が港湾工事の場合

種別	補正の対象
土木工事市場単価	×
下水道工事市場単価	×
港湾工事市場単価	○
土木工事標準単価	×



【令和7年12月1日以降】

○諸経費体系が土木工事、機械設備工事、港湾工事の場合

種別	補正の対象
土木工事市場単価	○
下水道工事市場単価	○
港湾工事市場単価	○
土木工事標準単価	○

※詳細は、山口県土木建築部技術管理課ウェブサイトに掲載する「山口県週休 2 日工事対象コード一覧表(R7.10～)」を参照してください。
